



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

03/2025

REFORMA PS I

Junho 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Adm 54/2025

Bariri, 29 de julho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2025 – Mês de Referência: JUNHO.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª os demonstrativos financeiros do mês de junho do Termo de Convênio 03/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO



ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIAL MANDADA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV. ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO CONV. 03/2025 REFORMA PS - I
EXERCÍCIO 06/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/06/2025	R\$ 35.100,92	03/06/2025		R\$ 35.100,92

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 33.473,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.100,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 24,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 68.598,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 68.598,61

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



VVWXYZ[YW]_`^

[abcdWbcŴ^efghig

jklhmfa

(':n:

ĉ^hia

6?@@(n:

ê^fg h ig

;"o*pK*Kq K* *pr* N* * Kq

o; q";N<"K;* Kq s*";";

Ž^tu

&&%@'5%6\$:R555(n@(
; + 00 6'R5?R6564 U0 (5345

!!

"# \$\$%&'()&'

*+ , - . / 0 1 203

"# \$4%(55)'6

" 07 0 89 , 0 1 203

"# 4: %:\$()'(

;" 0 07 0 1 203 ;< = 0

"# 5)55

07 0 1 203 " 1 ,

"# (5)65

1 0 1 203 > ! ! 3

"# 64)"

"# '%??@)6'

AB CDEBF GB CHIJ

K L ,0 M , - N +, " 1 , 1 O ;" ;<= P Q89 ,

\$5R54R656 *1 , * + , - "# \$\$%&? "# (:)(@ "# 5)55 "# 5)55 "# 5)55

4 .S " 07 \$)\$\$ "# \$4% "# 5)55 "# 5)55 "# 5)55 "# \$4%(55)'6

5\$R5@R65 " 07 =,1 (55)'6 "# 6')5? "# 5)55 "# 4):("# \$\$%&'@)4'

64 "# \$\$%&? "# 4)&' "' '4' "# 5)55 "# &)\$' "# 64%\$\$4)\$6

5'R5@R656 \$)\$\$ "# 5)55 "# 5)55 "# 5)55

4 "# 64%\$\$&)6

O5'R5@R65618-, + , - .S) T 1 - +, 07 % 6 "# '%?

4 @@)25

\$5R5@R65 ; + 00 6'R5?R6564 U0 (5345

64

☐ Visualizar Pix agrupados



!"#\$%\$ &"#\$\$(

)*+,-./ 0
12,3/ -245,35 0 67) 1)6) 89.;8<) =6
=54>2?2 ?2
5 @ 34/ 32

A""B'C !"#\$D

E3F G/H/,-535I2J.I5,32	E3F)*F 24.*5I	K235 L.M3N4.-2	E 2-OI 5,32	P/H24 8Q 6/H?2
		6/H?2),354.24		RSRRTU
		VWXYZ[\]^`^a]bc\Y[``b`dce\	F F F F	fghiRRSjkTU
		= 8 9 : < l m n1 o 1 0: l < E 6) l		
		pqrYssYt`]èY`uvbcw	F	xyz{[]}~ RSRRTU
		85,?5 :/-H		
		r Y c Y Y] cle	F	y z x{}~{
		P o 1;m678I7;8) K7E)		
		W VYssYt`]èY`uvbcw	F	g h fiSjiTU RSRRTU
		85,?5 :/-H		
		6) K E ;		RSRRTU

74I,M/ i2 5c53O/?/ -2I MO-5MM2 £24 □ <)8nm) =89)8;F

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV. ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARINA PREARO
CONVÊNIO CONV. 03/2025 REFORMAPS-1
EXERCÍCIO 06/2025

ITEM	D O C U M E N T O		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	F A C I M E N T O		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	04/06/2025	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESADA GLOBAL	VEB CONSTRUTORA LTDA	52196207000187	09/06/2025		R\$ 58.831,91

TOTAL: R\$58.831,91

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE II

No dia 02 de junho de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE II**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **VGB CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 01/2025, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a 1ª medição no valor total de **R\$ 64.388,65 (sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 02/2025, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 30 de abril de 2025.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 030.026.094-03



LUIS APONSO ALBANESE MAROSO

Arquiteto e Urbanista – CAD: 417286-5



VGB CONSTRUTORA LTDA

Resposta formal legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 – Centro – Bariri-SP – CEP 17.250-182

CNPJ: 44.890.238/0001-61 | INSC: 2791678 |

contratacao@santacasabariri.com.br | Fone: 3602-6502

VGB Construtora

CONSTRUTORA E OBRAS

MEMORIAL DE CÁLCULO DO MONTE-DE-DEBÊ (MDD)
 Nº 02 de Junho de 2025, 400 - Rua Santa Teresinha, Bariri
 Jundiaí/SP, 13.200-000

Ordem	Descrição	Valor unitário	T1999		T1999		T1999		T1999		T1999		T1999		T1999		T1999	
			%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48	100,00%	R\$ 4.327,48
2.	CONDIÇÕES DE OBRAS	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00	100,00%	R\$ 20.000,00
3.	FUNDAMENTOS	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00	100,00%	R\$ 1.750,00
4.	ALVENARIA E CONCRETOS	R\$ 20.940,74	75,79%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74	100,00%	R\$ 20.940,74
5.	MADEIRAS DE FÓRMO	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18	1,00%	R\$ 1.717,18
6.	PADEIROS E REVESTIMENTOS	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00
7.	SANITÁRIOS, TUBOS E FITINGS	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74	1,00%	R\$ 20.940,74
8.	CONCRETOS METÁLICOS, ISOLAMENTOS	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00
9.	PORTAS	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00
10.	FORROS, TACAS E REVESTIMENTOS	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00	1,00%	R\$ 30.000,00
11.	ISOLAMENTOS	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00
12.	LOCAIS, MATERIAIS E OBRAS	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00
13.	REDE DE DRENAÇÃO	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00	1,00%	R\$ 20.000,00
14.	REVESTIMENTOS E OBRAS	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00	1,00%	R\$ 1.140,00
15.	REVESTIMENTOS E OBRAS	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00	1,00%	R\$ 40.760,00
Total (MDD)			100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00
Total (MDD)			100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00	100,00%	R\$ 40.760,00

40.760,00

Bariri, 02 de junho de 2025


 Ana Luiza Griso Bertoldi
 Responsável técnica
 CPF: 182.401.568-27


 Luis Afonso Albanese Mattoso
 Arquiteto e Urbanista
 CAU: A173360-5

VGB Construtora						CDHU 196, nov/2024, Desonerada			
O br a: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - PARTE I						CDHU: 196			
Local: Av. Cel José de Carvalho, nº 409 - Vila Terezinha - Bariri/SP						STURB, julho/2024; Desonerada			
BDI: 32,07%									
Jahu/SP, 29 de maio de 2025									
Item	Códi go	F onte	Descri ção	QTD	Uni dade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	1ª medição
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.167,45	R\$ 4.167,45
1.1	02.08.020	CDHU	Placadeidentificaçãoparaobra	2,88	M2	R\$ 889,80	R\$ 1.175,16	R\$ 3.384,46	R\$ 3.384,46
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamentoprovísoriodevãosemchapademadeiracompensada	14,00	M2	R\$ 42,35	R\$ 55,93	R\$ 782,99	R\$ 782,99
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 13.923,59	R\$13.923,59
2.1	03.04.020	CDHU	Demoliçãomanualderevestimentocerâmico,incluindoabase	150,00	M2	R\$ 10,79	R\$ 14,25	R\$ 2.137,59	R\$ 2.137,59
2.2	03.04.040	CDHU	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	275,00	M	R\$ 2,70	R\$ 3,57	R\$ 981,49	R\$ 981,49
2.3	04.08.020	CDHU	Retiradefolhadesquadriamadeira	22,00	UN	R\$ 19,95	R\$ 26,35	R\$ 579,75	R\$ 579,75
2.4	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbadores	70,00	M	R\$ 11,96	R\$ 15,80	R\$ 1.105,89	R\$ 1.105,89
2.5	04.09.020	CDHU	Retiradadesquadriametalícaemgeral	70,00	M2	R\$ 27,92	R\$ 36,88	R\$ 2.581,61	R\$ 2.581,61
2.6	04.11.020	CDHU	Retiradadeaparelhosanitárioincluindoacessórios	25,00	UN	R\$ 39,34	R\$ 51,96	R\$ 1.299,06	R\$ 1.299,06
2.7	04.11.080	CDHU	Retiradaderegistrouválvulaembutidos	6,00	UN	R\$ 50,30	R\$ 66,43	R\$ 398,58	R\$ 398,58
2.8	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	40,00	UN	R\$ 17,69	R\$ 23,36	R\$ 934,35	R\$ 934,35
2.9	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	55,00	UN	R\$ 17,69	R\$ 23,36	R\$ 1.284,73	R\$ 1.284,73
3	04.35.050	CDHU	Retiradadeaparelhodearcondicionadoportátil	2,00	UN	R\$ 20,05	R\$ 26,48	R\$ 52,96	R\$ 52,96
3.1	04.11.030	CDHU	Retiradadebancadaincluindopertences	5,50	M2	R\$ 55,84	R\$ 73,75	R\$ 405,61	R\$ 405,61
2.1	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	15,00	M3	R\$ 105,14	R\$ 138,86	R\$ 2.082,91	R\$ 2.082,91
2.1	04.06.020	CDHU	Retiradepisoemmaterial sintético assentado acola	15,00	M2	R\$ 3,99	R\$ 5,27	R\$ 79,06	R\$ 79,06
2	FUNDACÕES / INFRAESTRUTURA							R\$ 1.705,21	R\$1.705,21
2.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25cm-completa	0,00	M	R\$ 73,26	R\$ 96,76	R\$ -	R\$ -
3	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de parede	100,00	M2	R\$ 12,91	R\$ 17,05	R\$ 1.705,21	R\$ 1.705,21
3.1	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) fyk=500MPa	0,00	KG	R\$ 10,18	R\$ 13,44	R\$ -	R\$ -
3.2	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	0,00	M3	R\$ 565,55	R\$ 746,92	R\$ -	R\$ -
3.3	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA							R\$ 13.846,74	R\$ 9.789,15
3.4	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação 9cm	40	M2	R\$ 65,85	R\$ 86,96	R\$ 3.478,48	R\$ 3.478,48
4	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	1	M3	R\$ 1.705,98	R\$ 2.253,08	R\$ 2.253,08	R\$ 2.253,08
4.1	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (naoativas) em elementos de concreto	20	M	R\$ 307,23	R\$ 405,76	R\$ 8.115,18	R\$ 4.057,59
4.2	BARRAS DE APOIO							R\$ 5.717,19	R\$0,00
30.01.030			Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	9,00	UN	R\$ 157,26	R\$ 207,70	R\$ 1.869,26	
5.1	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	10,00	UN	R\$ 165,08	R\$ 218,02	R\$ 2.180,19	
5.2	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R\$ 144,84	R\$ 191,30	R\$ 191,30	
5.3	30.01.010	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	6,00	M	R\$ 186,32	R\$ 246,07	R\$ 1.476,44	
5.4	PISOS E REVESTIMENTOS							R\$ 42.763,25	R\$ 1.718,65
6.	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	50	M2	R\$ 26,03	R\$ 34,37	R\$ 1.718,65	R\$ 1.718,65
6.1	18.06.103	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	275	M	R\$ 5,70	R\$ 7,52	R\$ 2.068,51	
6.2			Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	100	M2	R\$ 136,74	R\$ 180,59	R\$ 18.058,89	
6.4	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	380	M2	R\$ 41,68	R\$ 55,05	R\$ 20.917,20	
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS							R\$ 20.868,34	R\$ 0,00
7.1	44.02.062	CDHU	Lapso/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	10,00	M2	R\$ 933,23	R\$ 1.232,51	R\$ 12.325,13	
7.2	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	40,00	M	R\$ 161,72	R\$ 213,58	R\$ 8.543,21	
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS							R\$ 113.653,96	R\$ 0,00
8.1	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	38,00	M2	R\$ 309,34	R\$ 408,55	R\$ 15.524,81	
8.2	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio máximo - arco-mídio, linha comercial	4,00	M2	R\$ 449,95	R\$ 594,25	R\$ 2.377,01	
8.3	25.02.042	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo polímero branco, sob medida	42,00	M2	R\$ 894,18	R\$ 1.180,95	R\$ 49.599,76	
8.4	25.02.310	CDHU	Porta de abrir em alumínio tipo polímero branco, sob medida - cor branca	16,00	M2	R\$ 1.232,97	R\$ 1.628,38	R\$ 26.054,13	
8.5	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	10,00	M2	R\$ 1.093,69	R\$ 1.444,44	R\$ 14.444,43	
8.6	26.01.142	CDHU	Vidro tipo laminado colorido de 8 mm	10,00	M2	R\$ 428,09	R\$ 565,38	R\$ 5.653,81	
9.	PINTURA							R\$ 35.260,44	R\$ 1.311,98
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	80,00	M2	R\$ 6,48	R\$ 8,56	R\$ 684,64	R\$ 684,64
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	40,00	M2	R\$ 11,88	R\$ 15,68	R\$ 627,33	R\$ 627,33
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida de base de PVA	40,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 17,76	R\$ 710,23	
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex anti-mofo em massa, inclusive preparo	600,00	M2	R\$ 26,54	R\$ 35,05	R\$ 21.030,54	
9.5	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica anti-mofo em massa, inclusive preparo	300,00	M2	R\$ 30,81	R\$ 40,69	R\$ 12.207,69	
10.	FORROS / MARCENARIA							R\$ 35.450,21	R\$ 0,00
10.1	22.02.010	CDHU	Forro em placa de gesso isolado fixo	230,00	M2	R\$ 86,73	R\$ 114,54	R\$ 26.344,72	
10.	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF, sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	3,00	M2	R\$ 2.298,15	R\$ 3.035,17	R\$ 9.105,50	
2	HIDRÁULICA							R\$ 45.763,74	R\$ 15.285,83
11.	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	9,00	UN	R\$ 104,34	R\$ 137,80	R\$ 1.240,19	R\$ 1.240,19
11.1	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	60,00	M	R\$ 27,99	R\$ 36,97	R\$ 2.218,18	
11.1	46.01.030	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	60,00	M	R\$ 35,47	R\$ 46,85	R\$ 2.810,72	
2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	40,00	M	R\$ 46,31	R\$ 61,16	R\$ 2.446,40	
11.	46.01.070	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2"), inclusive conexões	40,00	M	R\$ 96,49	R\$ 127,44	R\$ 5.097,48	
3	46.01.090	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4"), inclusive conexões	30,00	M	R\$ 189,09	R\$ 249,73	R\$ 7.491,94	
11.	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.918,76	R\$ 2.534,10	R\$ 2.534,10	R\$ 2.534,10
4	46.03.038	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada R, DN= 50 mm, inclusive conexões	50,00	M	R\$ 47,42	R\$ 62,63	R\$ 3.131,56	R\$ 3.131,56

11.

5

11.

6

11.

11.9	46.03.040	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ' R ', DN= 75 mm, inclusive conexões	60,00	M	R\$ 77,71	R\$ 102,63	R\$ 6.157,96	R\$ 6.157,96
11.10	46.03.050	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ' R ', DN= 100 mm, inclusive conexões	50,00	M	R\$ 100,95	R\$ 133,32	R\$ 6.666,07	R\$ 2.222,02
11.11	46.03.060	CDHU	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ' R '. DN= 150 mm, inclusive conexões	30,00	M	R\$ 150,66	R\$ 198,97	R\$ 5.969,14	
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 40.308,70	R\$ 0,00
12.1	44.01.160	CDHU	Lavatório de louça que encaixa em colunas suspensas - linha especial	18,00	UN	R\$ 969,40	R\$ 1.280,29	R\$ 23.045,25	
12.2	44.01.052	CDHU	Bacia fonada de louça com tampa - 6 litros	2,00	UN	R\$ 329,39	R\$ 435,03	R\$ 870,06	
12.3	30.08.060	CDHU	Bacia fonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 8 litros	4,00	UN	R\$ 1.049,62	R\$ 1.386,24	R\$ 5.544,95	
12.4	44.20.280	CDHU	Tampade plástico para bacias sanitárias	4,00	UN	R\$ 45,34	R\$ 59,88	R\$ 239,52	
12.5	44.06.300	CDHU	Cubae maço inoxidável simples de 400x340x140mm	6,00	UN	R\$ 257,30	R\$ 339,81	R\$ 2.038,89	
12.6	44.06.200	CDHU	Tanque maço inoxidável	1,00	UN	R\$ 1.313,63	R\$ 1.734,90	R\$ 1.734,90	
12.7	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1 1/2" ou 3/4"	18,00	UN	R\$ 141,74	R\$ 187,19	R\$ 3.369,42	
12.8	44.03.510	CDHU	Torneira de parede anti-vandalismo, DN=3/4"	1,00	UN	R\$ 559,44	R\$ 738,86	R\$ 738,86	
12.9	44.01.270	CDHU	Cubade louça de embutir oval	1,00	UN	R\$ 125,07	R\$ 165,17	R\$ 165,17	
12.10	44.03.360	CDHU	Duchahigienicacromada	2,00	UN	R\$ 580,97	R\$ 767,28	R\$ 1.534,56	
12.11	44.03.315	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	7,00	UN	R\$ 93,06	R\$ 122,91	R\$ 860,36	
12.12	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN=1 1/2"	1,00	UN	R\$ 126,27	R\$ 166,76	R\$ 166,76	
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R\$ 28.710,37	R\$ 0,00
13.1	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	120,00	M	R\$ 99,66	R\$ 131,62	R\$ 15.794,40	
13.2	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DESOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	30,00	UN	R\$ 14,22	R\$ 18,78	R\$ 563,37	
13.3	92287	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DESOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	150,00	UN	R\$ 18,12	R\$ 23,93	R\$ 3.590,16	
13.4	92329	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	30,00	UN	R\$ 9,83	R\$ 12,98	R\$ 389,53	
13.5	92315	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	R\$ 13,73	R\$ 18,13	R\$ 217,52	
13.6	92332	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	R\$ 20,47	R\$ 27,03	R\$ 162,18	
13.7	92318	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	R\$ 30,52	R\$ 40,31	R\$ 483,70	
13.8	93104	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAX ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	R\$ 19,18	R\$ 25,33	R\$ 151,97	
13.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSAX ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	R\$ 22,82	R\$ 30,14	R\$ 301,39	
13.10	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	10,00	UN	R\$ 112,22	R\$ 148,21	R\$ 1.482,12	
13.11	93085	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	R\$ 16,57	R\$ 21,89	R\$ 503,42	
13.12	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	36,00	UNID	R\$ 92,12	R\$ 121,67	R\$ 4.380,03	
13.1	17010076	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 522,90	R\$ 690,59	R\$ 690,59	
3	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO						R\$ -	R\$ 2.348,07	R\$ 0,00
14.	43.05.030	CDHU	Exaustorelétrico em plástico, vazão de 150 a 190 m³/h	1,0	UN	R\$ 457,34	R\$ 604,01	R\$ 604,01	
14.1	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	0	CJ	R\$ 3.708,95	R\$ 4.898,41	R\$ -	
14.2	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	40,00	M	R\$ 19,34	R\$ 25,55	R\$ 1.021,85	
14.3	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R\$ 40,72	R\$ 53,78	R\$ 215,12	
14.4	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	20,00	M	R\$ 19,20	R\$ 25,35	R\$ 507,09	
14.6	REFORMA ELÉTRICA							R\$ 61.512,74	R\$ 16.486,78
15.	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 593,58	R\$ 783,94	R\$ 783,94	
15.1	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	50,00	M	R\$ 93,52	R\$ 123,51	R\$ 6.175,48	
15.2	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	50,00	M	R\$ 52,52	R\$ 69,36	R\$ 3.467,99	
3	39.10.240	CDHU	Terminal de depressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R\$ 29,24	R\$ 38,62	R\$ 347,58	
3	39.10.160	CDHU	Terminal de depressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R\$ 22,44	R\$ 29,64	R\$ 266,76	
15.	41.11.712	CDHU	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolt - potência 6 W	15,00	UN	R\$ 110,81	R\$ 146,34	R\$ 2.195,16	
4	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	35,00	UN	R\$ 319,95	R\$ 422,56	R\$ 14.789,43	
15.8	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	16,00	UN	R\$ 33,89	R\$ 44,76	R\$ 716,16	
15.9	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 59,59	R\$ 78,70	R\$ 786,98	
7	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	R\$ 53,14	R\$ 70,18	R\$ 561,43	
15.11	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	R\$ 68,50	R\$ 90,47	R\$ 361,87	
15.12	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	R\$ 35,02	R\$ 46,26	R\$ 462,57	
15.13	91993	SINAPI/SP	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	UN	R\$ 56,44	R\$ 74,54	R\$ 1.043,57	R\$ 347,86
15.14	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	37,00	UN	R\$ 66,17	R\$ 87,40	R\$ 3.233,69	R\$ 1.077,90

15.15	91996	SINAPI/SP	TOMADAMÉDIADEEMBUTIR(1MÓDULO),2P+T10A,INCLUINDOSUPORTEE PLACA-FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	13,00	UN	R\$ 41,53	R\$ 54,85	R\$ 713,09	R\$ 237,70
15.16	92008	SINAPI/SP	TOMADABAIXADEEMBUTIR(2MÓDULOS),2P+T10A,INCLUINDOSUPORTEE PLACA-FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	49,00	UN	R\$ 56,31	R\$ 74,37	R\$ 3.644,35	R\$ 1.214,78
15.17	92000	SINAPI/SP	TOMADABAIXADEEMBUTIR(1MÓDULO),2P+T10 A,INCLUINDOSUPORTEE PLACA-FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 36,64	R\$ 48,39	R\$ 96,79	R\$ 32,26
15.18	91925	SINAPI/SP	CABODECOBREFLEXÍVELISOLADO,1,5MM²,ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	300,00	M	R\$ 3,76	R\$ 4,96	R\$ 1.489,02	R\$ 1.489,02
15.19	91927	SINAPI/SP	CABODECOBREFLEXÍVELISOLADO,2,5MM²,ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	300,00	M	R\$ 5,00	R\$ 6,60	R\$ 1.980,25	R\$ 1.980,25
15.20	91929	SINAPI/SP	CABODECOBREFLEXÍVELISOLADO,4MM²,ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	5,00	M	R\$ 7,28	R\$ 9,62	R\$ 48,10	R\$ 48,10
15.21	91931	SINAPI/SP	CABODECOBREFLEXÍVELISOLADO,6MM²,ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_03/2023	200,00	M	R\$ 10,21	R\$ 13,48	R\$ 2.696,62	R\$ 2.696,62
15.22	98307	SINAPI/SP	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	AF_11/2019	7,00	UN	R\$ 49,99	R\$ 66,02	R\$ 462,15	
15.23	98295	SINAPI/SP	CABOELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL-FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_11/2019	100,00	M	R\$ 3,86	R\$ 5,10	R\$ 510,41	R\$ 510,41
15.24	38.01.120	CDHU	EletrodutodePVC Rígido roscaável de 2" - com acessórios		10,00	M	R\$ 59,07	R\$ 78,01	R\$ 780,07	R\$ 780,07
15.25	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes		1,00	UN	R\$ 1.538,92	R\$ 2.032,45	R\$ 2.032,45	R\$ 2.032,45
15.26	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 11,98	R\$ 15,82	R\$ 79,12	
15.27	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 56,58	R\$ 74,72	R\$ 373,60	
15.28	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 56,58	R\$ 74,72	R\$ 74,72	
15.29	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO	EINSTALAÇÃO.AF_10/2020	5,00	UN	R\$ 60,31	R\$ 79,64	R\$ 398,22	
15.30	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 63A		1,00	UN	R\$ 74,60	R\$ 98,53	R\$ 98,53	
15.31	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A		1,00	UN	R\$ 1.447,12	R\$ 1.911,21	R\$ 1.911,21	
15.32	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63A x 30mA - 4 polos		1,00	UN	R\$ 333,90	R\$ 440,98	R\$ 440,98	
15.33	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos		1,00	UN	R\$ 311,74	R\$ 411,72	R\$ 411,72	
15.34	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios		30,00	M	R\$ 161,51	R\$ 213,31	R\$ 6.399,35	R\$ 3.199,67
15.35	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios		30,00	M	R\$ 42,39	R\$ 55,98	R\$ 1.679,37	R\$ 839,69
TOTAL GERAL+148:1161									R\$ 466.000,00	R\$ 64.388,65

Valor Total: Sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos

Jaú, 29 de maio de 2025

ANA LUIZA GRIZZO

BERTOLDI:1824015682

7

Assinado de forma digital por ANA LUIZA GRIZZO

BERTOLDI:18240156827

Dados: 2025.05.29 08:26:59 -03'00'

Ana Luiza Grizzo Bertoldi
Responsável Técnica
CPF. 182.401.568-27

```

!#$ %&'
%
) ( (
*****
( %+ %) ( ,,
( / ( /
% ) % ( -01 "2# 3# ! #4! %+
( ( 5
) ( ( % ( "#! $"#$
2# #!"2!67 4$ 2$ #! &8!4! $ !#9 / / ; !< ='& 4$ . / !
< 4$8&"&#& 4$ = 2$ ; "23<#4! " %+
#&8&,!;! $" &!4! $ ( (
*****
( ( , "#!
*****
< 4$ #"4& $"#
"23<#12/ &"8 !; $2 $ 2$ &; 2 # !"2!;& !"2
"8 !; $2/ $;
<! !; $2/ ;!";$<! $"# 4$ 43 # 2 $ 2$ &; 2
3 &4 &!
$;
<! !; $2 " ! 2 <3;& "4!2 " 2 ;!"1&2
>!1&#3!&2 !0$";&! $ $ !&2 ;!"1&2 4$
!#"4& $"#
#"4& $"# ! 4$8&;&$"#2 !34&#& 2 3 8!<
"8 !; $2/ $;
<! !; $2/ ;!";$<! $"# 4$ ;! #! $ 3# 2 43# 2 $ 2$ &; 2 4$ 3
&4 &!

```



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

XBYZKAUCP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/06/2025 às 14:25:15

Chave de Acesso

UFGWFZ2H5TX7J2ML8Q6QD703A3T94ZD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 52.196.207/0001-87	RG/Inscrição Estadual 401.371.502.111	Inscrição Municipal 000094645	Nome/Razão Social VGB CONSTRUTORA LTDA
Logradouro RUA FRANCISCO CARVALHAES DE PAIVA, 169	Complemento	Bairro CHACARA BRAZ MIRAGLIA	E-mail LAGRIZZO@GMAIL.COM
CEP 17207280	Cidade JAU-SP	Telefone	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br
CEP/Cod. Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 14 3602 6522	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Contrato por empreitada global de reforma parcial visando a adequação do pronto socorro da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Bariri (parte II) Contrato nº 02/2025 Esta nota refere-se ao serviço executado no mês de maio/2025	64.388,65	R\$ 64.388,65

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000007.0000005	Código CNAE 7112000
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o			
Valor Total dos Serviços R\$ 64.388,65	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64.388,65
		Total do ISS R\$ 1.287,77	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (64.388,65 x 0,65%) R\$ 418,53	COFINS (64.388,65 x 3,00%) R\$ 1.931,66	INSS (64.388,65 x 11,00%) R\$ 708,27	IRRF R\$ 0,00	CSLL (64.388,65 x 1,80%) R\$ 1.210,51	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------------	--	---	------------------	--	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 58.831,91

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VGB CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XBYZKAUCP.

Data

CPF/RG

Assinatura



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 2 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

O início da semana foi marcado pela continuidade dos serviços na obra de reforma do Pronto Socorro. A equipe seguiu com as atividades de fechamento de alvenarias em pontos definidos pelo projeto, além da execução do reboco em paredes que já se encontram com estrutura concluída. A retirada dos entulhos acumulados ao longo das frentes de serviço também foi mantida, contribuindo para a organização e segurança do canteiro. Os trabalhos estão sendo executados por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

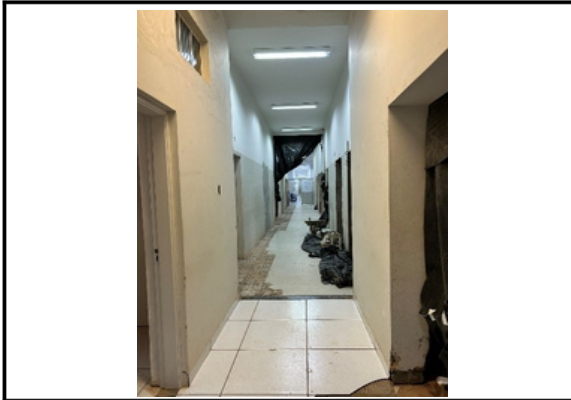


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

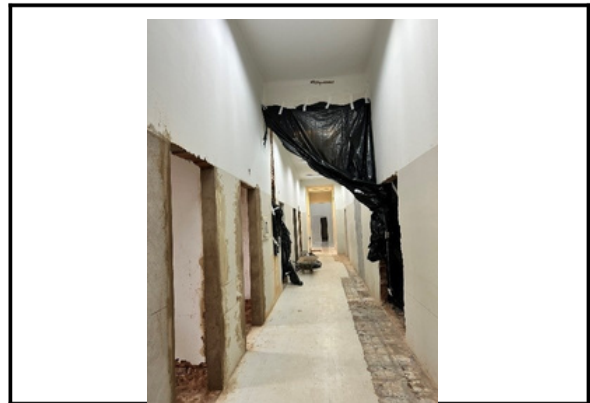


IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 3 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe deu sequência aos serviços da reforma do Pronto Socorro, dando continuidade nas atividades de alvenaria. Seguem em andamento os fechamentos de paredes conforme o novo layout previsto, além da aplicação de reboco em trechos previamente preparados. A retirada dos entulhos gerados permanece sendo realizada de forma contínua, colaborando para a manutenção das condições adequadas de trabalho no canteiro. Os serviços estão sendo executados por uma equipe composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

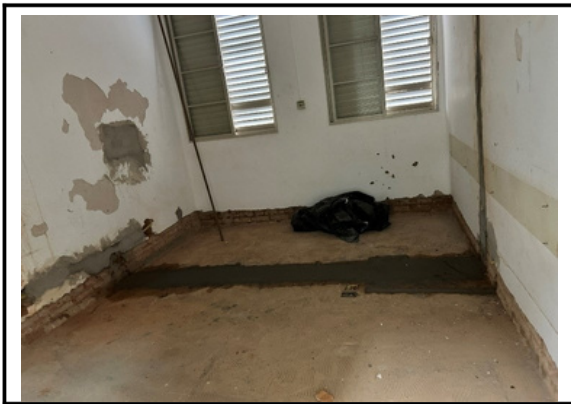


IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

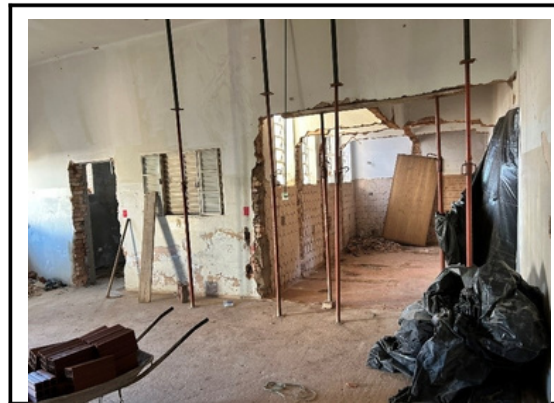


IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 4 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de serviço da obra de reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento nesta data. A equipe permanece executando o fechamento de paredes em áreas previamente definidas, assim como a aplicação de reboco em trechos já prontos para acabamento. A remoção dos entulhos continua sendo realizada paralelamente às demais atividades, garantindo a limpeza e a organização do canteiro de obras. Os trabalhos seguem com a atuação de 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

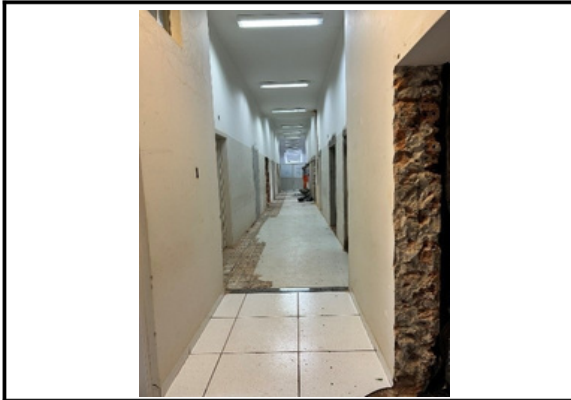


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

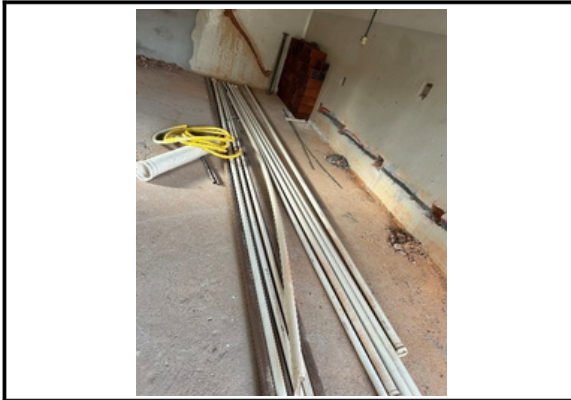


IMAGEM 09



IMAGEM 10

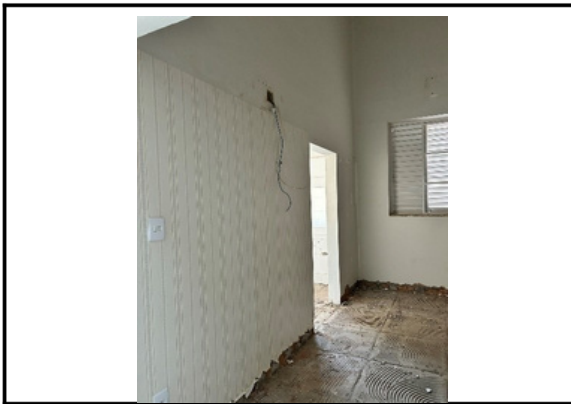


IMAGEM 11



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 5 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com prosseguimento nas execuções de fechamento de alvenarias conforme a reorganização dos ambientes. Simultaneamente, avançaram os serviços de reboco em paredes já levantadas e regularizadas. A remoção dos entulhos acumulados segue ocorrendo de forma constante, garantindo melhores condições operacionais no canteiro. A equipe permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

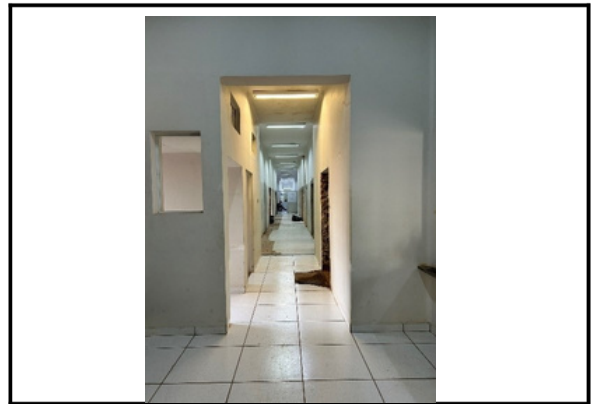


IMAGEM 04



IMAGEM 05

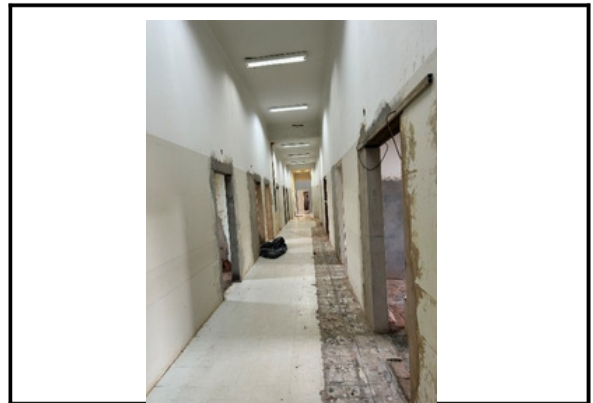


IMAGEM 06

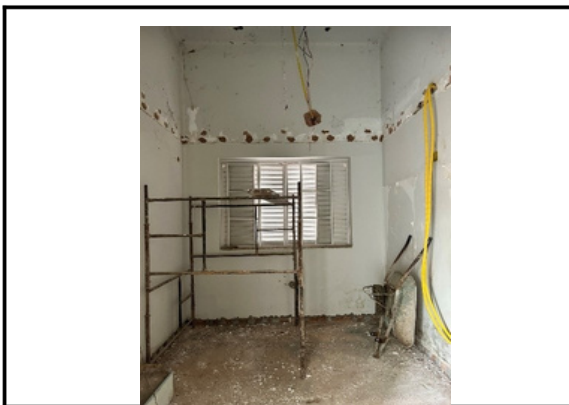


IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 6 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, os serviços na obra de reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento. As atividades concentraram-se na continuidade do fechamento de paredes em áreas previamente definidas, bem como na execução do reboco em superfícies já levantadas. A limpeza do canteiro também foi mantida, com a retirada progressiva dos entulhos gerados durante as frentes de serviço. A equipe segue composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

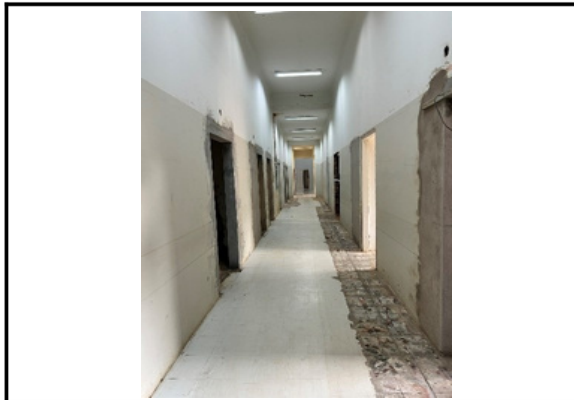


IMAGEM 01



IMAGEM 02

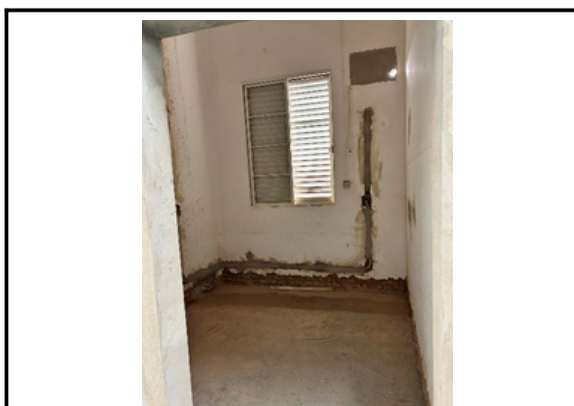


IMAGEM 03



IMAGEM 04

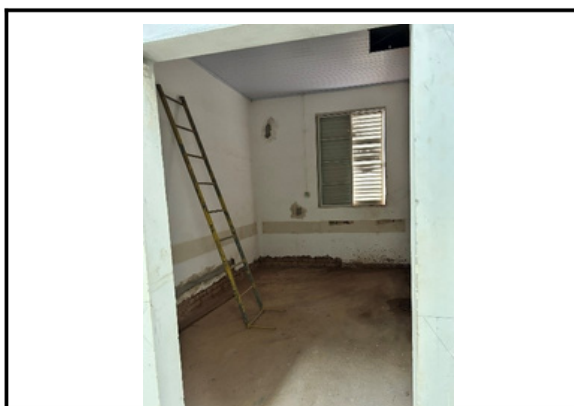


IMAGEM 05

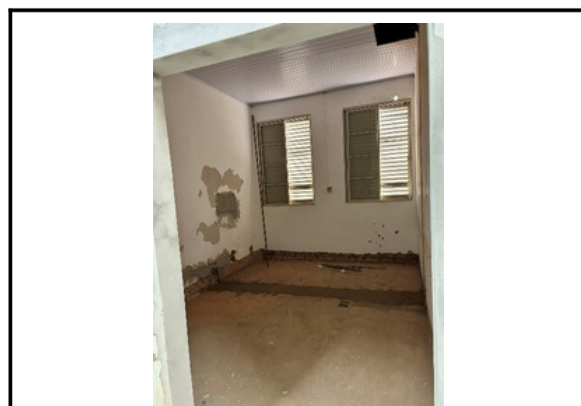


IMAGEM 06

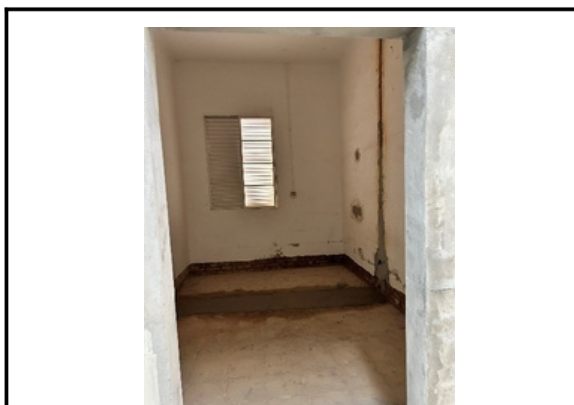


IMAGEM 07

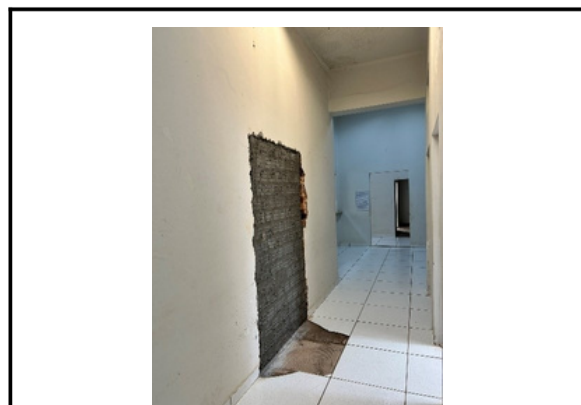


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

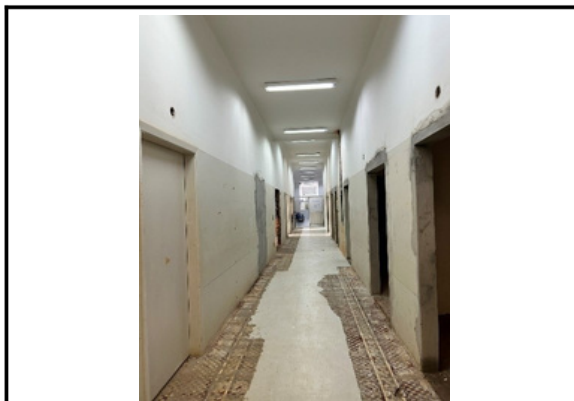


IMAGEM 09

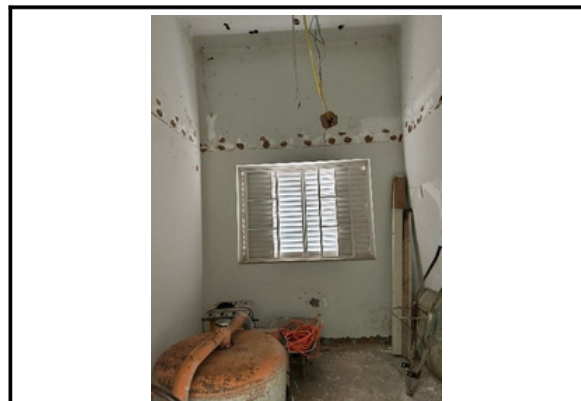


IMAGEM 10

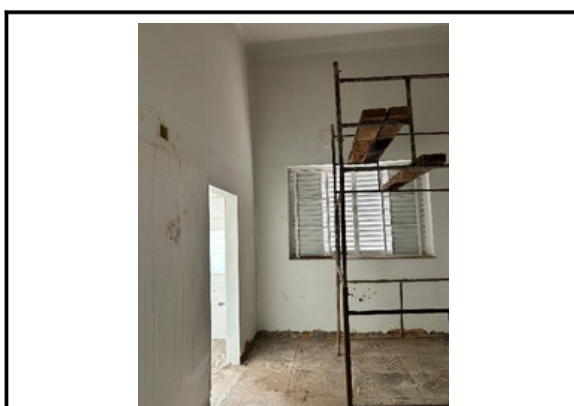


IMAGEM 11



IMAGEM 12

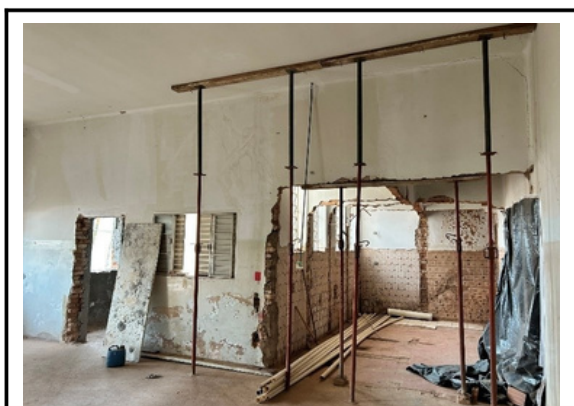


IMAGEM 13

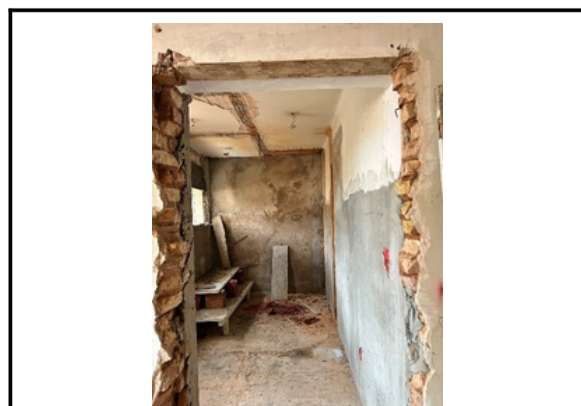


IMAGEM 14



IMAGEM 15



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 9 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No início da semana, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro avançaram com a manutenção das frentes de alvenaria, dando continuidade ao fechamento de paredes e ao reboco de superfícies previamente erguidas. Houve também ênfase na retirada de boa parte do piso antigo, como parte da preparação para as novas etapas de acabamento. A remoção dos entulhos gerados permanece sendo realizada de forma contínua, contribuindo para a organização do canteiro. Os trabalhos seguem com o apoio de uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

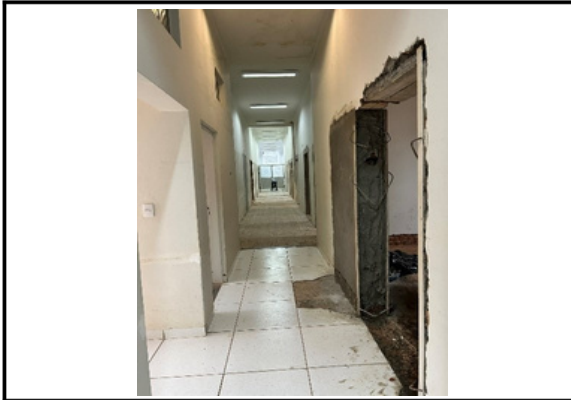


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07

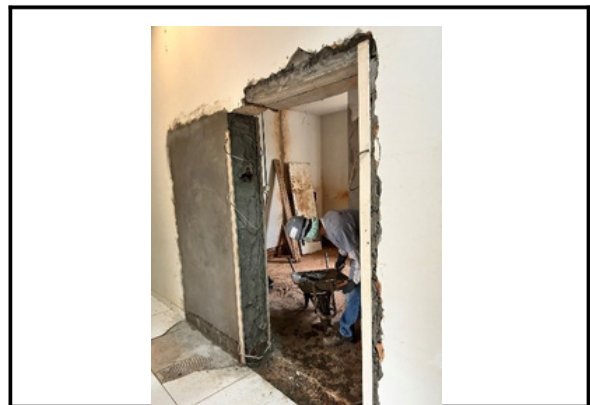


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 10 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da obra de reformado Pronto Socorro prosseguiram nesta data, com continuidade nos serviços de alvenaria, incluindo o fechamento de paredes e aplicação de reboco em trechos previamente levantados. Foi dada ênfase à remoção parcial do piso antigo, etapa necessária para a preparação da nova base. A limpeza do canteiro segue sendo realizada paralelamente, com a retirada dos entulhos acumulados. A equipe permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

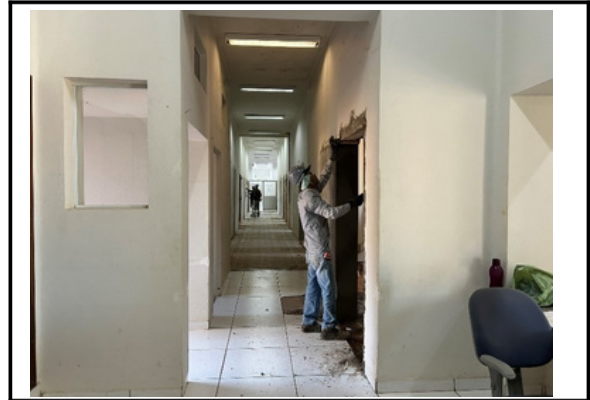


IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

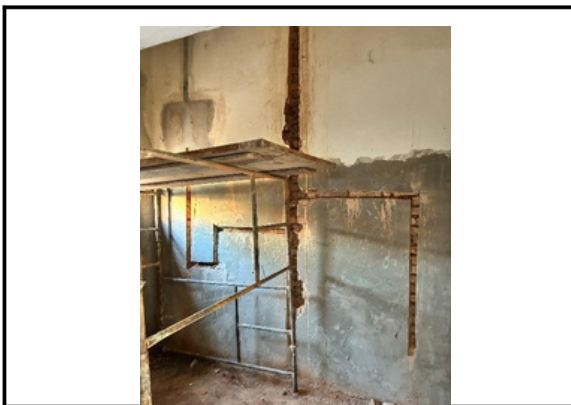


IMAGEM 07

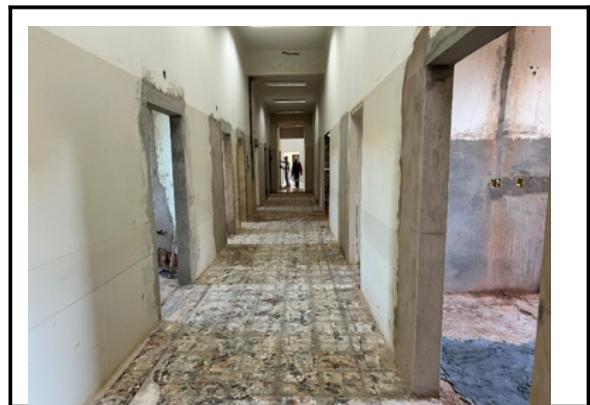


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 11 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade com a execução das alvenarias de fechamento ainda em andamento, bem como os serviços de reboco em paredes já erguidas. Parte da equipe concentrou esforços na retirada de trechos remanescentes do piso antigo, atividade necessária para as próximas etapas de regularização do contrapiso. A remoção dos entulhos gerados pelas frentes de trabalho também segue sendo realizada. A equipe operacional permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

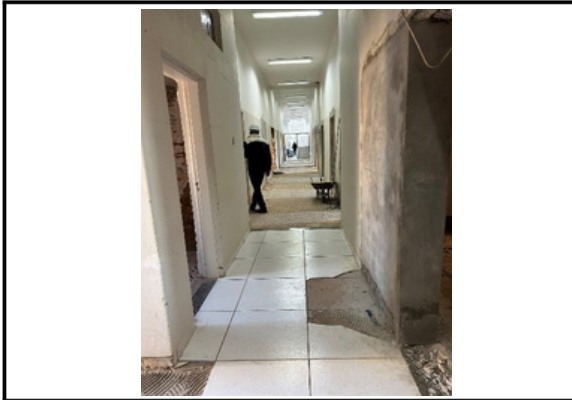


IMAGEM 01

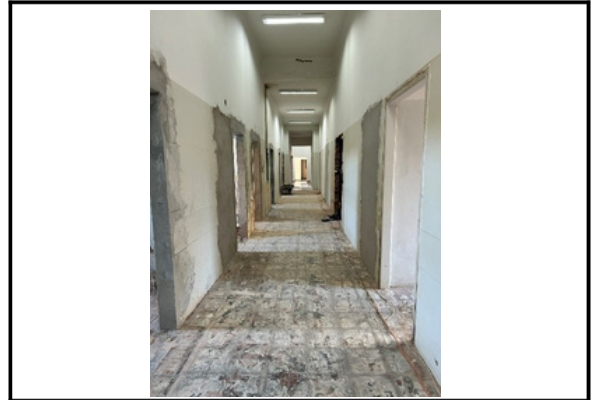


IMAGEM 02



IMAGEM 03

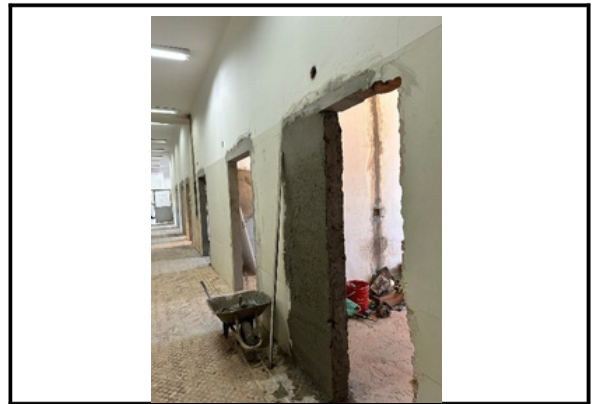


IMAGEM 04

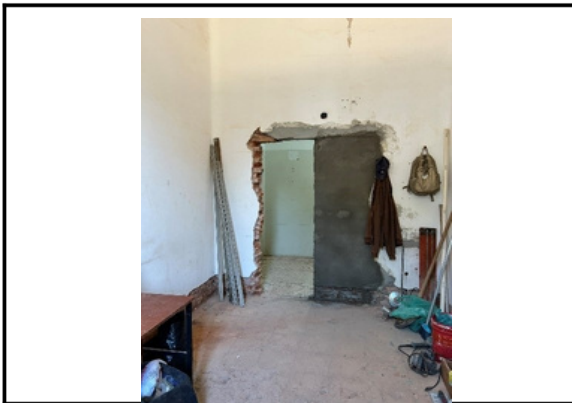


IMAGEM 05

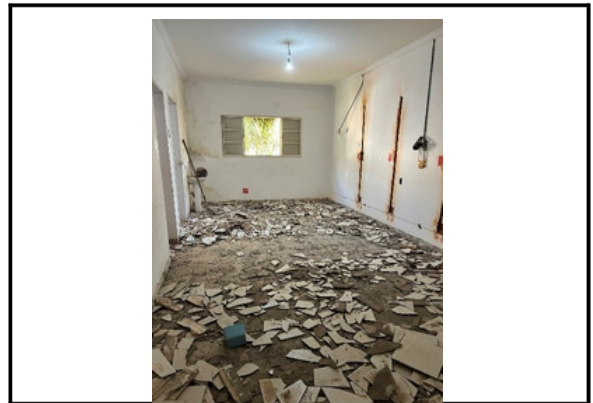


IMAGEM 06

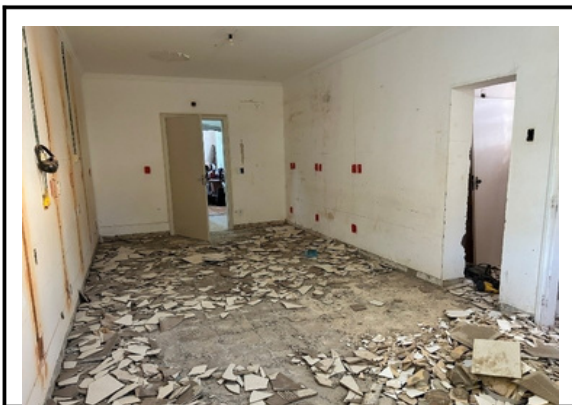


IMAGEM 07

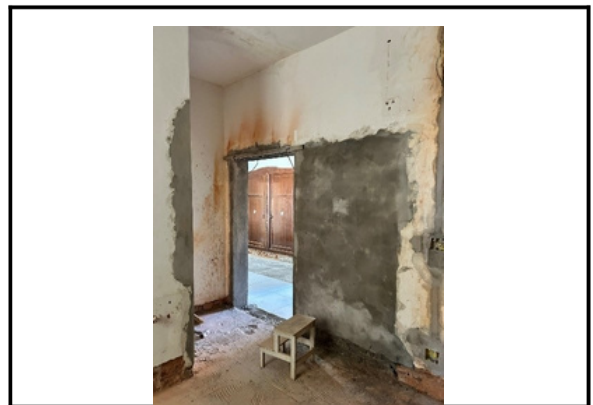


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 12 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro avançaram com a continuidade das atividades de alvenaria, com prosseguimento no fechamento de divisórias e execução de reboco em paredes já levantadas. Nesta etapa, foi dada atenção especial à remoção de parte do revestimento de piso antigo, visando à preparação das áreas para os serviços subsequentes. A coleta e retirada dos entulhos continuam sendo executadas de forma paralela, garantindo a manutenção da organização no canteiro. As atividades seguem sendo realizadas por uma equipe composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

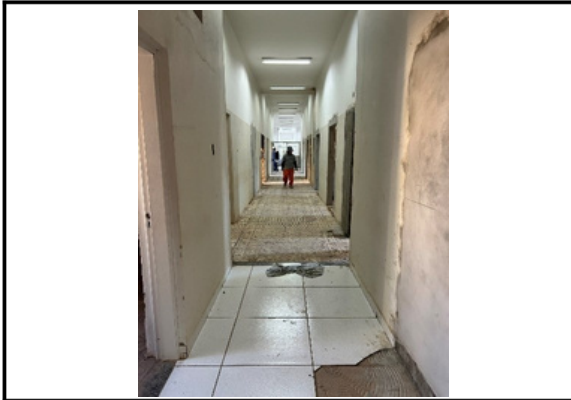


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 13 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, as frentes de trabalho na reforma do Pronto Socorro mantiveram o ritmo de execução. Foram dados avanços nas atividades de alvenaria, com continuidade no fechamento de paredes e aplicação de reboco em trechos previamente executados. Paralelamente, as equipes concentraram esforços na retirada parcial do revestimento de piso antigo. A retirada de entulho gerado ao longo do processo foi mantida de forma contínua. As atividades seguem com o efetivo de 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

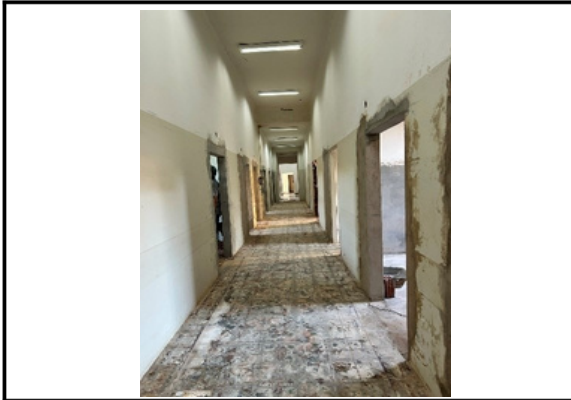


IMAGEM 01



IMAGEM 02

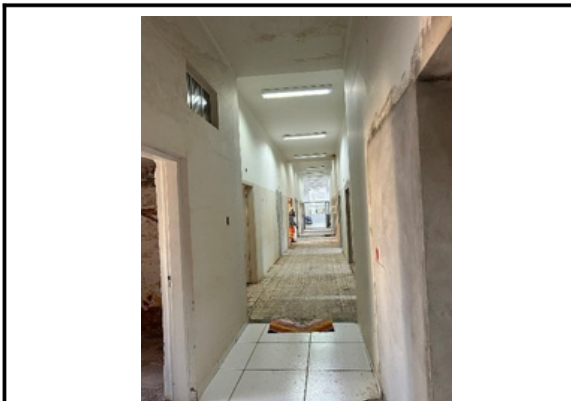


IMAGEM 03

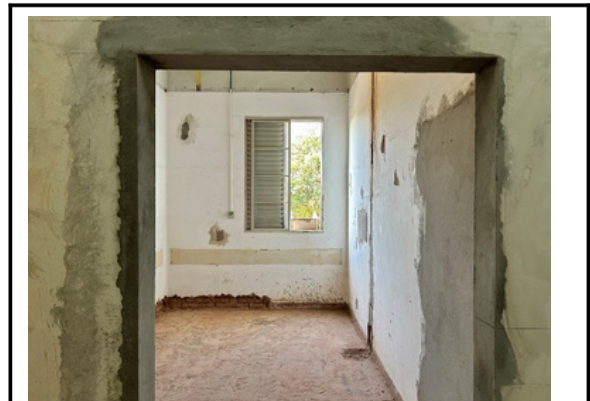


IMAGEM 04



IMAGEM 05

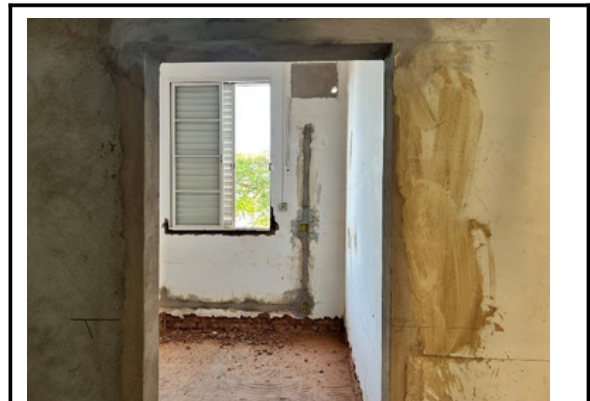


IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 16 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	****
VISITANTES NO LOCAL:	****
EPI's EM USO:	****

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe de obra compareceu ao canteiro, entretanto, conforme orientação repassada pela fiscalização, as atividades foram suspensas. A decisão foi tomada em função da comunicação recebida via e-mail pela equipe técnica do hospital na última sexta-feira, informando sobre a paralisação e rescisão contratual. Dessa forma, nenhuma atividade foi executada no local neste dia.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 17 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, foi realizada uma reunião técnica no canteiro de obras, com a presença da proprietária da empresa executora, Sra. Ana, do engenheiro responsável técnico, Sr. Alan, e da equipe gestora do hospital, representada pela Sra. Eliana e pela diretora Marina Prearo. O objetivo do encontro foi alinhar os termos referentes ao encerramento contratual da empresa com a obra em questão. Ficou acordado entre as partes que a empresa concluirá os serviços hidráulicos atualmente em execução, bem como as intervenções estruturais previstas, conforme detalhado no e-mail formal encaminhado na data de hoje.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

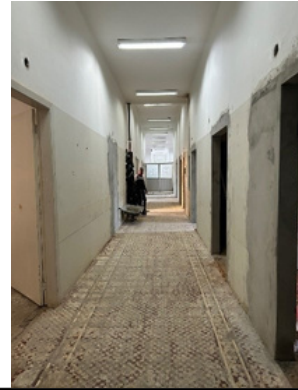


IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

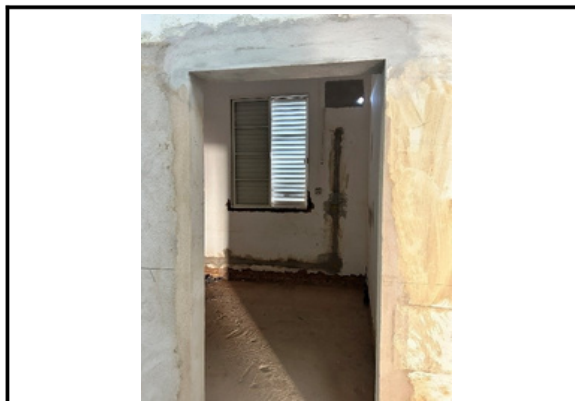


IMAGEM 09



IMAGEM 10



IMAGEM 11



IMAGEM 12



IMAGEM 13



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 18 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro foram retomados, com foco na conclusão das frentes de trabalho previamente acordadas. As atividades se concentraram na finalização dos serviços remanescentes, com ênfase nos sistemas hidráulicos e nos elementos estruturais localizados na área do hall de acesso. As ações seguem em conformidade com o que foi definido na reunião realizada anteriormente com a equipe técnica e representantes da instituição hospitalar.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

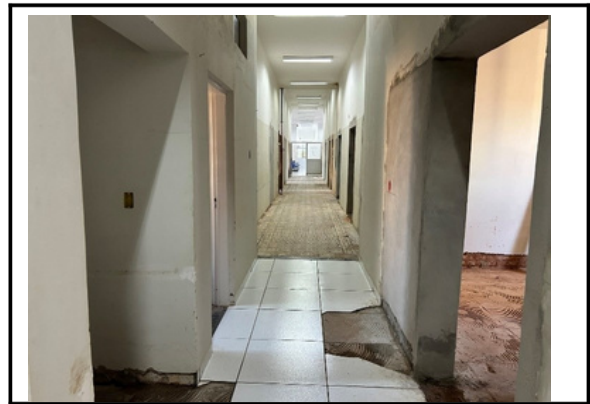


IMAGEM 04



IMAGEM 05

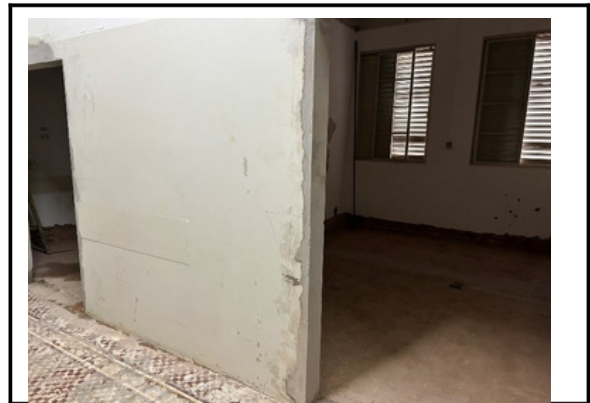


IMAGEM 06



IMAGEM 07

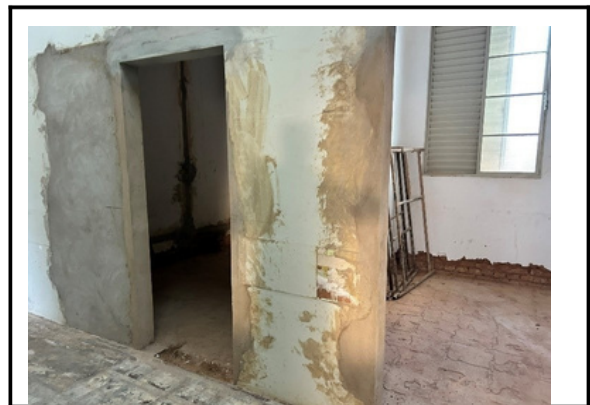


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 19 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	****
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	****
VISITANTES NO LOCAL:	****
EPI's EM USO:	****

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, não houve expediente devido ao feriado

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 20 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, a equipe deu continuidade aos serviços da obra de reforma do Pronto Socorro, concentrando-se na conclusão das frentes de trabalho remanescentes. As atividades foram direcionadas à finalização dos sistemas hidráulicos e das intervenções estruturais localizadas no hall de acesso, conforme planejamento previamente estabelecido. Os trabalhos seguem conforme o escopo acordado com a equipe técnica responsável.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

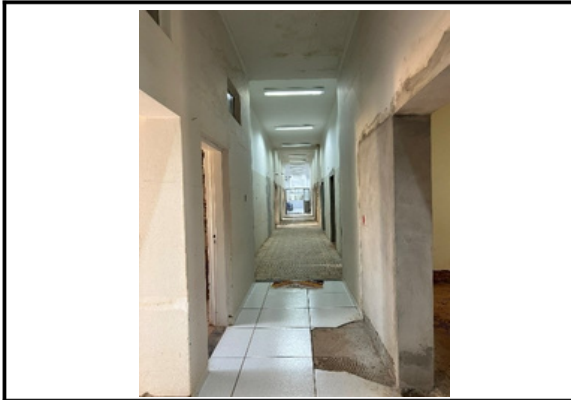


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

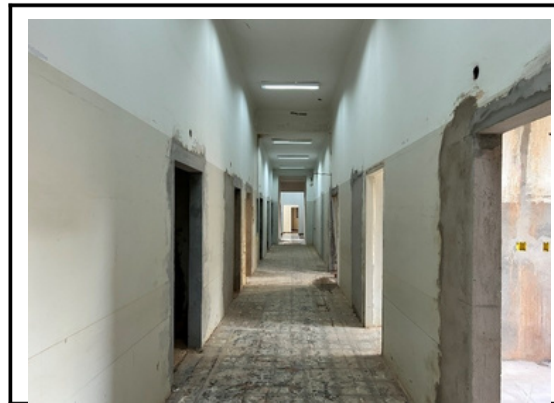


IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 23 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro foram retomados, marcando o início da semana com continuidade nas frentes de serviço em andamento. As atividades concentraram-se na finalização dos itens remanescentes relacionados às instalações hidráulicas e aos elementos estruturais no hall de acesso. Ressalta-se que, neste dia, a equipe em campo foi reduzida, contando com apenas dois colaboradores para a execução das tarefas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

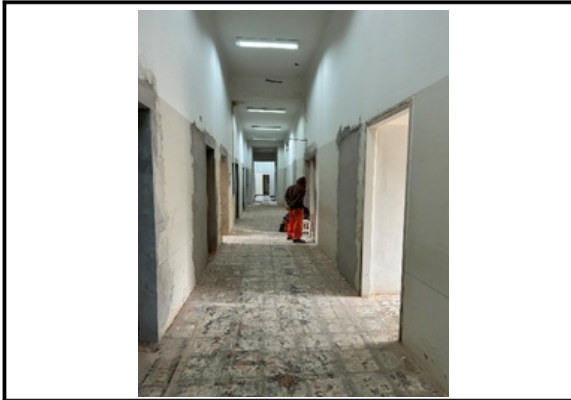


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

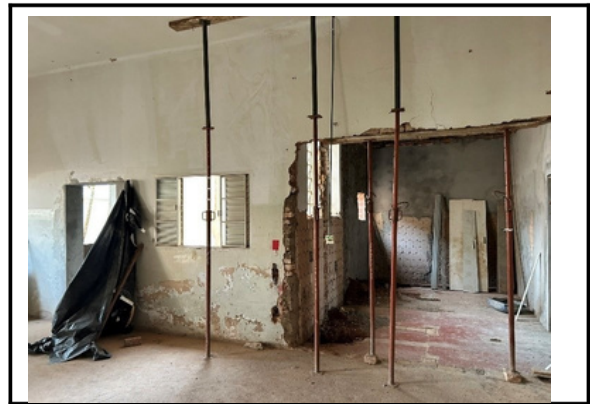


IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 24 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com foco na conclusão dos itens remanescentes referentes às instalações hidráulicas e à estrutura do hall de acesso. As atividades seguiram em ritmo mais desacelerado, devido à manutenção da equipe reduzida, composta por apenas dois colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

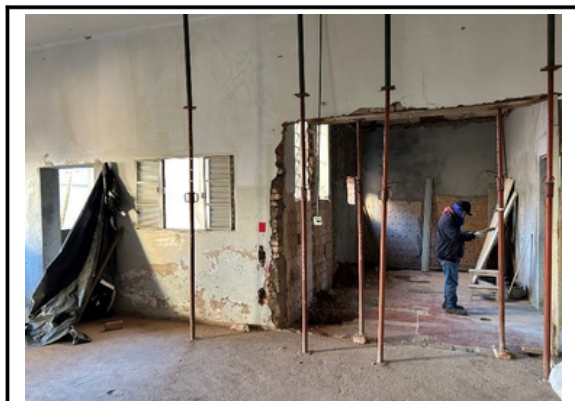


IMAGEM 01



IMAGEM 02

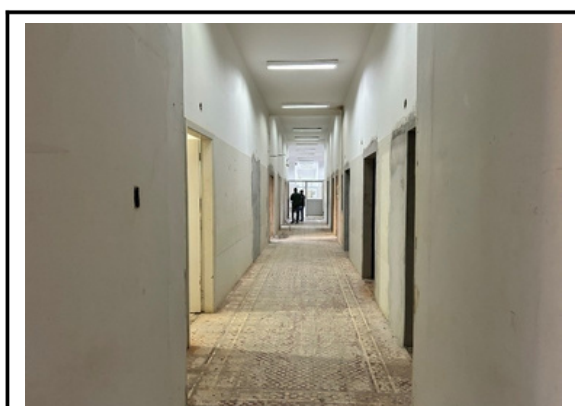


IMAGEM 03



IMAGEM 04

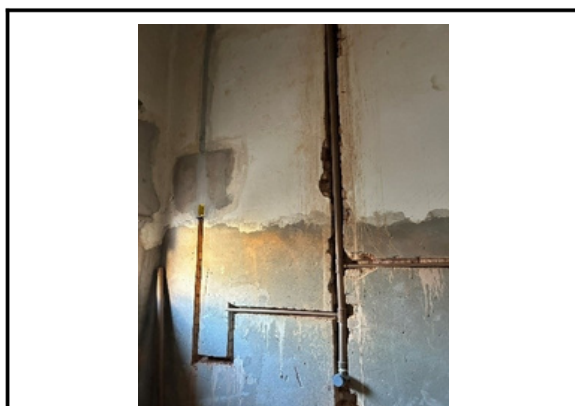


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 25 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro prosseguiram com foco na continuidade das atividades hidráulicas remanescentes. Os trabalhos seguem em ritmo mais lento, em razão da permanência de equipe reduzida, composta por dois colaboradores. Ressalta-se que, apesar do avanço na parte hidráulica, não houve progresso nas intervenções estruturais previstas para o hall de acesso.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 26 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com ênfase na conclusão dos serviços hidráulicos remanescentes, conforme previsto no escopo. As frentes relacionadas à parte estrutural do hall de acesso, entretanto, permaneceram sem avanço. As atividades do dia foram executadas por uma equipe composta por quatro colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

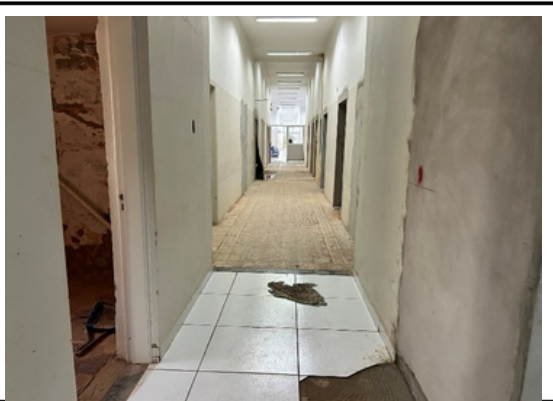


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 27 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, os serviços de reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento, com continuidade nas atividades voltadas à finalização dos sistemas hidráulicos remanescentes. Observa-se, entretanto, a ausência de progresso nas intervenções estruturais previstas para o hall de acesso. As atividades foram conduzidas por equipe reduzida, composta por dois colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

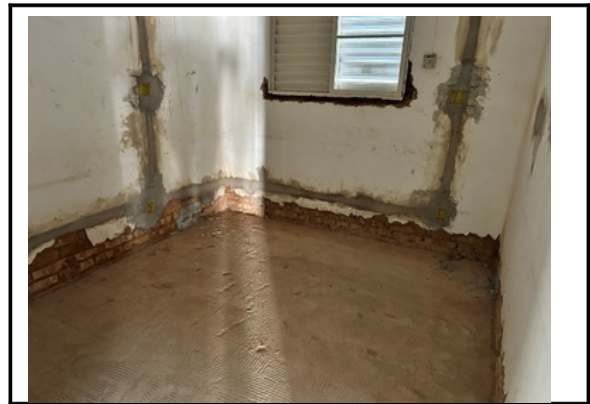


IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 30 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com foco na conclusão das atividades remanescentes referentes ao sistema hidráulico. Os trabalhos foram realizados por equipe composta por dois colaboradores. Ressalta-se que, conforme previsto, esta data marca o encerramento do prazo estipulado para finalização dos serviços em questão, bem como o término do vínculo contratual com a empresa VGB, em decorrência de definições documentais previamente acordadas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

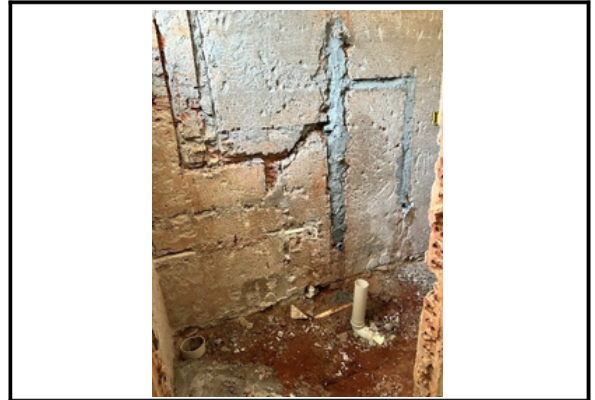


IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

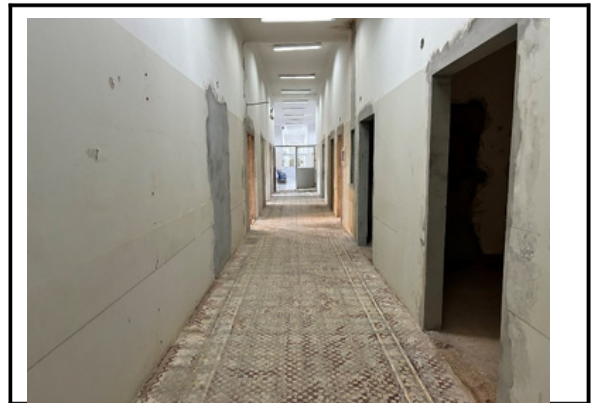


IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08
