



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

03/2025

REFORMA PS I

Maio 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Adm 53/2025

Bariri, 29 de julho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2025 – Mês de Referência: MAIO.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª os demonstrativos financeiros do mês de maio do Termo de Convênio 03/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO



ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIAL MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV. ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARINA FREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO CONV. 03/2025 REFORMA PS - I
EXERCÍCIO 05/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/05/2025	R\$	05/05/2025		R\$
15/05/2025	16.520,75	16/05/2025		16.520,75
	R\$			R\$
	16.952,58			16.952,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.473,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 33.473,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 33.473,33

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA FREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA MANDADO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO AV. ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARINA PREARO
CONVÊNIO CONV. 03/2025 REFORMAPS-1
EXERCÍCIO 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$

TOTAL: R\$0,00

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



!"#\$%\$ &"#\$\$(

)*+,-./ 0
12,3/ -245,35 0 67) 1)6) 89.;8<) =6
=54>2?2 ?2
5 @ 34/ 32

A""B'C !"#\$D

E3F G/H/,-535I2J.I5,32	E3F)*F 24.*5I	K235L.M3N4.-2	E2-OI5,32	P/H24 8Q	6/H?2
		6/H?2),354.24			RSRRTU
		VWXYZ[I_^[a]bc\Y[~b`dce\	F F F F	fghijRSkiTU	fghijRSkiTU
		= 8 9 : < l m n1 o 1 0 : l < E 6) l			
		VWXYZ[I_^[a]bc\Y[~b`dce\	F F F F	fghpijSiqTU	
		= 8 9 : < l m n1 o 1 0 : l < E 6) l			
		rstYuuYv`]êY`wxbcy	F	zz{[]z~zz	RSRRTU
		85,75 :/-..H			
		6) K E ;			RSRRTU

74I,/M/ 2 5 53O/?/ -2I MO-5MM2 24 <)8nm) =89)8;F



UUVWXYZXV[\]^

Za`bcVabV]defghf

ijkgle`
;><m<

]bgħ`
P4==;m<

] def g hf
8#n'oH'Hp H' 'oq' K' ' Hp
n8 p#8K9#H8' Hp r'#8#8

]Yst
332=>%2P1<O%%%;m=;

!!"	#\$ %&%%%
'()* +, - . /-0 # -5 - 67) -	#\$ 112341&1
. /-0 8# - -5 - . /-0 89 : -	1 #\$ %&%%%
-5 - . /-0 # .) . - .	#\$ %&%%%
/-0 "!!"0	#\$ %&%%%
	#\$;<&:=
	#\$ 1123>;&3
	>

? @AB C D E@ FG						
H	I)- J)*	K ()	# .) . L	8#	89:	M N67)
1%O%3OP	' .)	#\$ %&%%%	#\$ %&%%%	#\$ %&	#\$ %&	#\$ %&%%%
%PQ	' ()* +R	#\$ 112341&1	#\$ %&%%%	%%	%%	#\$ 112341&11
;=O%QOP%	:).	1	#\$;<&:=	#\$ %&	#\$ %&	#\$ %&%%%
PQ		#\$ 112341&1		%%	%%	
L # .) . - .) . 6*))* +R & S . * () -5 2		1		#\$ %&	#\$ %&	
1%O%QOP				%%	%%	8 (-- ;%O%=OP%PQ T- ;30%4
%PQ						



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 13 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Iniciou-se hoje a etapa de mobilização da obra referente à reforma do Pronto Socorro. A equipe realizou a organização e o transporte inicial de ferramentas, equipamentos e materiais essenciais para o canteiro. Também foi feito o reconhecimento preliminar das áreas de intervenção, com o objetivo de planejar adequadamente o início das atividades operacionais, previsto para o dia seguinte.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

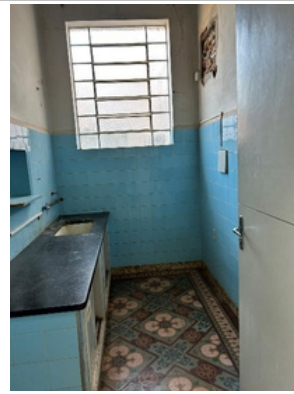


IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

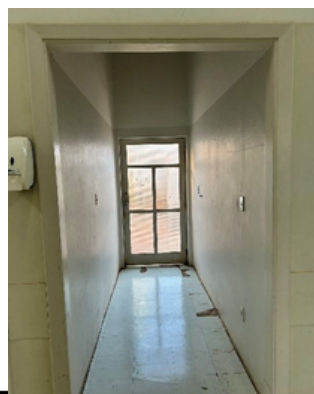


IMAGEM 05

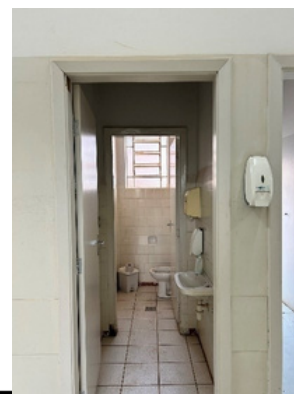


IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

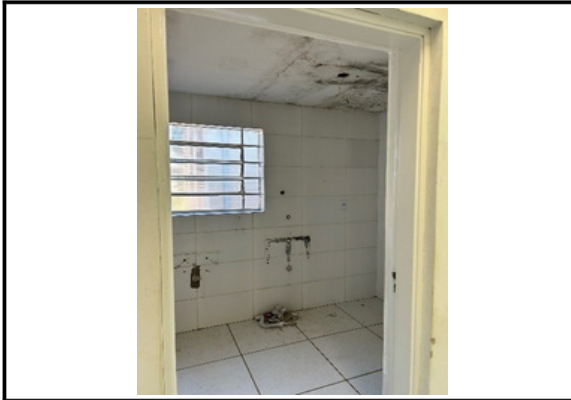


IMAGEM 09



IMAGEM 10



IMAGEM 11



IMAGEM 12

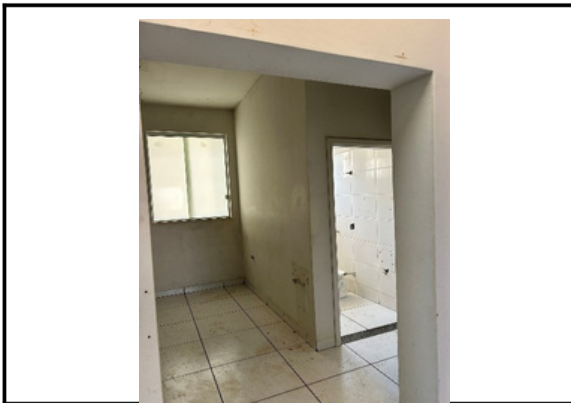


IMAGEM 13



IMAGEM 14

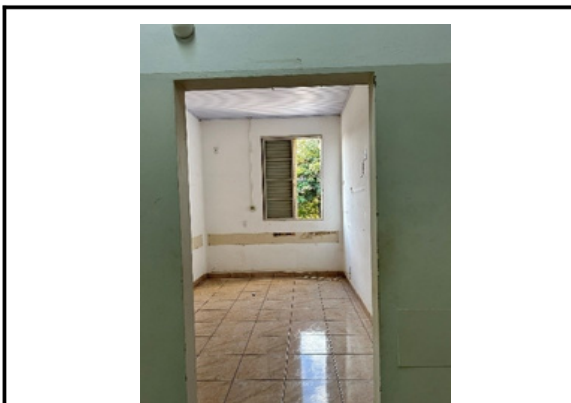


IMAGEM 15

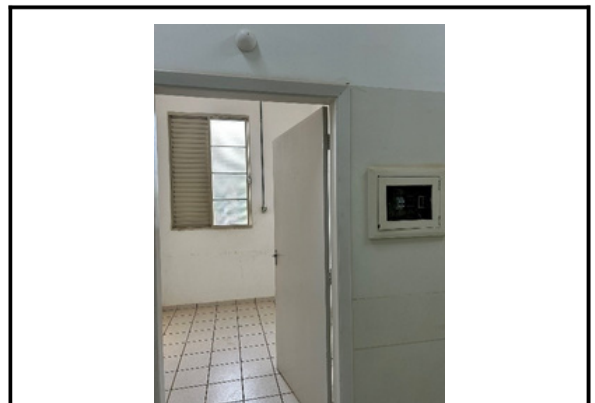


IMAGEM 16

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 17



IMAGEM 18



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 14 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Iniciaram-se hoje os serviços efetivos da obra de reforma do Pronto Socorro. A equipe deu início às atividades de demolição com intensidade, adotando como estratégia a execução setorizada por lados do edifício. A área atualmente em intervenção foi devidamente isolada com lona plástica, como medida de contenção para minimizar a dispersão de poeira e resíduos nas demais áreas em uso. Os trabalhos estão sendo executados por uma equipe composta por 5 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

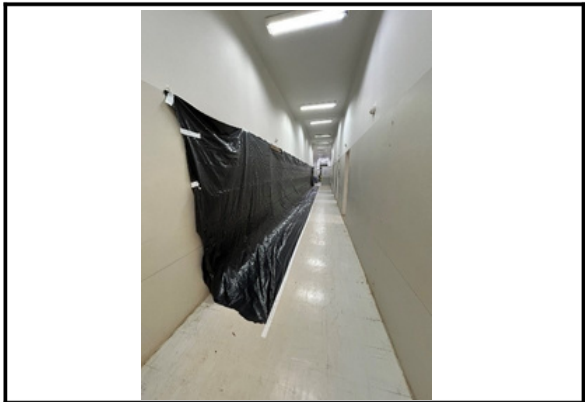


IMAGEM 02

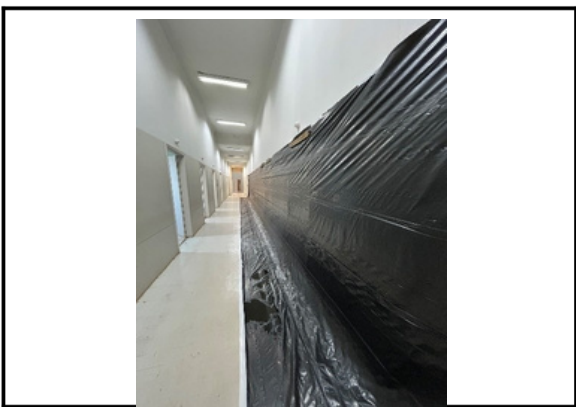


IMAGE 03

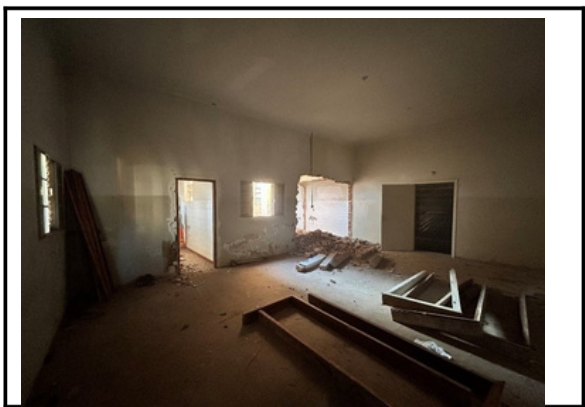


IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

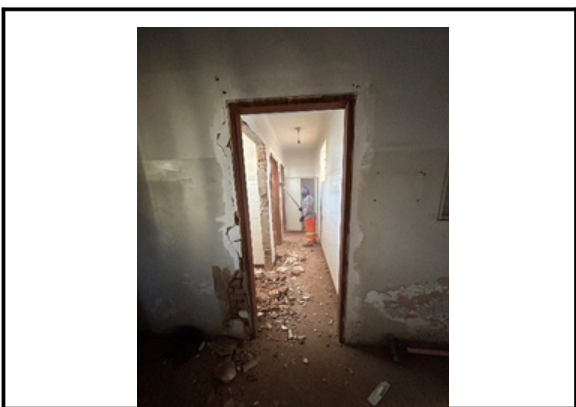


IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

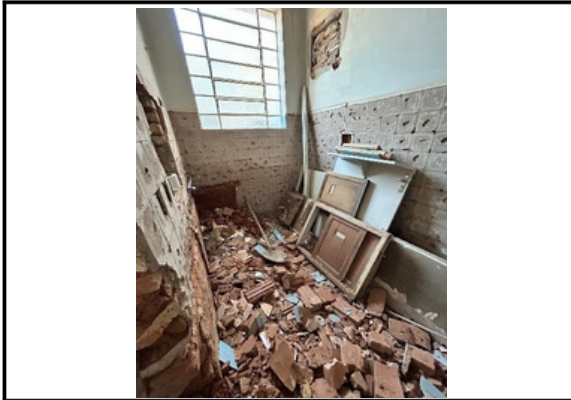


IMAGEM 09

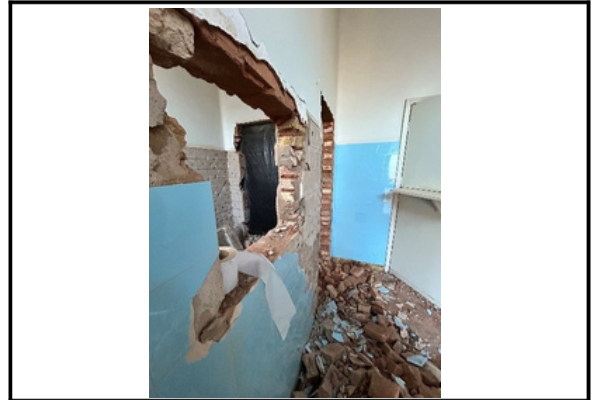


IMAGEM 10



IMAGEM 11



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 15 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços da obra de reformado Pronto Socorro tiveram continuidade nesta data. As atividades de demolição prosseguiram com intensidade, mantendo a estratégia de execução setorizada adotada anteriormente. Paralelamente à demolição, iniciou-se a retirada dos entulhos gerados, visando manter a organização e segurança do canteiro de obras. As frentes de trabalho estão sendo executadas por uma equipe composta por 5 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

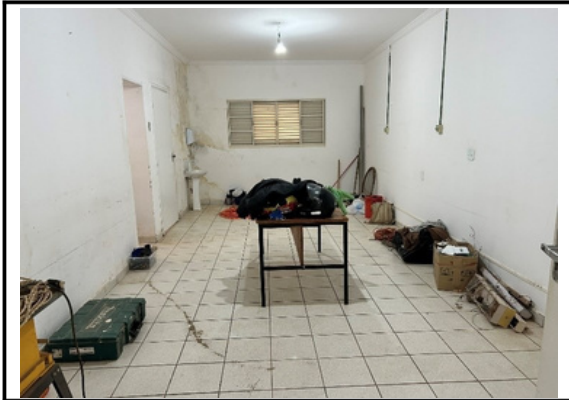


IMAGEM 01

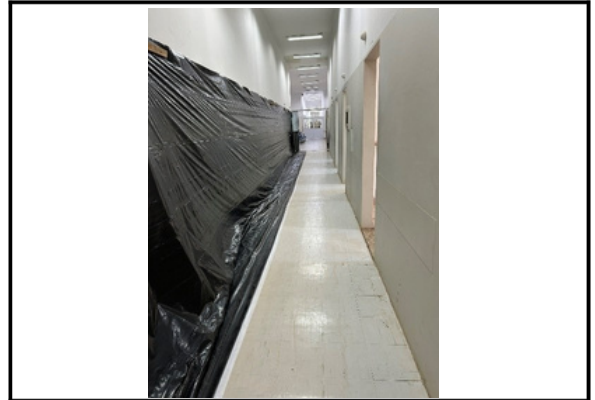


IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

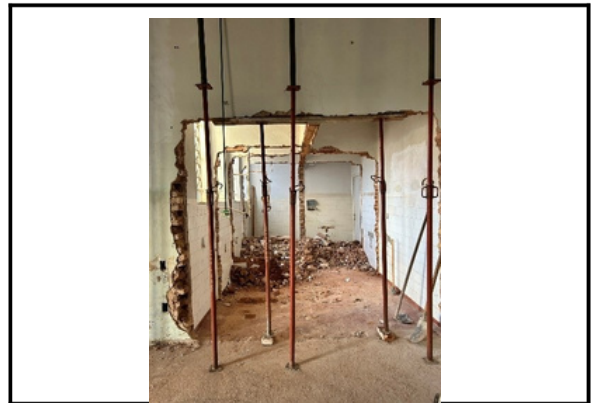


IMAGEM 06

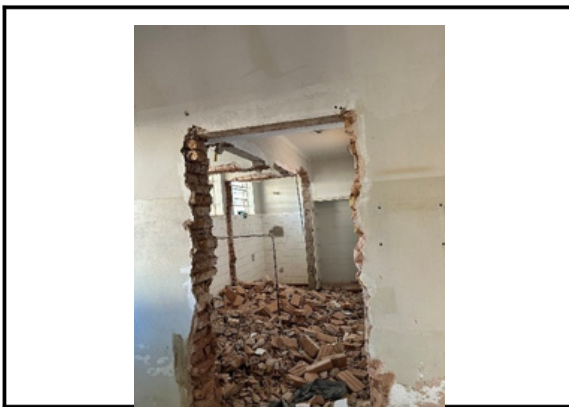


IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 16 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento. As frentes de demolição mantiveram ritmo acelerado, com continuidade dos trabalhos nas áreas previamente isoladas. Simultaneamente, foi realizada a remoção dos resíduos provenientes das demolições, contribuindo para a manutenção da limpeza e organização do ambiente. As atividades estão sendo executadas por uma equipe de 5 trabalhadores alocados no local.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

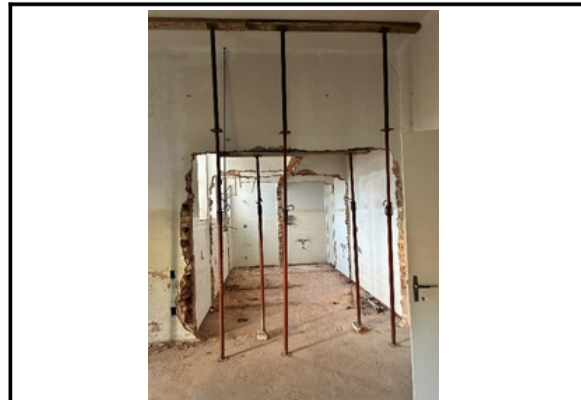


IMAGEM 02

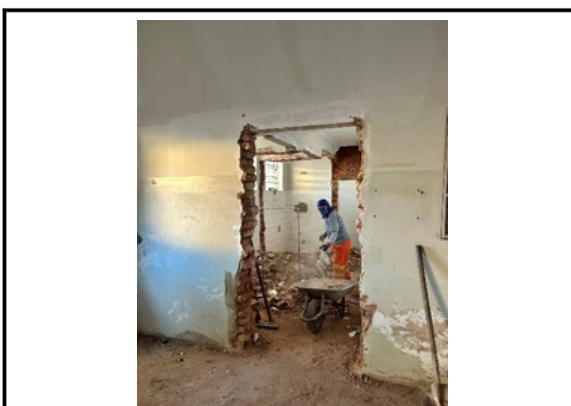


IMAGEM 03

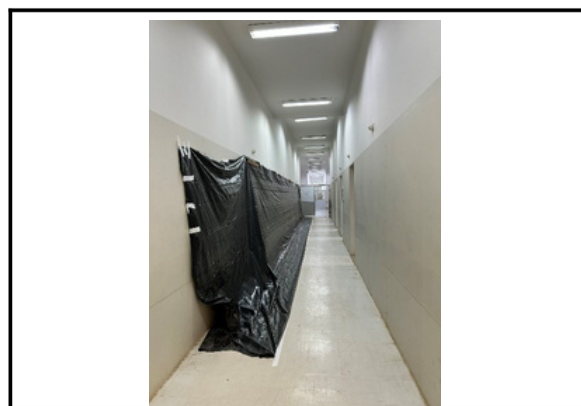


IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 19 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade nesta data. As atividades de demolição prosseguiram com bom ritmo de execução, mantendo a intensidade dos dias anteriores. A equipe também avançou com a retirada simultânea dos entulhos acumulados, promovendo a liberação gradual das áreas demolidas. Os serviços seguem sendo executados por 5 trabalhadores, garantindo a produtividade conforme o cronograma previsto.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

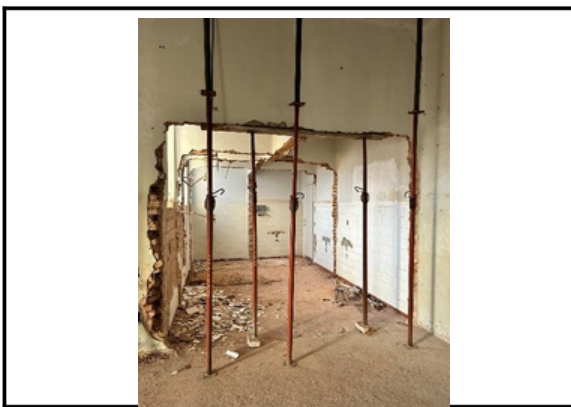


IMAGEM 03

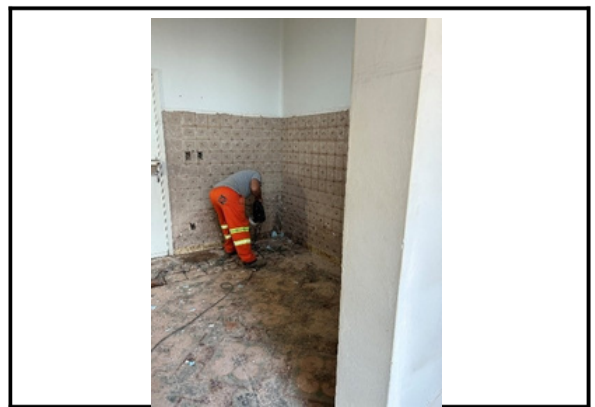


IMAGEM 04



IMAGEM 05

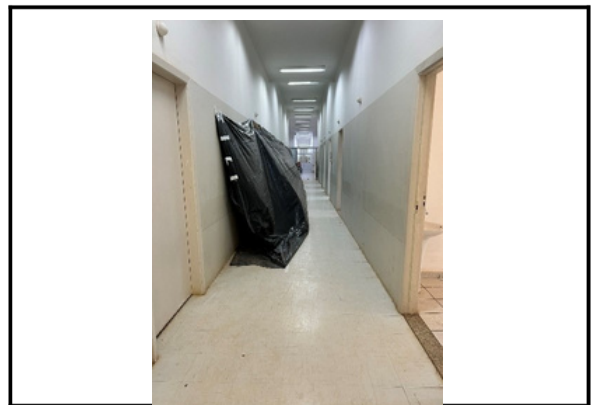


IMAGEM 06

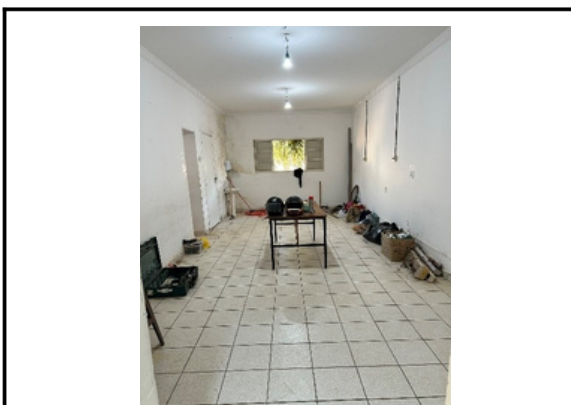


IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 20 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Dando prosseguimento às intervenções na reforma do Pronto Socorro, os serviços de demolição permaneceram em execução com intensidade. As atividades seguem conforme o planejamento, e continuam sendo realizadas de forma setorizada. Concomitantemente, está sendo feita a remoção dos entulhos gerados, o que tem contribuído para a organização e segurança do canteiro. A equipe envolvida permanece composta por 5 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

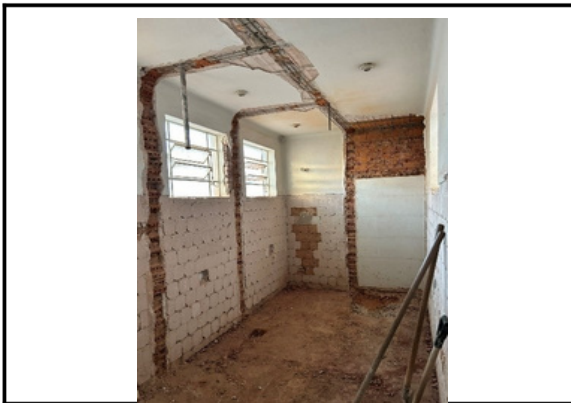


IMAGEM 05

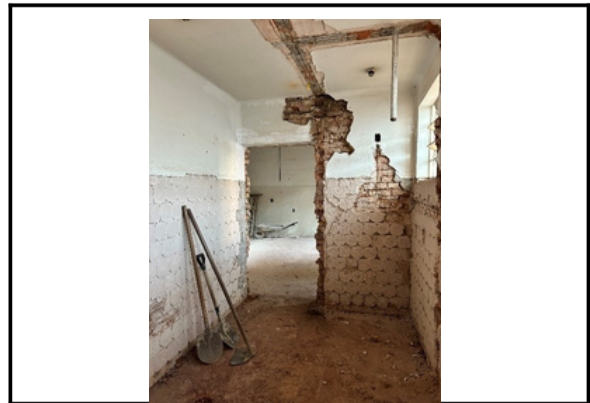


IMAGEM 06

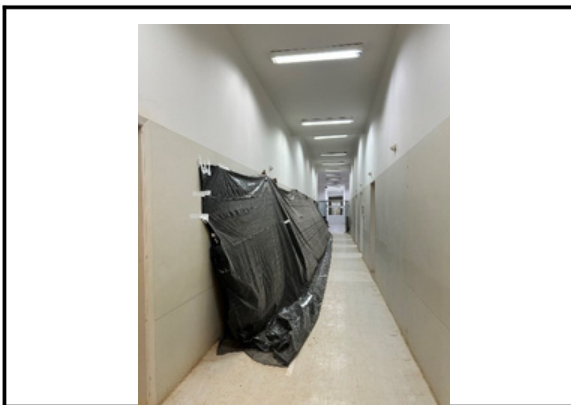


IMAGEM 07

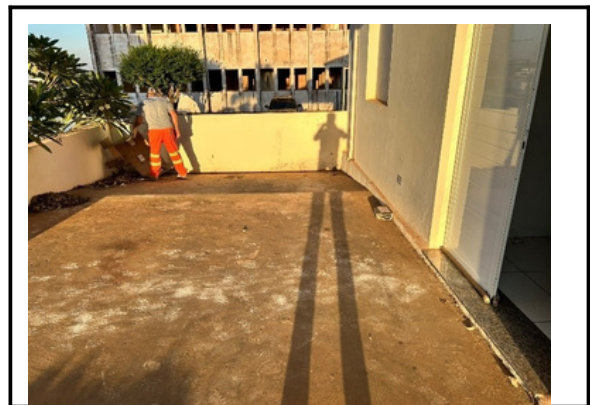


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 21 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade nesta data, com ênfase nos serviços de demolição. A equipe segue atuando com foco também na limpeza contínua do canteiro, como medida de organização e segurança. Paralelamente, prosseguiu a retirada dos entulhos gerados pelas demolições em andamento. As frentes de trabalho permanecem sendo executadas por uma equipe composta por 5 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

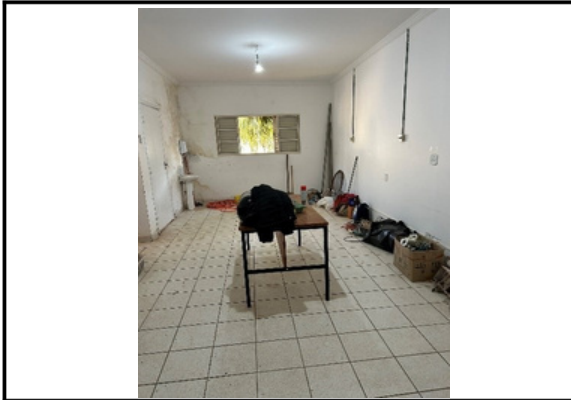


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

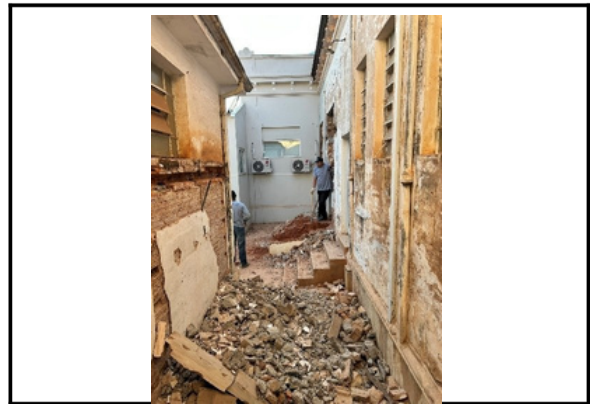


IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 22 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

A obra de reforma do Pronto Socorro seguiu com a continuidade dos serviços de demolição, que permanecem em ritmo acelerado. Nesta etapa, os trabalhos concentraram-se no lado oposto à área inicialmente atacada, seguindo o planejamento de execução setorizada. As ações de limpeza do canteiro foram mantidas de forma contínua, contribuindo para a organização e segurança do ambiente. Em paralelo, prosseguiu-se com a remoção dos entulhos gerados. As atividades estão sendo executadas por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

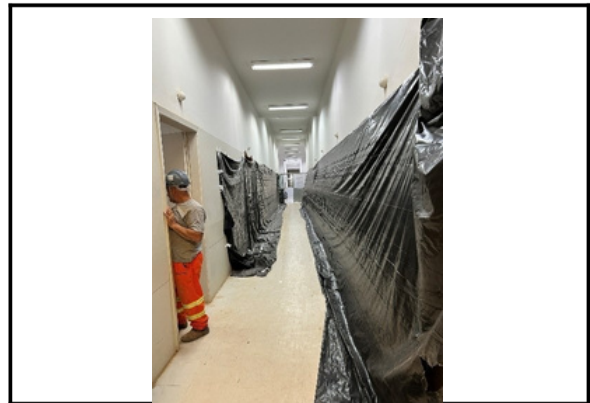


IMAGEM 06

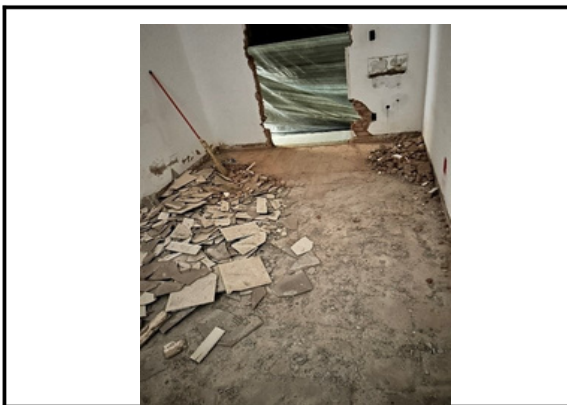


IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10

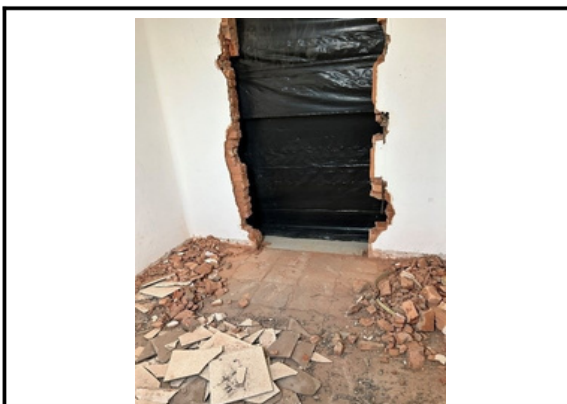


IMAGEM 11



IMAGEM 12

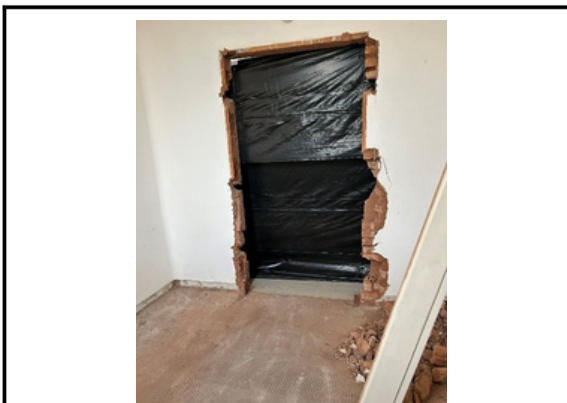


IMAGEM 13

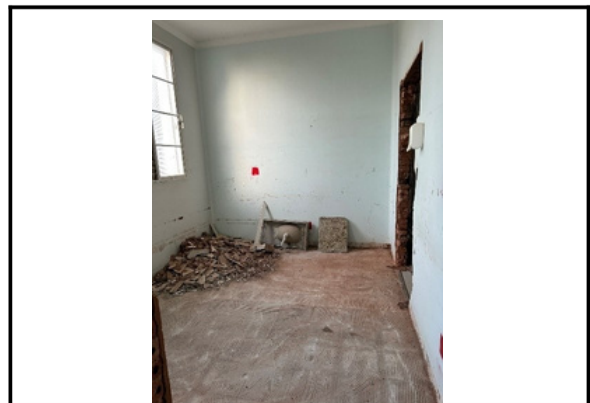


IMAGEM 14



IMAGEM 15



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 23 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos referentes à reformado Pronto Socorro avançaram nesta data, com continuidade das demolições em ritmo intenso, agora estendidas também para o lado oposto à área inicialmente atacada. Além disso, iniciaram-se os serviços de reboco em algumas paredes previamente preparadas, marcando o início das primeiras etapas de acabamento. A limpeza do canteiro foi mantida ao longo do dia, garantindo melhores condições de trabalho e segurança. Paralelamente, segue a retirada dos entulhos provenientes das demolições. As frentes de serviço estão sendo executadas por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

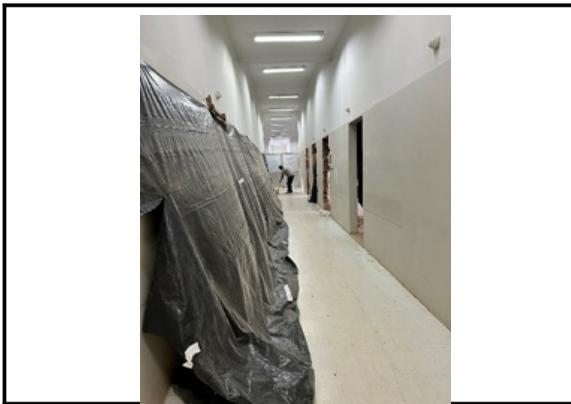


IMAGEM 03



IMAGEM 04

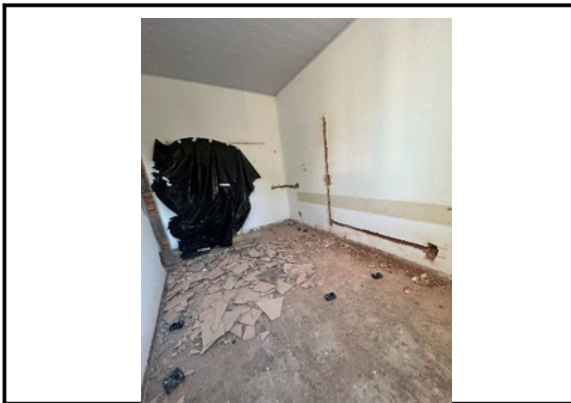


IMAGEM 05

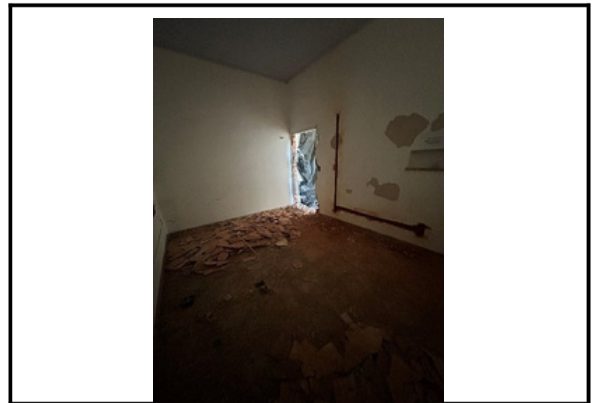


IMAGEM 06

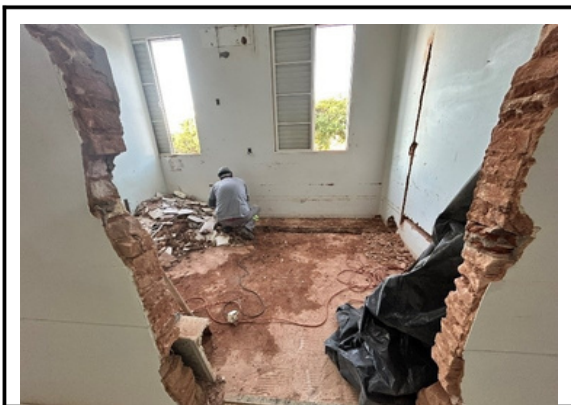


IMAGEM 07

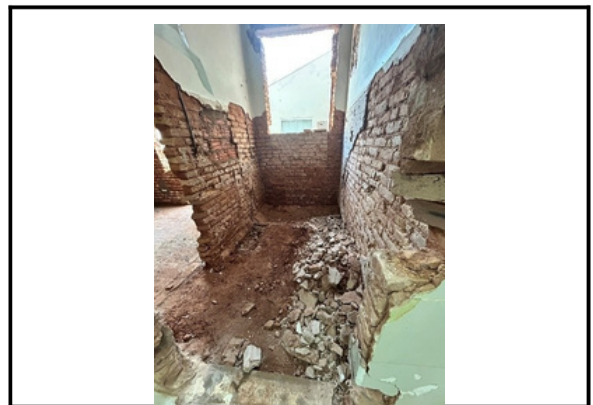


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

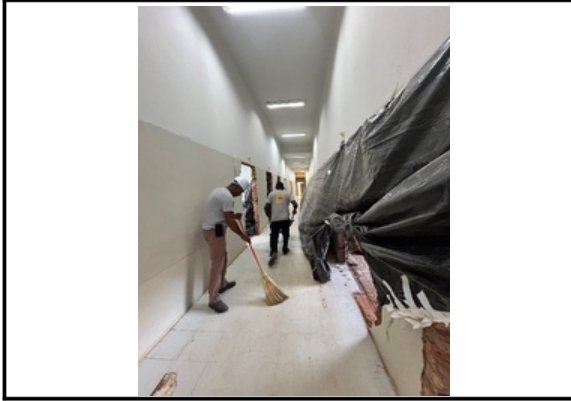


IMAGEM 09



IMAGEM 10



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 26 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe deu continuidade aos serviços da reforma do Pronto Socorro, iniciando a semana com ritmo intenso de trabalho. As atividades de demolição prosseguiram, com foco na retirada dos revestimentos de piso existentes. Em paralelo, foram iniciados os cortes em alvenarias para a passagem de eletrodutos, que servirão à futura instalação elétrica. Também teve início a escavação das valas destinadas à nova infraestrutura de esgoto. A remoção dos entulhos gerados segue em andamento, contribuindo para a manutenção da organização do canteiro. As atividades estão sendo executadas por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

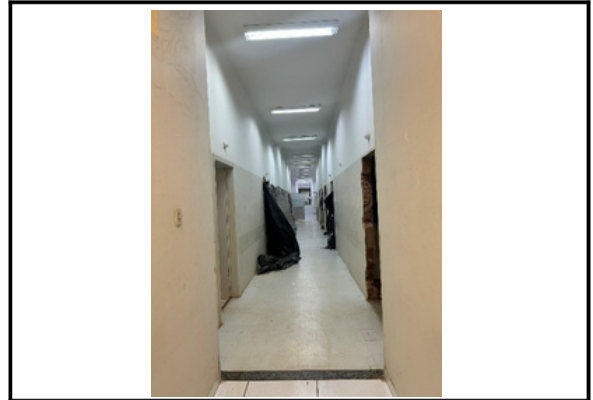


IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09

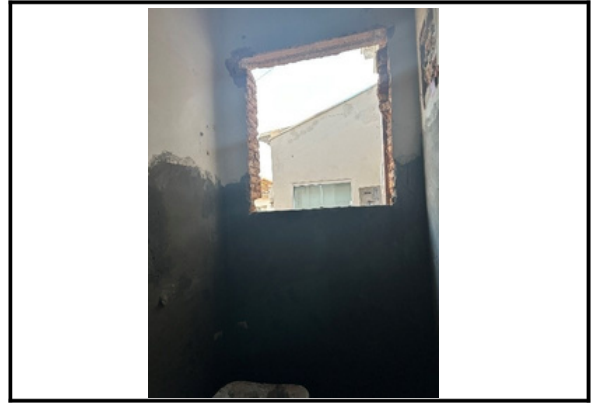


IMAGEM 10



IMAGEM 11



IMAGEM 12

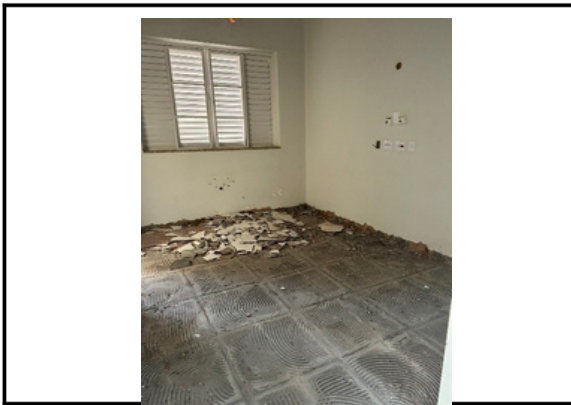


IMAGEM 13

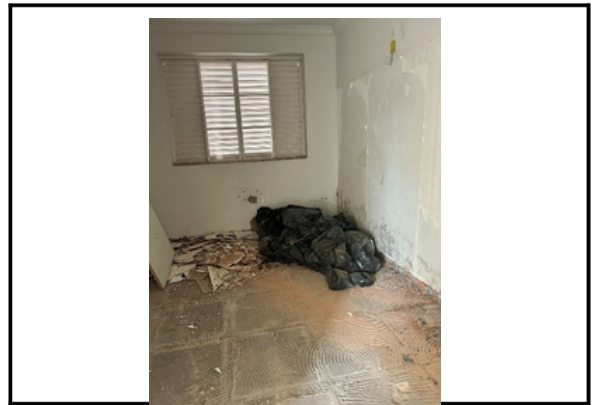


IMAGEM 14



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 27 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de trabalho da reforma do Pronto Socorro avançaram nesta data, mantendo-se o ritmo intenso das atividades. As demolições continuam com ênfase na remoção dos pisos antigos, conforme planejamento. Simultaneamente, foram iniciados os cortes em alvenarias para instalação dos conduítes elétricos, etapa preparatória para a futura passagem da fiação. Também teve prosseguimento a escavação das valas destinadas à rede de esgoto, sendo que, em alguns trechos, já foi realizada a instalação dos tubos. A retirada dos entulhos gerados segue de forma contínua, garantindo a organização do canteiro. A equipe atuante permanece composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

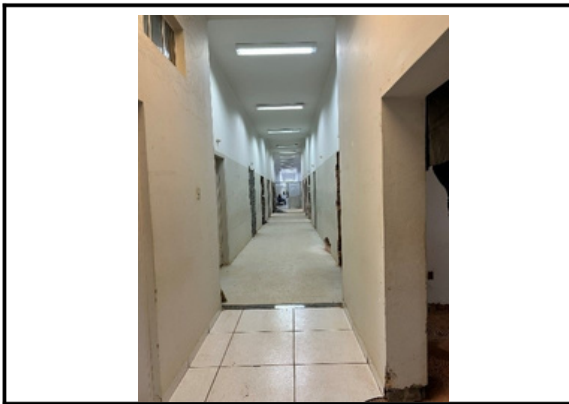


IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

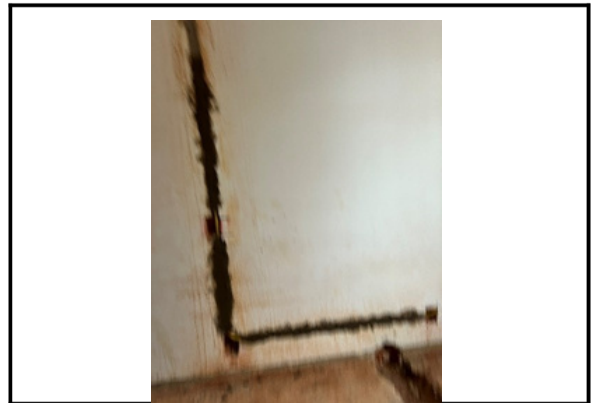


IMAGEM 06

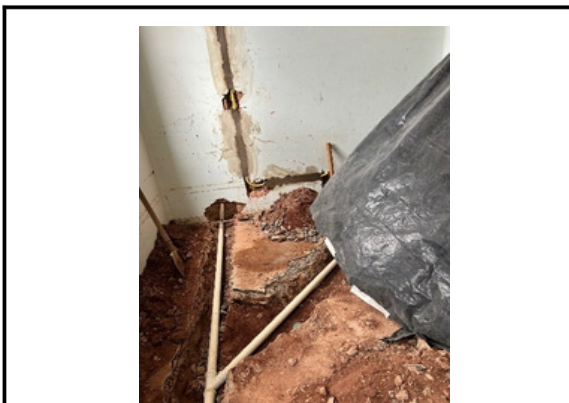


IMAGEM 07

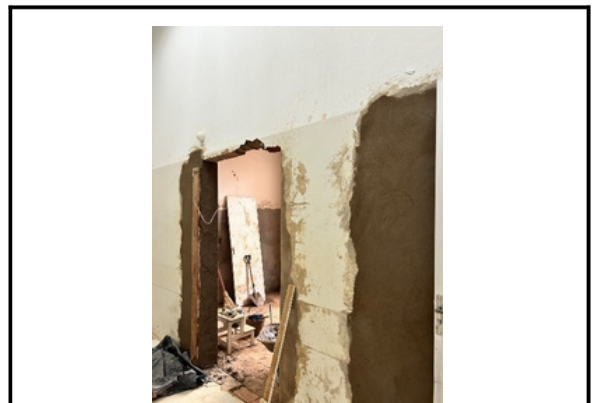


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 28 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade nesta data, mantendo-se o ritmo produtivo da equipe. Os serviços de demolição seguiram em execução com intensidade, enquanto, de forma paralela, foram iniciados os fechamentos de algumas alvenarias conforme as adequações de layout previstas em projeto. Também teve início o reboco de determinadas paredes, avançando nas etapas iniciais de acabamento. A remoção dos entulhos gerados pelas frentes de serviço continua sendo realizada de forma sistemática. As atividades estão sendo executadas por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

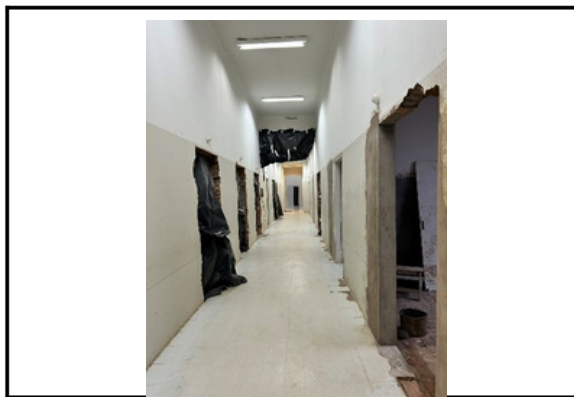


IMAGEM 05

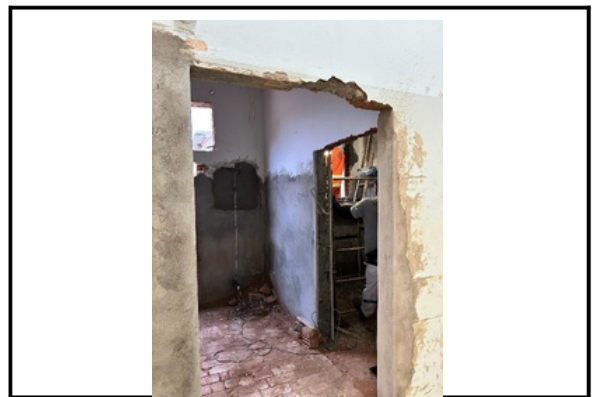


IMAGEM 06



IMAGEM 07

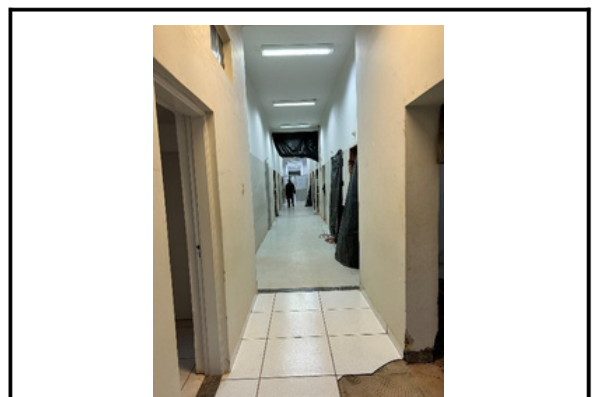


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10



IMAGEM 11



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 29 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades da obra de reforma do Pronto Socorro prosseguiram com avanços significativos. Os serviços de demolição continuam sendo executados com intensidade, conforme o cronograma estabelecido. De forma simultânea, iniciaram-se os trabalhos de alvenaria para o fechamento de paredes em áreas previamente demolidas, além da aplicação de reboco em trechos onde as superfícies já se encontravam preparadas. A retirada dos entulhos resultantes das frentes de serviço segue sendo realizada de maneira contínua, contribuindo para a organização e fluidez dos trabalhos no canteiro. A equipe permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

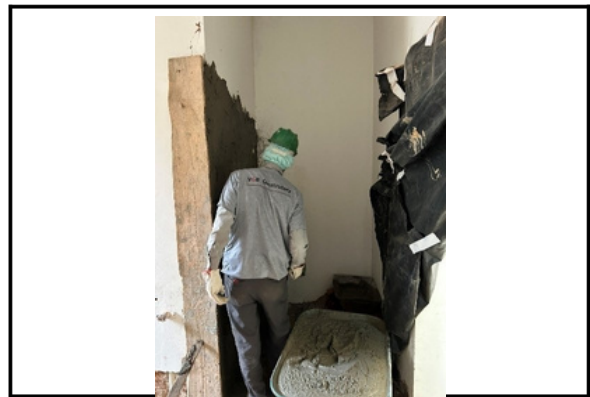


IMAGEM 04



IMAGEM 05

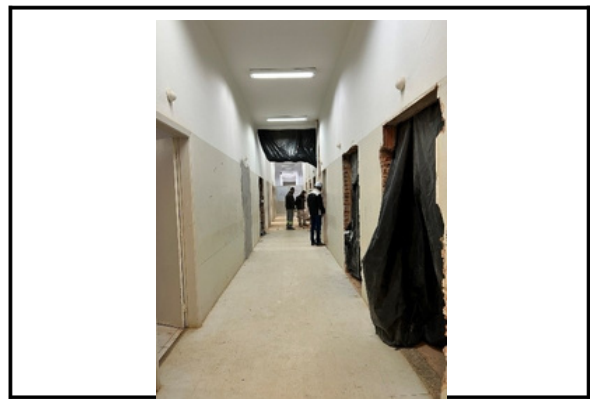


IMAGEM 06

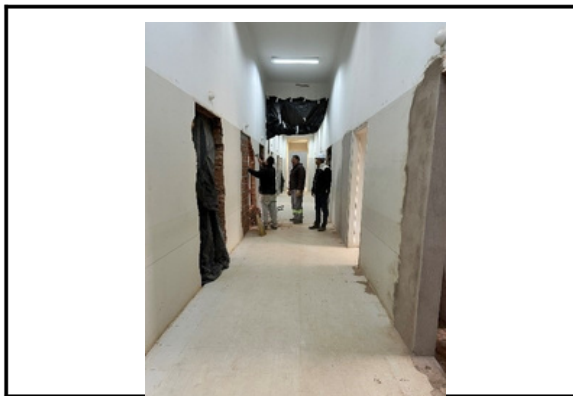


IMAGEM 07

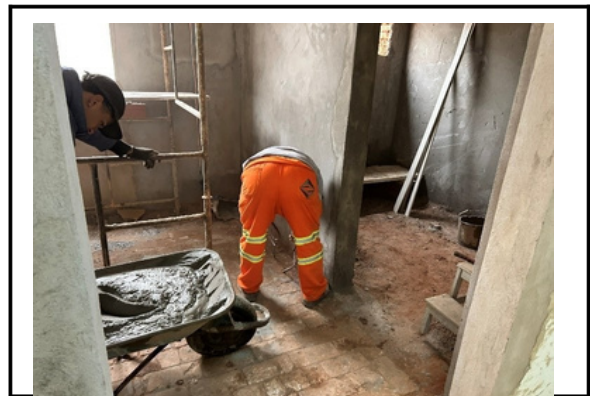


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 30 de maio de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Encerrando a semana, os serviços na obra de reforma do Pronto Socorro seguiram em ritmo intenso. As atividades de demolição continuam sendo executadas com constância, conforme as etapas previstas. Paralelamente, iniciaram-se os fechamentos de alvenarias em alguns pontos estratégicos, além da aplicação de reboco em trechos de paredes previamente erguidas ou regularizadas. A remoção dos entulhos gerados ao longo das frentes de serviço foi mantida, visando à limpeza e organização do canteiro. A equipe atuante permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10

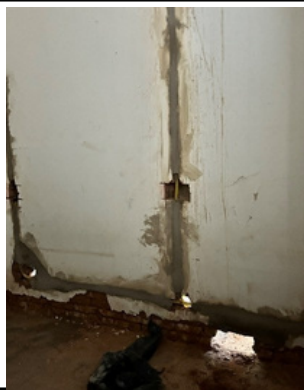


IMAGEM 11



IMAGEM 12



IMAGEM 13



IMAGEM 14

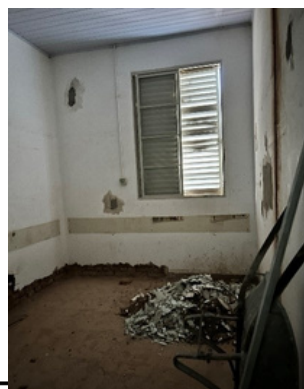


IMAGEM 15



IMAGEM 16

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 17

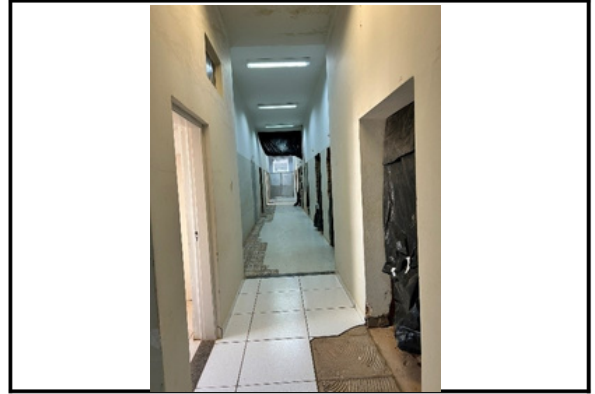


IMAGEM 18
