



Santa Casa Bariri

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TERMO DE CONVÊNIO**

**06/2024**

**REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS**

**ESTERILIZADOS**

**(R\$ 463.600,00)**

**JUNHO 2025**



# Santa Casa Bariri

**Ofício Financeiro 37/2025**

Bariri, 15 de julho de 2025

**Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024**

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 06/2025 do Convênio 06/2024.

Atenciosamente.

**MARINA PREARO**

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

**AIRTON LUIS PEGORARO**

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO




**ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI  
**ENTIDADE GERENCIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI    **CNPJ:** 44.690.238/0001-61  
**ENDEREÇO:** AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409    **CEP:** 17250182  
**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** MARINA PREARO  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME  
**EXERCÍCIO:** 06/2025

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
|                                                               |                        |                 |                                |                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                 |                                | R\$ 371.828,01     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                | R\$ 136,72         |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                        |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                     |                        |                 |                                | R\$ 371.964,73     |
|                                                               |                        |                 |                                |                    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                        |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                        |                 |                                | R\$ 371.964,73     |

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

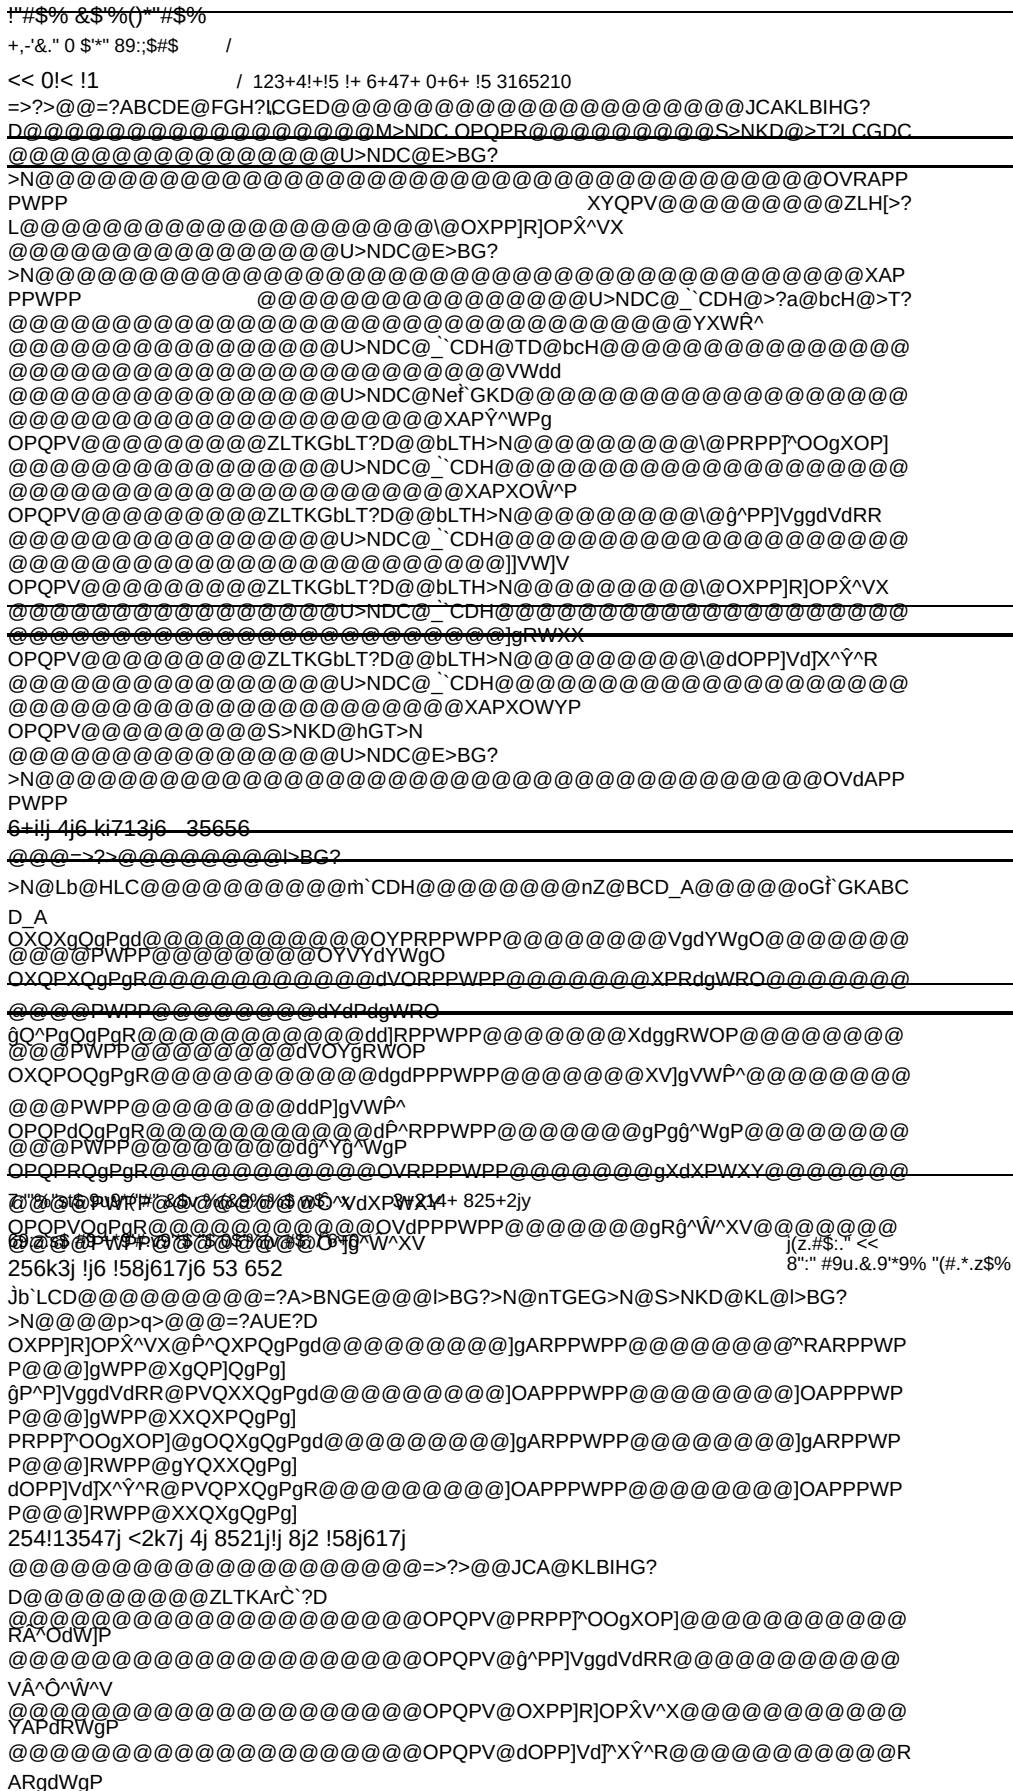



!"#\$%&\$

'()%\*#+

, -

!.%&+

- /0' !/' 123 !24 !5161 5!

7)8 +% . 9\$.\$9)%\*#+

;64<=

>> 13 !? '@&.AB&#\*.- !4?, C, C

D+&+

<#8&E9#\*.

F+".9F+".9 51?9\$GC !.AHC

F+".9 5=3

I@+.%&#J+J\$\*.&+8

F+".9\*.&+

/+"J.\*.&+8

/KD= '40215=1

C L

C, L

'?K5!'MN=

L

L, ,

L ,,

C L

'?K5!'MN=

L

L ,,

L ,

C L

/KD= '06'K

C L

C L

C L

1\$8@A. J. A)8

/KD= '40215=1

C L

'?K5!'MO2/ PQR

, L

12/ '02/ P-R

L

124D57240= >160= PQR

L

57?=/0= D2 124D' P-R

L

5=3 P-R

L

124D57240= KSI65D=

L

/KD= '06'K T

C L

F+".9 J+ !.&+

L ,

L ,

1\$%&+U#"#J+J\$

4. A)8

L

4. +%.

L

V"&#A.8 A\$8\$8

L,

09+%8+WX. \$:\$&@+J+ \*.A 8@\*\$88. H.9 ; , 7'154' ?12'1=C

/ \$9Y#W. J\$ '&\$%J#A\$%&. +. !.%8@A#J.9 - /!

=@Y#J.9#+ >>

?+9+ J\$:#\*#\$%&\$8 +@J#&#Y.8 ,

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORÇÃO PÚBLICO CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI  
ENTIDADE GERENCIADA MANDADA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI: 44.690.238/0001-61  
ENDEREÇO AV. ANTONIO DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182  
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARINA PREARO  
CONVÊNIO CONV. 06 / 2024-REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME  
EXERCÍCIO 06 / 2025

| ITEM | DOCUMENTO  |        | NATUREZA DESPESAS | DESCRIÇÃO DA DESPESA | RAZÃO SOCIAL DO CREDOR | CNPJ / CPF DO CREDOR | PAGAMENTO  |    |            |
|------|------------|--------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------|----|------------|
|      | DATA       | NÚMERO |                   |                      |                        |                      | DATA       | Nº | R\$        |
|      | 17/06/2025 |        | IMPOSTOS          | IMPOSTOS             |                        |                      | 17/06/2025 |    | R\$ 886,89 |

TOTAL: R\$886,89

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



!"#\$%\$ &"#\$\$(

)\*+,-./ 0  
12,3/ -245,35 0 67) 1)6) 89: 19; 1<8=8 <1  
>54?2@2 @2  
5 A 34/ 32

B""C'D !"#\$&E

|                             |                    |                              |             |                  |        |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|--------|
| F3G<br>H/I/, -535 J2K.J5,32 | F3G<br>) *G 24.*5J | L235 M.N3O4.-2               | F 2-PJ 5,32 | Q/I24 8R         | 6/I@2  |
|                             |                    | 6/I@2 ),354.24               |             |                  | STSSUV |
|                             |                    | WXYZ[\]^_`^                  | G           | aabca <b>def</b> |        |
|                             |                    | >89: g=; h)8<8< <>7=         |             |                  |        |
|                             |                    | ijiZkl_m`h` ZooZpqoZq[       |             | rsSSSTSSUV       |        |
|                             |                    | hh 1Fh F<                    |             |                  |        |
|                             |                    | tXuZoovwxy[pZpzxk{vwxyzwl}   | G           | ~~ c~~ef         |        |
|                             |                    | hh 8: 1P432 >4/ 2 )P32J 3.-2 |             |                  |        |
|                             |                    | XijZkl_m`h` ZooZpqoZq[       | G G G G     | TS UV            |        |
|                             |                    | tXuZoovwxy[pZpzxk{vwxyzwl}   | G           | ac efSTSSUV      |        |
|                             |                    | hh 8: 1P432 >4/ 2 )P32J 3.-2 |             |                  |        |
|                             |                    | 6 ) L F                      |             |                  | STSSUV |

74/,N/ 2 5 53P/@/ -2J NP-5NN2 24 i g)8<;) >89)8 G

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.00

0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.656-1

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 81750000008-5 86890447202-4

50617020220-0 00424282005-0

Data do pagamento 17/06/2025

Valor Total 886,89

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB:

F.D46.A1B.90D.FE8.9D1

=====

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu  
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos  
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

**Prefeitura Municipal de Bariri****Pref. Mun. de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

**GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025**

|                             |                                                   |             |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Cadastro                    | Módulo                                            |             |  |  |  |
| 000005382                   | Mobiliário                                        |             |  |  |  |
| CNPJ                        | Nome/Razão Social                                 |             |  |  |  |
| 44.690.238/0001-61          | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI |             |  |  |  |
| Logradouro                  | Número                                            | Complemento |  |  |  |
| AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO | 409                                               |             |  |  |  |
| CEP                         | Bairro                                            | Cidade      |  |  |  |
| 17250-071                   | JARDIM PARAISO                                    | BARIRI-SP   |  |  |  |

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 454  
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

|                 |            |                |            |                    |                   |
|-----------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|
| Base de Cálculo | Qtd. Notas | Vencimento     | Referência | Tipo da Declaração | Valor Creditado   |
| R\$ 22.172,18   | 1          | 17/06/2025     | 5/2025     | Declaração Tomador | 0,00              |
| Código de Baixa | Cadastro   | Módulo         |            |                    | Receita Principal |
| 2-424282-2-5    | 000005382  | 2 - Mobiliário |            |                    | 13 - ISS TOMADOR  |
| Valor Original  | Coreção    | Multa          | Juros      | Valor Documento    |                   |
| R\$ 886,89      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00   | R\$ 886,89         |                   |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 10/06/2025 08:40:02 por: IRMANDADE DA SANTA C

|                                                                                                                                  |                                       |           |                |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|
|                                                                                                                                  | <b>Prefeitura Municipal de Bariri</b> |           |                |                    |                        |
|                                                                                                                                  | <b>Pref. Mun. de Bariri</b>           |           |                |                    |                        |
|                                                                                                                                  | 46.181.376/0001-40                    |           |                |                    |                        |
|                                                                                                                                  |                                       |           |                |                    | <b>Exercício: 2025</b> |
| Contribuinte                                                                                                                     |                                       |           |                | CNPJ               |                        |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI                                                                                |                                       |           |                | 44.690.238/0001-61 |                        |
| Logradouro                                                                                                                       |                                       | Número    |                | Complemento        |                        |
| AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO                                                                                                      |                                       | 409       |                |                    |                        |
| CEP                                                                                                                              | Bairro                                |           | Cidade         |                    |                        |
| 17250-071                                                                                                                        | JARDIM PARAISO                        |           | BARIRI-SP      |                    |                        |
| Vencimento                                                                                                                       | Código de Baixa                       | Cadastro  | Módulo         | Receita Principal  |                        |
| 17/06/2025                                                                                                                       | 2-424282-2-5                          | 000005382 | 2 - Mobiliário | 13 - ISS TOMADOR   |                        |
| Valor Original                                                                                                                   | Coreção                               | Multa     | Juros          | Total Recebido     |                        |
| R\$ 886,89                                                                                                                       | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00  | R\$ 0,00       | R\$ 886,89         |                        |
| Após o vencimento cobrar multa e juros:<br>Multa: 1 a 30 dias 2%, 31 a 60 dias 5%<br>E ACIMA DE 60 DIAS 20%<br>JUROS: 1% AO MÊS. |                                       |           |                |                    |                        |
| Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 454<br>Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP       |                                       |           |                |                    |                        |

Autenticação Mecânica

81750000008-5 86890447202-4 50617020220-0 00424282005-0



NOTAS FISCAIS

| Razão Social/Nome          | CNPJ/CPF           | Número | Base Calculo Alíquota |        | Valor ISS  |
|----------------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|------------|
| ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP | 33.898.240/0001-04 | 454    | R\$ 22.172,18         | 4,00 % | R\$ 886,89 |
| Total de notas: 1          |                    |        |                       |        | R\$ 886,89 |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ARQ PRIME</b><br><small>ENGENHARIA E ARQUITETURA</small> | <b>ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME</b><br>RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234<br>CENTRO<br>BARIRI-SP<br>CNPJ: 43.168.365/0001-32<br>(14) 98192.1272<br><a href="mailto:luisafonso.arq@gmail.com">luisafonso.arq@gmail.com</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade p |                                   |
| DATA:                                                                                                     | segunda-feira, 2 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:                                                                               | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:                                                                                     | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA:                                                                               | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:                                                                                      | Não                               |
| EPI's EM USO:                                                                                             | Sim                               |

| ATIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Os trabalhos foram retomados no início da semana com a continuidade na execução dos dois ligações entre a edificação da Maternidade – Parte II e os demais setores do hospital, com ênfase na alvenaria em um dos trechos. Em paralelo, prosseguiu-se com a aplicação de massa corrida nos ambientes internos da Maternidade – Parte II. Demais frentes de trabalho também seguiram em andamento intervenções em outros pontos da obra. A equipe permanece composta por oito profissionais.</p> |

| PROBLEMAS / IMPREVISTOS |
|-------------------------|
|                         |

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL**  
Construtora Ac



parte II

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



corredores de  
na elevação da  
mbientes  
o, com

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**EL LEGAL**  
casi LTDA

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**IMAGEM 01**



**IMAGEM 02**



**IMAGEM 03**



**IMAGEM 04**



**IMAGEM 05**



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| DATA:                       | terça-feira, 3 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso    |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                             |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                            |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                             |
| EPI's EM USO:               | Sim                             |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram com a continuidade da execução dos dois corredores de ligação entre a edificação da Maternidade – Parte II e os demais setores do hospital. Em paralelo, foi mantida a aplicação de massa corrida nos ambientes internos da Maternidade – Parte II. Também foi iniciada a demolição da alvenaria que anteriormente separava o antigo expurgo, viabilizando adequações no layout. Outras frentes de trabalho seguiram em andamento nas demais áreas da edificação. A equipe permanece composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

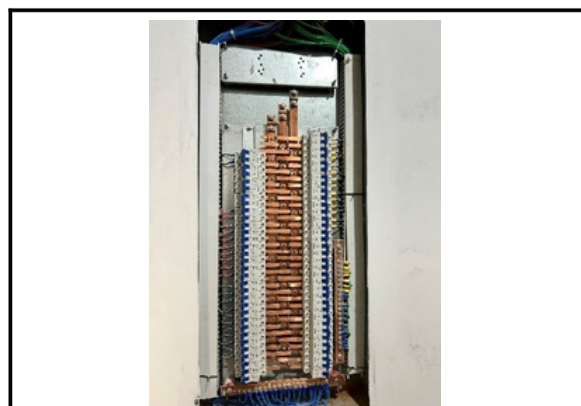


IMAGEM 04

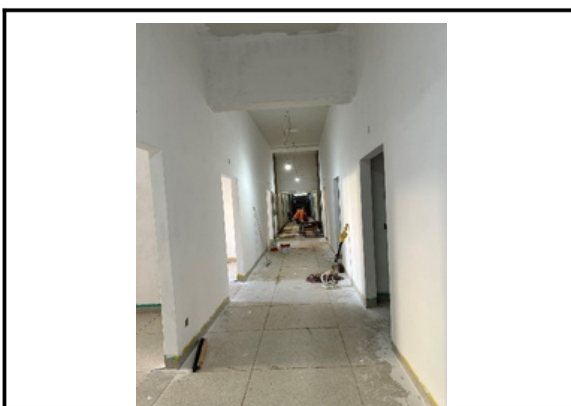


IMAGEM 05

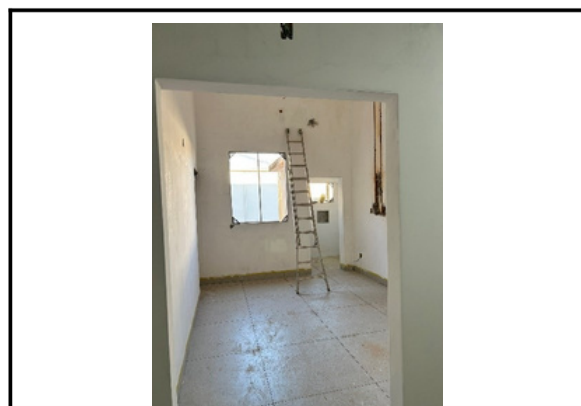


IMAGEM 06

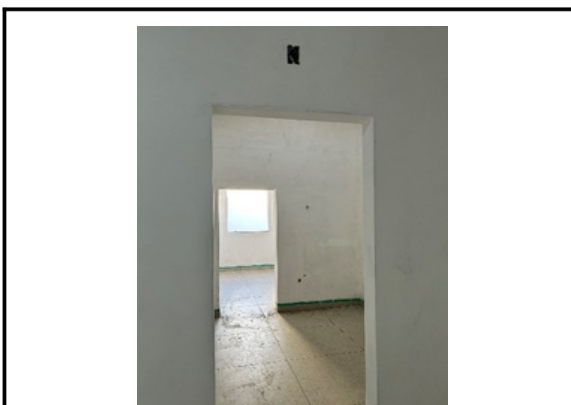


IMAGEM 07

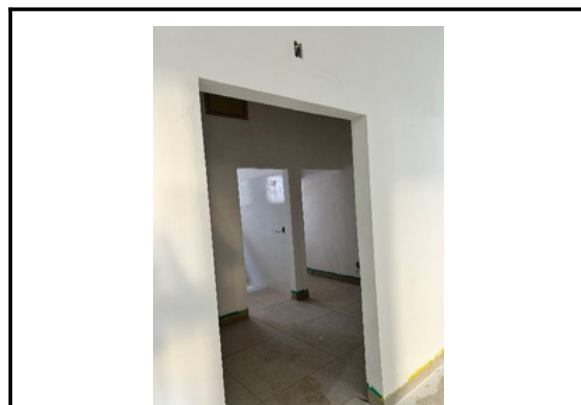


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | quarta-feira, 4 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços seguiram com foco na continuidade da execução dos dois corredores de interligação entre a edificação da Maternidade – Parte II e os demais pavimentos do hospital. Em frentes paralelas, foi dada continuidade à aplicação de massa corrida nas dependências da Maternidade – Parte II e à demolição progressiva da parede e laje que anteriormente compunham o antigo expurgo, como parte do processo de readequação do layout. Outras frentes de trabalho mantiveram-se ativas em setores distintos do complexo hospitalar. A equipe permanece composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

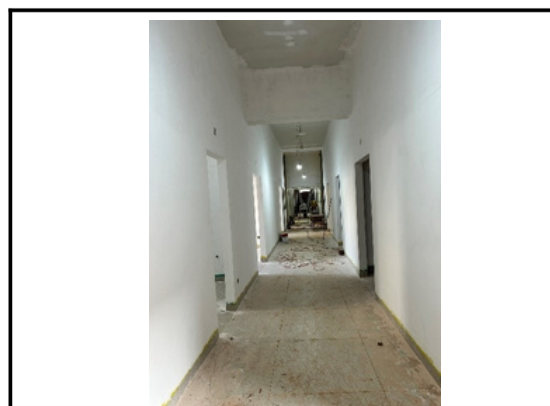


IMAGEM 04

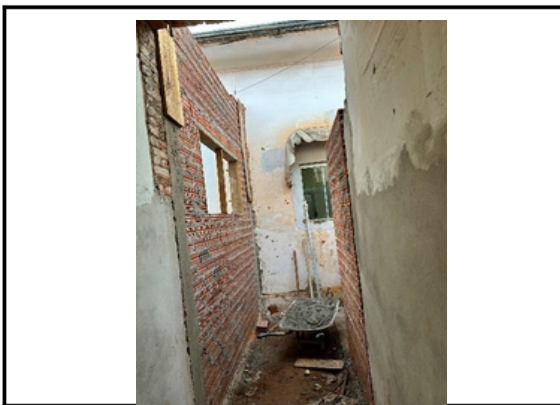


IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | quinta-feira, 5 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos foram retomados com continuidade nas atividades previstas, com destaque para a execução dos dois corredores de conexão entre a edificação da Maternidade – Parte II e os demais setores do hospital, avançando na elevação das alvenarias. Simultaneamente, a equipe deu prosseguimento à aplicação de massa corrida nas paredes internas da Maternidade – Parte II, com significativo progresso. Outras frentes de serviço também seguiram em andamento em diferentes áreas da obra, conforme o planejamento geral. A equipe permanece composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| DATA:                       | sexta-feira, 6 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso    |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                             |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                            |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                             |
| EPI's EM USO:               | Sim                             |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de trabalho seguiram em andamento, com foco principal na continuidade da execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II aos demais blocos do hospital, destacando-se os avanços nas alvenarias. Em paralelo, prosseguiu-se com a aplicação de massa corrida nas superfícies internas da Maternidade – Parte II, mantendo ritmo contínuo de acabamento. Outras atividades complementares também foram desenvolvidas em diferentes setores do canteiro. A equipe permanece composta por oito operários.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

Durante o desenvolvimento da obra, foram identificadas necessidades específicas e exigências decorrentes do atendimento às normas técnicas vigentes, especialmente aquelas relacionadas às áreas hospitalares sensíveis. Em razão disso, foi necessária uma alteração significativa na concepção original da edificação, impactando parte da Maternidade – Parte II e parte do Centro Cirúrgico. As modificações visaram garantir a conformidade com os requisitos legais e funcionais, assegurando a viabilidade técnica e operacional, bem como a segurança e o adequado fluxo de pacientes e profissionais de saúde.

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

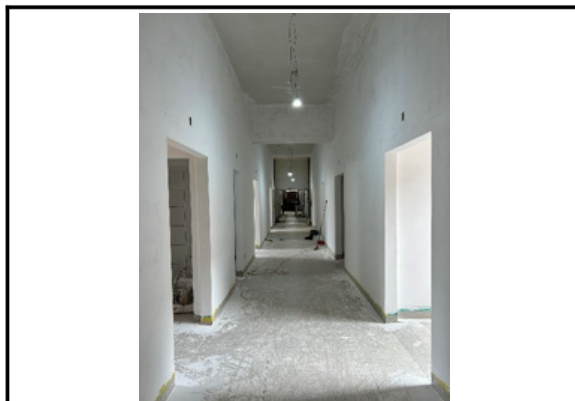


IMAGEM 01



IMAGEM 02

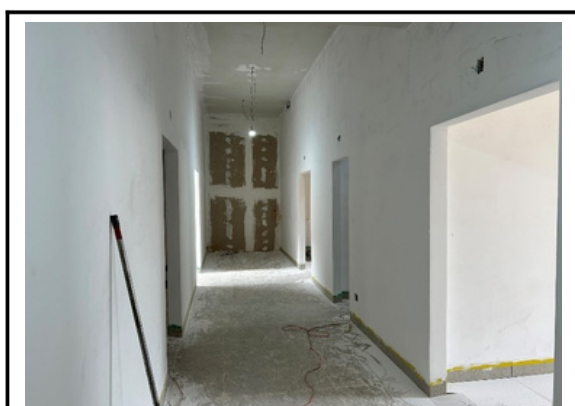


IMAGEM 03

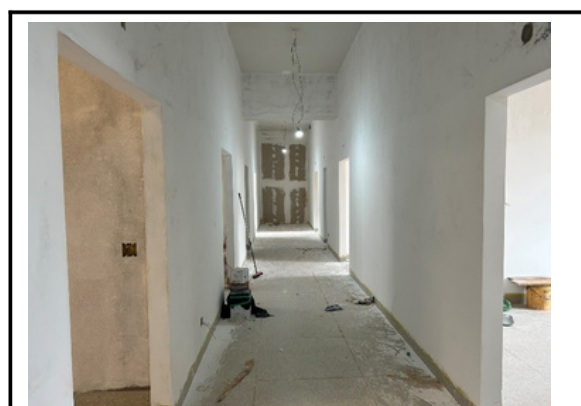


IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

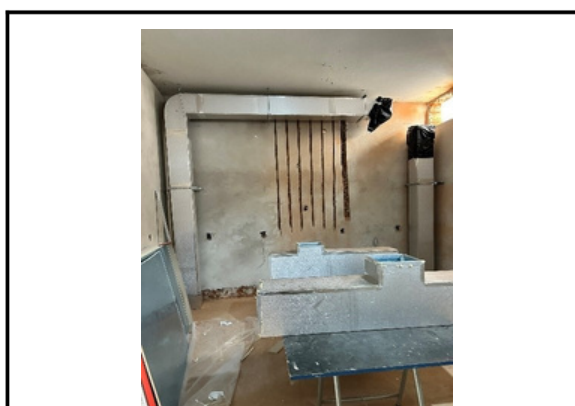


IMAGEM 07

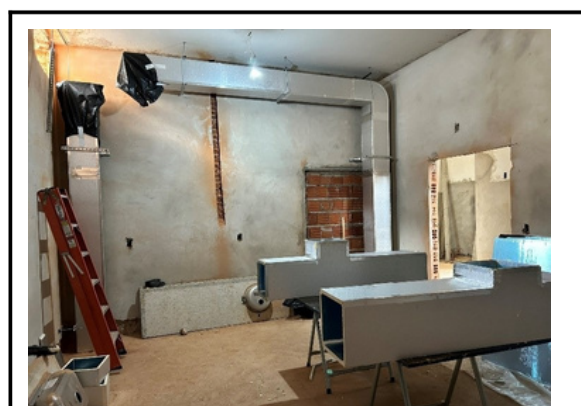


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

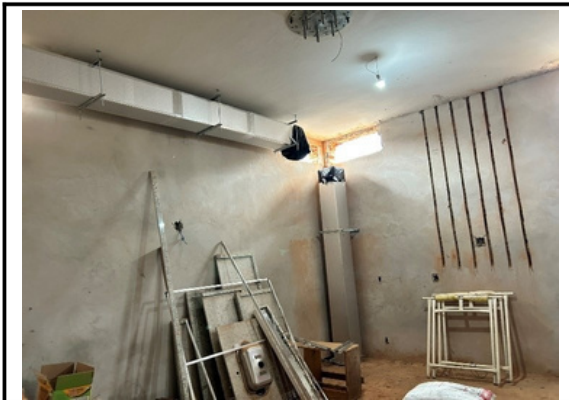


IMAGEM 09



IMAGEM 10

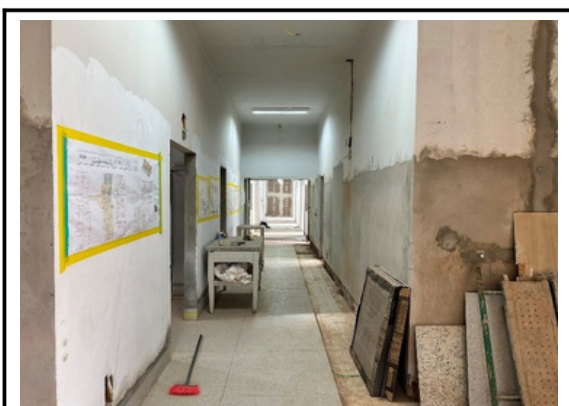


IMAGEM 11



IMAGEM 12

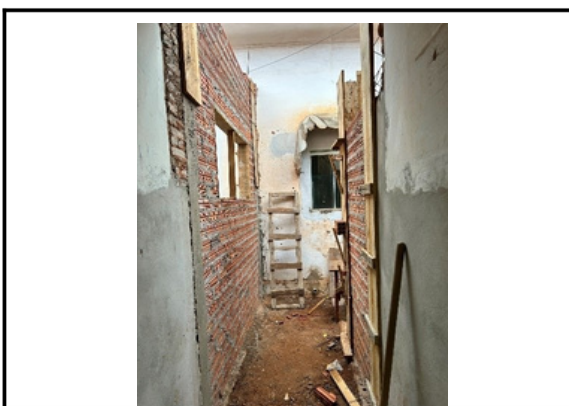


IMAGEM 13



IMAGEM 14

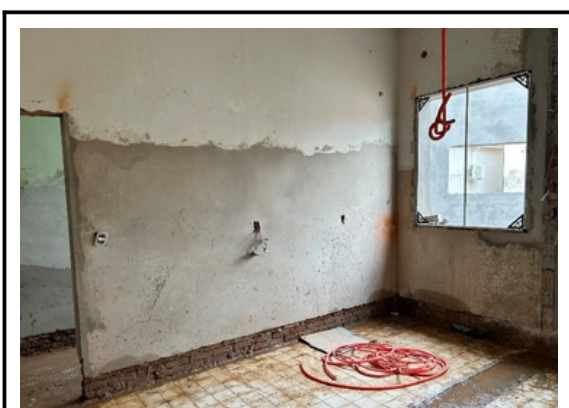


IMAGEM 15

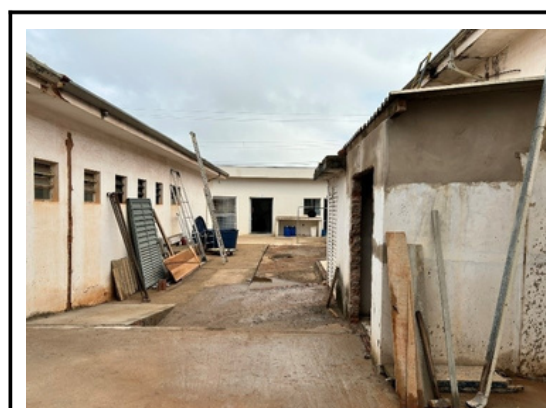


IMAGEM 16



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | segunda-feira, 9 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Osserviços tiveram continuidade comênfase na execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II aos demais setores do hospital, mantendo o avanço nas etapas de alvenaria. Simultaneamente, as equipes deram prosseguimento à aplicação de massa corrida nas dependências internas da Maternidade – Parte II. Também foi iniciada a preparação do alicerce para a futura elevação da ampliação do bloco cirúrgico, bem como da Maternidade – Parte II. Outras atividades complementares seguiram em desenvolvimento em diferentes áreas da obra. A equipe segue composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

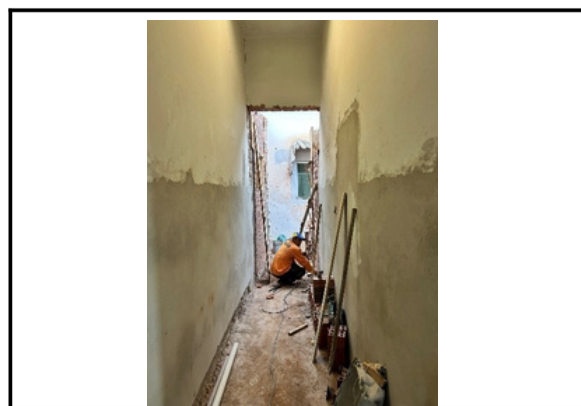


IMAGEM 04

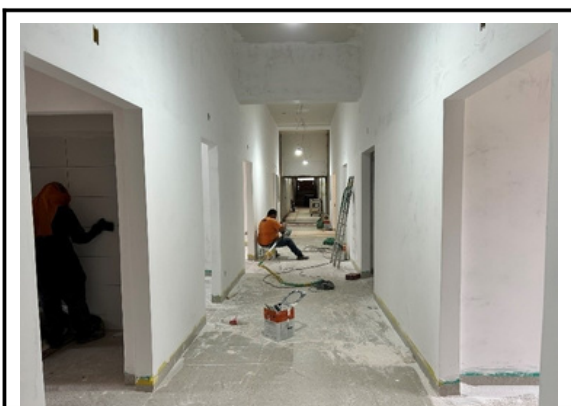


IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07

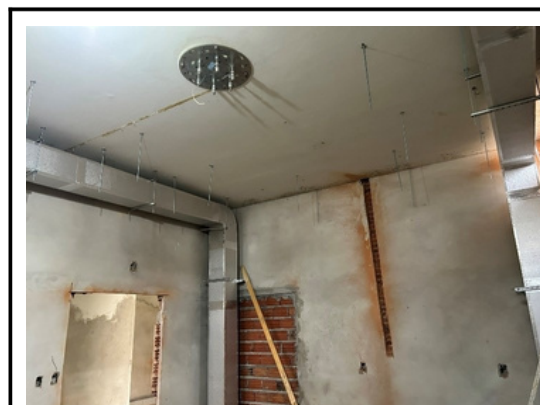


IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09

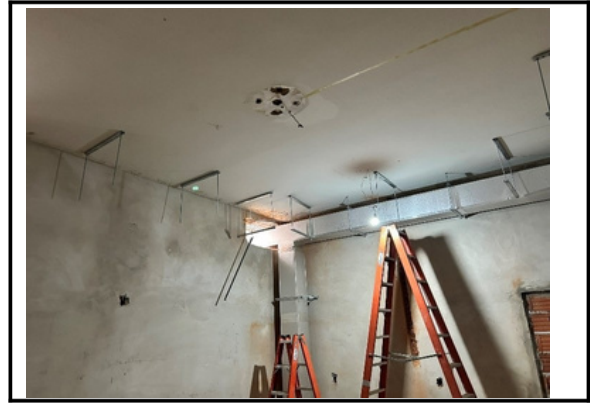


IMAGEM 10



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | terça-feira, 10 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de trabalho prosseguiram com foco na execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II a outros setores do complexo hospitalar, com avanços nas etapas de alvenaria. Em paralelo, foi mantida a aplicação de massa corrida nas áreas internas da Maternidade – Parte II. Também houve continuidade na execução da base para fundação, visando à ampliação do Centro Cirúrgico e de parte da Maternidade – Parte II. As demais frentes de serviço seguiram em andamento conforme o cronograma estabelecido. A equipe técnica permanece composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

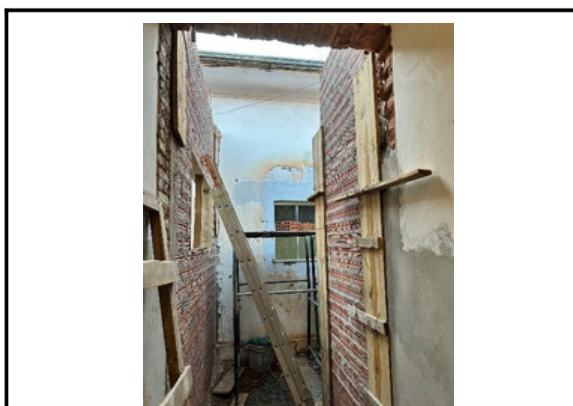


IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quarta-feira, 11 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços em campo tiveram continuidade com destaque para a execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II a demais pavimentos do hospital, com avanços estruturais nas etapas de alvenaria. Em paralelo, as equipes mantiveram a aplicação de massa corrida nos ambientes internos da Maternidade – Parte II. Também prosseguiram as atividades de preparação do alicerce, com início do processo de lastreamento com terra para posterior execução de ampliação prevista para o Centro Cirúrgico e extensão da Maternidade – Parte II. Outras frentes de trabalho complementares seguiram conforme planejamento. A equipe é composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quinta-feira, 12 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de trabalho mantiveram o ritmo previsto, com continuidade nas intervenções dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II a outros setores do hospital, com foco na consolidação das etapas de alvenaria. Em paralelo, avançaram os serviços de aplicação de massa corrida nas áreas internas da Maternidade – Parte II. Também prosseguiu a preparação do alicerce da ampliação do Centro Cirúrgico e da própria Maternidade – Parte II, com execução do reaterro e compactação do solo como parte da etapa preliminar à fundação. Demais atividades complementares seguiram em andamento nas demais edificações. A equipe operacional do dia foi composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

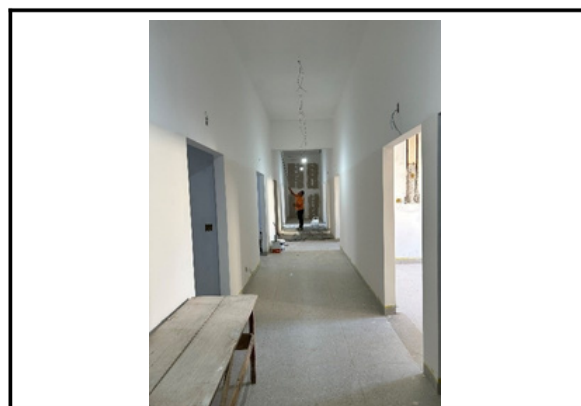


IMAGEM 04

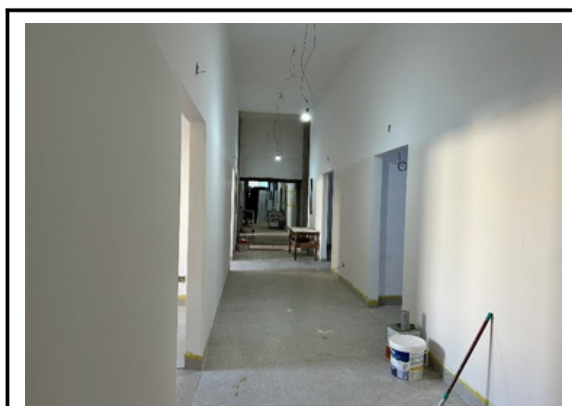


IMAGEM 05



IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | sexta-feira, 13 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as equipes deram prosseguimento às frentes de serviço, encerrando a semana com foco na continuidade da execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II aos demais setores do complexo hospitalar. Simultaneamente, foram iniciados os trabalhos de pintura das alvenarias internas nas edificações da Maternidade – Parte I e Parte II. Também houve avanço nas etapas de preparo do contrapiso, incluindo a execução da concretagem em áreas do Centro Cirúrgico e setores anexos à Maternidade – Parte II. Outras atividades complementares seguiram em andamento nas demais frentes da obra. A equipe presente foi composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

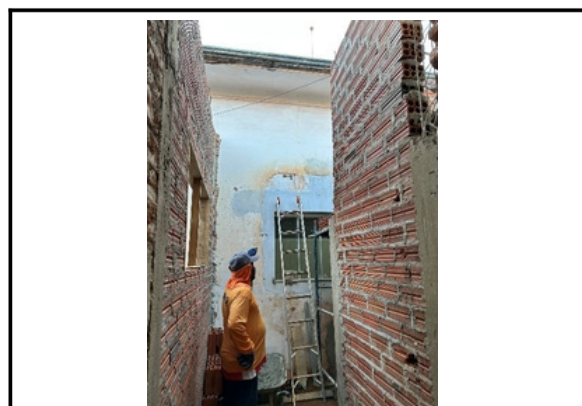


IMAGEM 04



IMAGEM 05

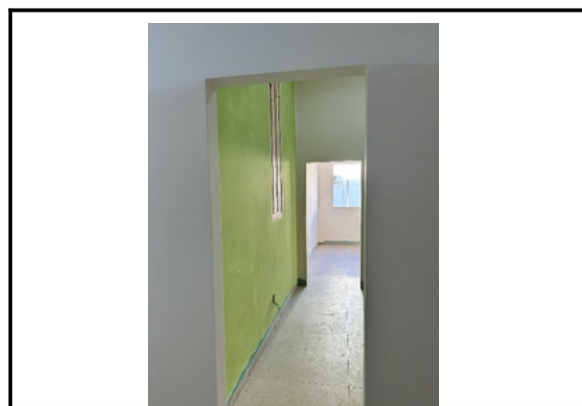


IMAGEM 06

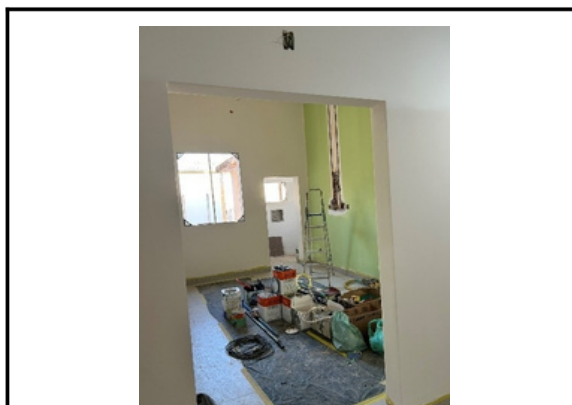


IMAGEM 07

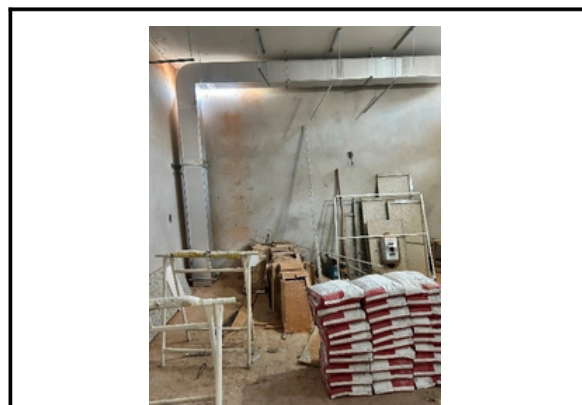


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| DATA:                       | segunda-feira, 16 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso       |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                                |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                               |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                                |
| EPI's EM USO:               | Sim                                |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades foram retomadas como início da semana de trabalho. Os serviços mantiveram foco na continuidade da execução dos dois corredores que interligam a edificação da Maternidade – Parte II aos demais blocos do hospital, com avanços na elevação de alvenarias e ajustes estruturais. Paralelamente, prosseguiram os trabalhos de pintura interna nas edificações da Maternidade – Parte I e Parte II, com aplicação de demãos de acabamento nas superfícies previamente tratadas. Outras frentes também seguiram em andamento conforme cronograma. A equipe em campo é composta por oito operários.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

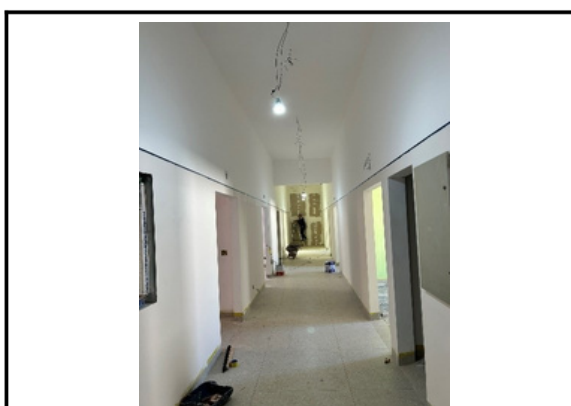


IMAGEM 03

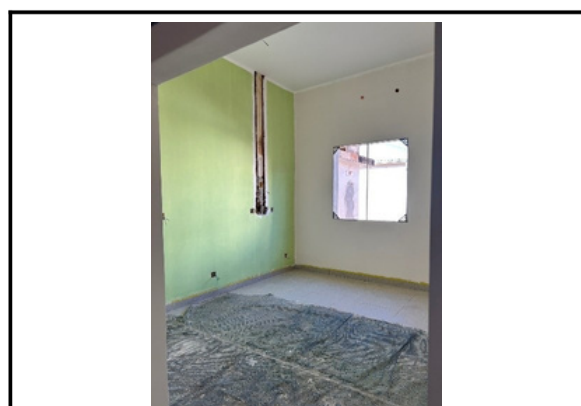


IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | terça-feira, 17 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nadata de hoje, os serviços em campo prosseguiram com ênfase na continuidade da elevação das alvenarias, compreendendo as divisórias internas das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Simultaneamente, avançaram os trabalhos nos dois corredores de interligação entre a Maternidade – Parte II e os demais pavimentos do complexo hospitalar. Também foi dada sequência às atividades de pintura nas alvenarias internas das edificações da Maternidade – Parte I e II, além da execução de outras frentes de trabalho em diferentes setores do empreendimento. A equipe de trabalho permanece composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

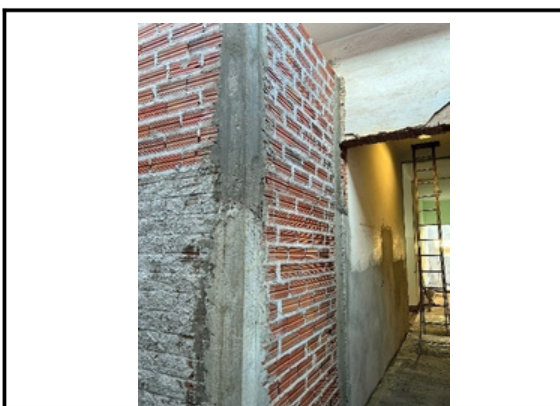


IMAGEM 05

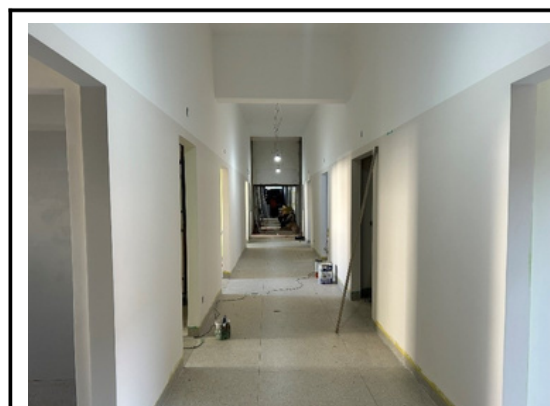


IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quarta-feira, 18 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos em obra seguiram com foco na continuidade da execução das alvenarias verticais, abrangendo os compartimentos da edificação do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Em paralelo, houve avanço na construção dos dois corredores de interligação que conectam a Maternidade – Parte II aos demais setores do hospital. Prosseguiram também os serviços de pintura interna nas paredes das edificações correspondentes à Maternidade – Parte I e II. Outras atividades complementares seguiram em andamento em diversos pontos do canteiro. A equipe presente no local foi composta por oito operários.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

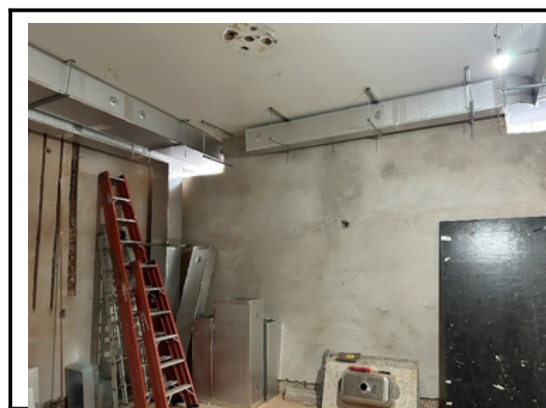


IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quinta-feira, 19 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | ****                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | ****                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | ****                              |
| EPI's EM USO:               | ****                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, não houve expediente por conta do feriado.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | sexta-feira, 20 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Encerrando a semana, os serviços prosseguiram com ênfase na continuidade da elevação das alvenarias nas áreas destinadas ao Centro Cirúrgico e à Maternidade – Parte II. Simultaneamente, foram executados avanços nos dois corredores que interligam a Maternidade – Parte II aos demais setores do hospital. Também houve progresso nas etapas de pintura das paredes internas nas edificações da Maternidade – Parte I e II. As demais frentes de trabalho seguiram com atividades complementares em distintos setores da obra. A equipe operacional manteve-se composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**

Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

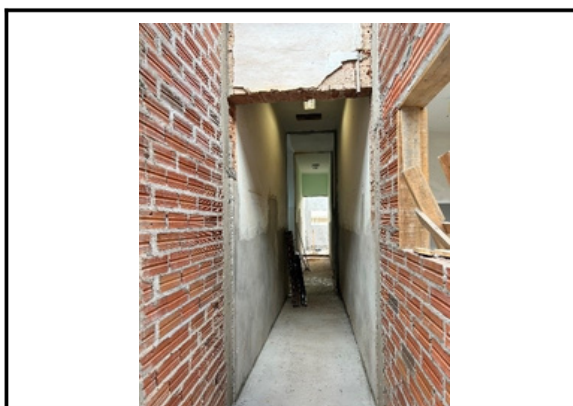


IMAGEM 05

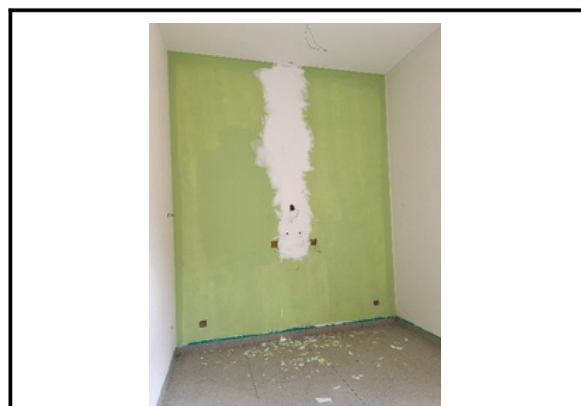


IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| DATA:                       | segunda-feira, 23 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso       |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                                |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                               |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                                |
| EPI's EM USO:               | Sim                                |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta segunda-feira, os trabalhos foram retomados com foco na continuidade da elevação das alvenarias nas áreas do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Os serviços também avançaram na execução estrutural dos dois corredores de ligação entre a Maternidade – Parte II e os demais blocos do hospital. Em paralelo, a equipe seguiu com as atividades de pintura nas paredes internas das edificações da Maternidade – Parte I e II. Outras frentes de trabalho deram andamento a serviços complementares em diversos pontos da obra. A equipe em campo manteve-se composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

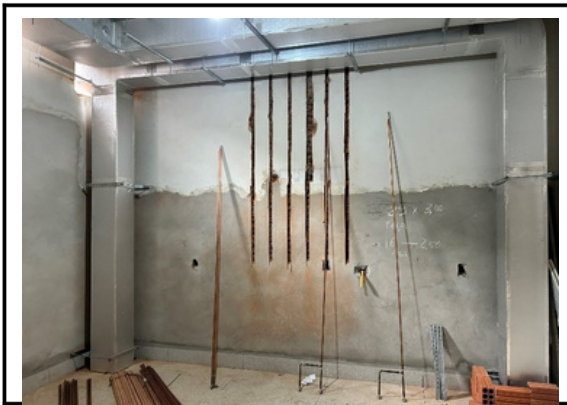


IMAGEM 05



IMAGEM 06

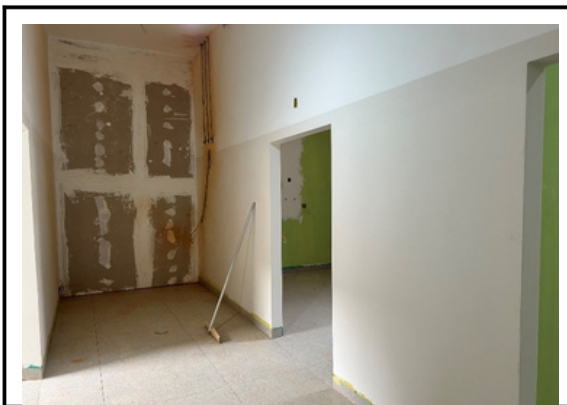


IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | terça-feira, 24 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços seguiram em ritmo contínuo nesta data, com destaque para a continuidade da elevação das alvenarias nas áreas pertencentes ao Centro Cirúrgico e à Maternidade – Parte II. Avançaram também as intervenções nos dois corredores de interligação entre a Maternidade – Parte II e os demais setores do hospital. Em paralelo, as frentes de acabamento mantiveram os trabalhos de pintura nas paredes internas da Maternidade – Parte I e II, sendo que a edificação da Parte I encontra-se em fase final de execução dessa etapa. Outras atividades de apoio foram desenvolvidas em diferentes pontos da obra. A equipe técnica permaneceu composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

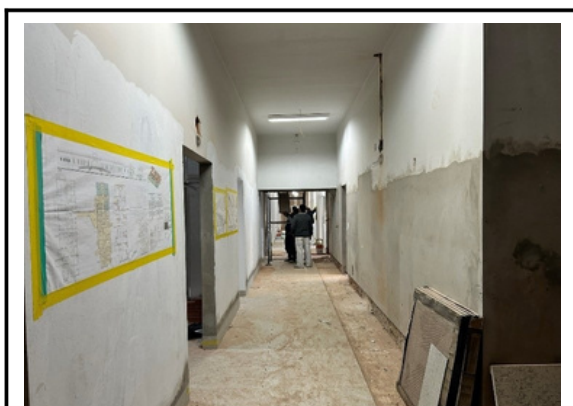


IMAGEM 05

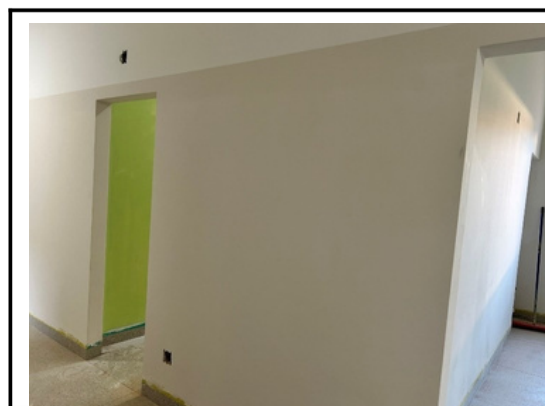


IMAGEM 06

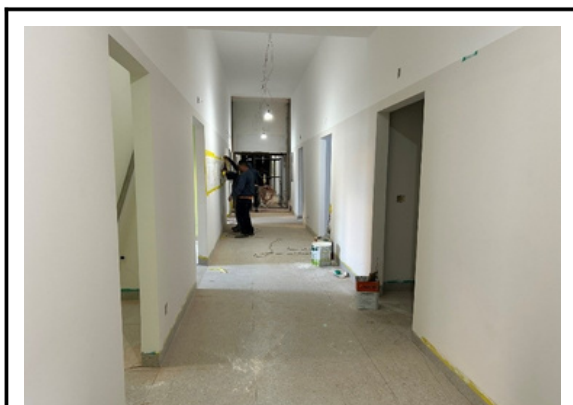


IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quarta-feira, 25 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos tiveram prosseguimento com foco na continuidade da execução das alvenarias das paredes correspondentes às ampliações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Os serviços nos corredores de interligação entre a Maternidade – Parte II e os demais setores do complexo hospitalar também avançaram de forma significativa. Simultaneamente, a equipe de acabamento prosseguiu com os serviços de pintura interna nas edificações da Maternidade – Parte I e II, sendo que a Parte I encontra-se em fase final de pintura. Demais frentes de serviço seguiram com atividades complementares em outros setores. A equipe de trabalho manteve-se composta por oito operários.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| DATA:                       | quinta-feira, 26 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso      |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                               |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                              |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                               |
| EPI's EM USO:               | Sim                               |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nadata de hoje, as atividades em obra seguiram com destaque para a continuidade da elevação das alvenarias nas áreas do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II. Os serviços nos dois corredores de conexão entre a Maternidade – Parte II e os demais setores do hospital também avançaram. De forma paralela, as equipes de acabamento deram sequência aos trabalhos de pintura interna nas dependências da Maternidade – Parte I e II, sendo que na Parte I os serviços encontram-se em estágio final de execução. Outras frentes também mantiveram intervenções em diferentes pontos da edificação. O efetivo presente foi composto por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**

Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

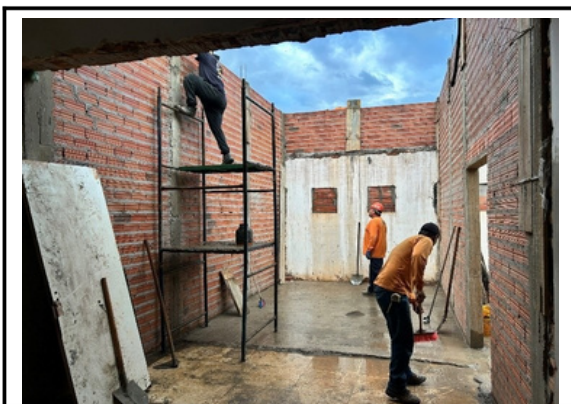


IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| DATA:                       | sexta-feira, 27 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso     |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                              |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                             |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                              |
| EPI's EM USO:               | Sim                              |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as frentes de trabalho atuaram na finalização da semana com as etapas de alvenaria referentes às paredes do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, mantendo o ritmo de execução nas áreas mencionadas. Em paralelo, os serviços de pintura interna prosseguiram nas edificações da Maternidade – Parte I e II, sendo que os ambientes da Parte I se encontram em fase de conclusão. Houve também avanço em outras frentes dentro do canteiro, conforme o planejamento vigente. A equipe presente foi composta por oito colaboradores.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

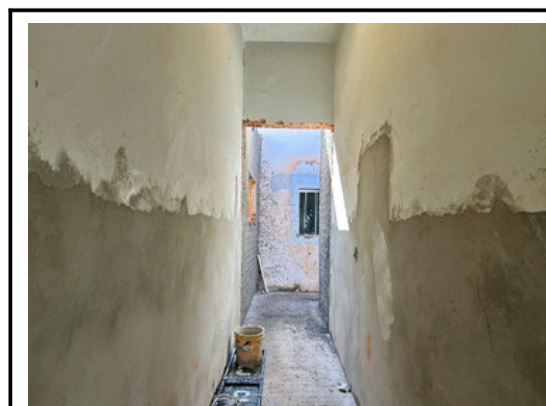


IMAGEM 06



IMAGEM 07

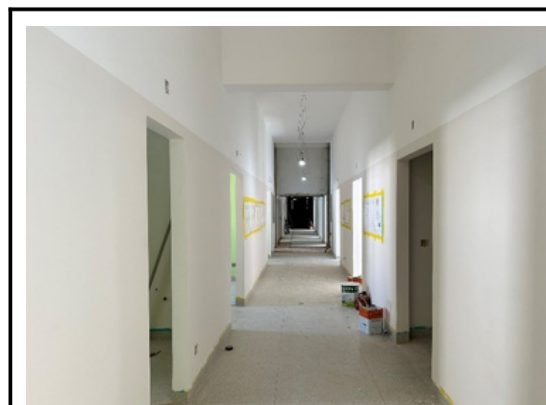


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME  
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234  
CENTRO  
BARIRI-SP  
CNPJ: 43.168.365/0001-32  
(14) 98192.1272  
[luisafonso.arq@gmail.com](mailto:luisafonso.arq@gmail.com)

#### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| DATA:                       | segunda-feira, 30 de junho de 2025 |
| RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: | Luis Afonso Albanese Matiuso       |
| CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       | Sol                                |
| Nº DE TRABALHADORES NO DIA: | Oito                               |
| VISITANTES NO LOCAL:        | Não                                |
| EPI's EM USO:               | Sim                                |

#### ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos foram retomados no início da semana, concentrando esforços nas atividades relativas as alvenarias das edificações do Centro Cirúrgico e da Maternidade – Parte II, com destaque para a etapa de reboco das paredes. Simultaneamente, as equipes seguiram com os serviços de pintura nas dependências da Maternidade – Parte I e II, avançando significativamente na finalização da Parte I. Outras frentes de trabalho também foram mantidas em andamento, conforme o cronograma previsto. A equipe esteve composta por oito profissionais.

#### PROBLEMAS / IMPREVISTOS

**LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO**  
Arquiteto e Urbanista

**RESPONSÁVEL LEGAL**  
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

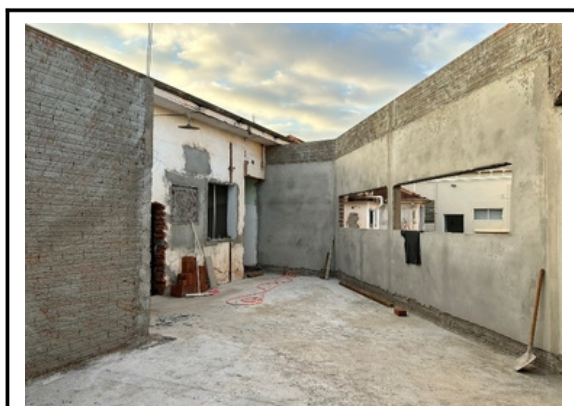


IMAGEM 05

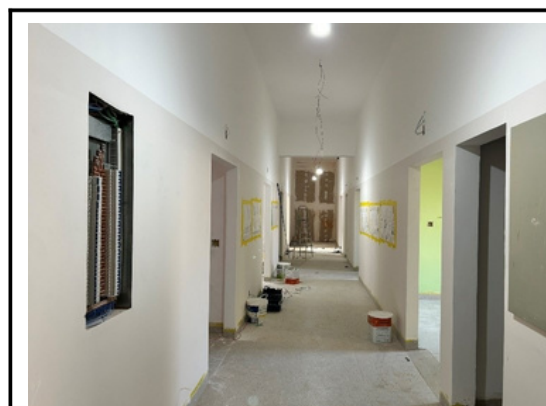


IMAGEM 06
