



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

03/2025

REFORMA PS I

Julho 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Adm 55/2025

Bariri, 29 de julho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2025 – Mês de Referência: JULHO.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª os demonstrativos financeiros do mês de julho do Termo de Convênio 03/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

Marina

PI

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 07/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/07/2025	R\$ 33.411,71	03/07/2025		R\$ 33.411,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.776,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.411,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 10,08
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
				R\$ 43.198,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 43.198,08


ELIANA A. MANIN GUERRA


MARINA PREARO



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

27661-8

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ

44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 9.776,29
Aplicações no mês:	R\$ 33.411,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.405,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,41
Rendimentos no mês:	R\$ 14,49 10,01 /
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 4.792,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 9.766,70	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	Aplicação	R\$ 33.411,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.411,71
07/07/2025	Resgate	R\$ 9.766,70	R\$ 12,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.778,99
07/07/2025	Resgate	R\$ 18.336,57	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 18.336,86
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.287,58	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 1.287,77
15/07/2025	Resgate	R\$ 8.291,77	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 8.293,23
16/07/2025	Resgate	R\$ 708,11	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 708,27
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 4.787,68	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/08/2025 às 14:30

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011038795356019
01/08/2025 10:46:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA REFORMA PS 1
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 03/07 08:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	33.411,71 C ✓	
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	33.411,71 (D)	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 09:30 VGB CONSTRUTORA LTDA	70.701	28.115,85 D ✓	
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.115,85 (C)	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	71.401	1.287,77 D ✓	
14/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.287,77 (C)	0,00 C
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 07:55 VGB CONSTRUTORA LTDA	71.501	8.293,23 D ✓	
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.293,23 (C)	0,00 C
16/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	708,27 D ✓	
16/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	708,27 (C)	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 07/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	04/07/2025	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	VGB CONSTRUTORA LTDA	52196207000187	07/07/2025	R\$ 28.115,85
2	14/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ISS		14/07/2025	R\$ 1.287,77
3	14/07/2025	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	VGB CONSTRUTORA LTDA	52196207000187	15/07/2025	R\$ 8.293,23
4	16/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	IMPOSTOS		16/07/2025	R\$ 708,27

TOTAL: R\$38.405,12

Manin

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina

MARINA PREARO



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 2 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

O início da semana foi marcado pela continuidade dos serviços na obra de reforma do Pronto Socorro. A equipe seguiu com as atividades de fechamento de alvenarias em pontos definidos pelo projeto, além da execução do reboco em paredes que já se encontram com estrutura concluída. A retirada dos entulhos acumulados ao longo das frentes de serviço também foi mantida, contribuindo para a organização e segurança do canteiro. Os trabalhos estão sendo executados por uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

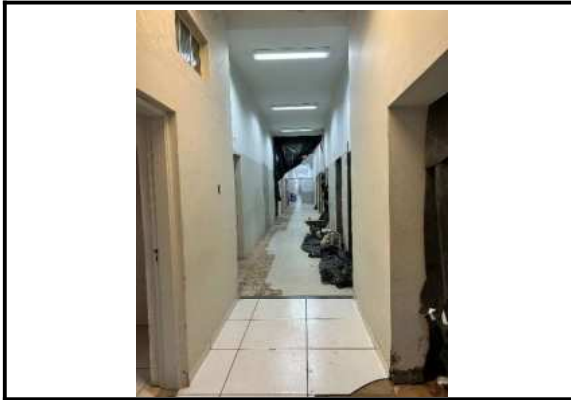


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 3 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe deu sequência aos serviços da reforma do Pronto Socorro, dando continuidade nas atividades de alvenaria. Seguem em andamento os fechamentos de paredes conforme o novo layout previsto, além da aplicação de reboco em trechos previamente preparados. A retirada dos entulhos gerados permanece sendo realizada de forma contínua, colaborando para a manutenção das condições adequadas de trabalho no canteiro. Os serviços estão sendo executados por uma equipe composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

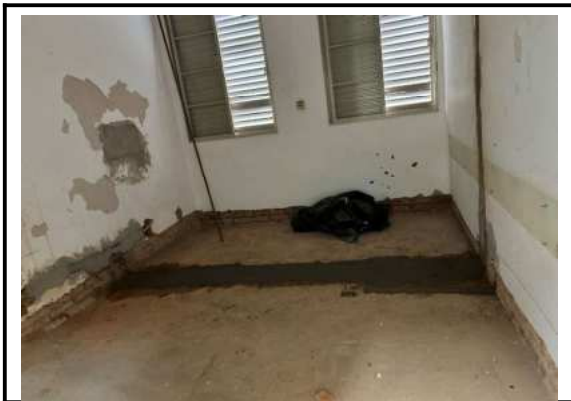


IMAGEM 03



IMAGEM 04

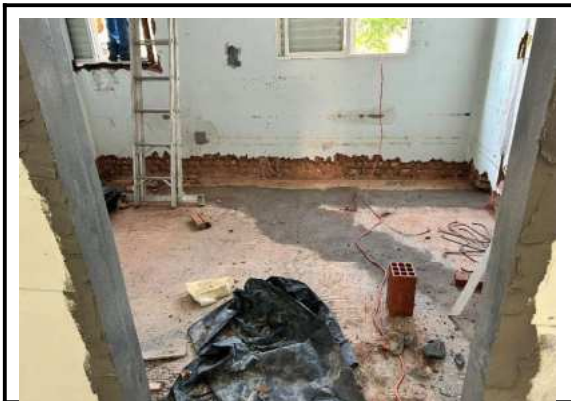


IMAGEM 05

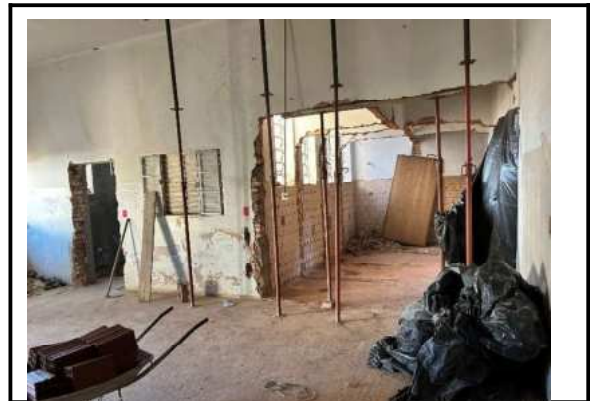


IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 4 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As frentes de serviço da obra de reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento nesta data. A equipe permanece executando o fechamento de paredes em áreas previamente definidas, assim como a aplicação de reboco em trechos já prontos para acabamento. A remoção dos entulhos continua sendo realizada paralelamente às demais atividades, garantindo a limpeza e a organização do canteiro de obras. Os trabalhos seguem com a atuação de 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

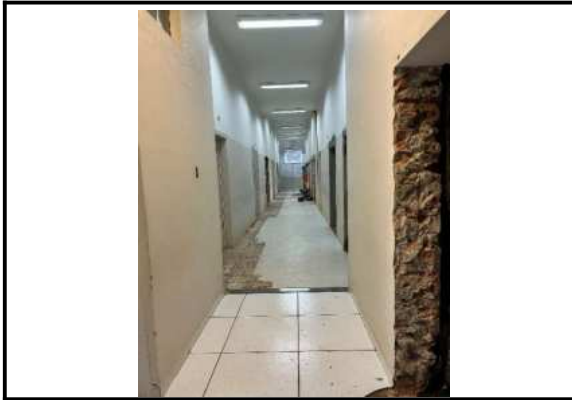


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10



IMAGEM 11



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 5 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as atividades da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com prosseguimento nas execuções de fechamento de alvenarias conforme a reorganização dos ambientes. Simultaneamente, avançaram os serviços de reboco em paredes já levantadas e regularizadas. A remoção dos entulhos acumulados segue ocorrendo de forma constante, garantindo melhores condições operacionais no canteiro. A equipe permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

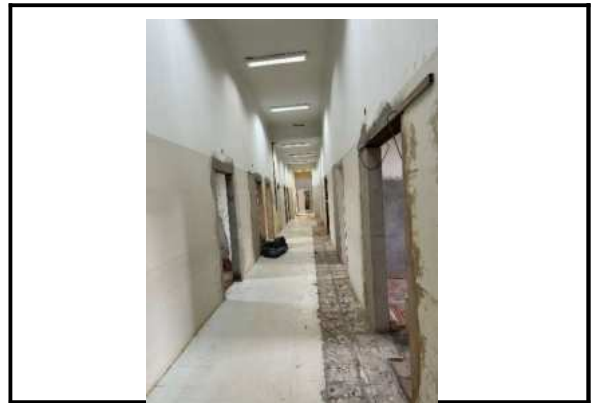


IMAGEM 06

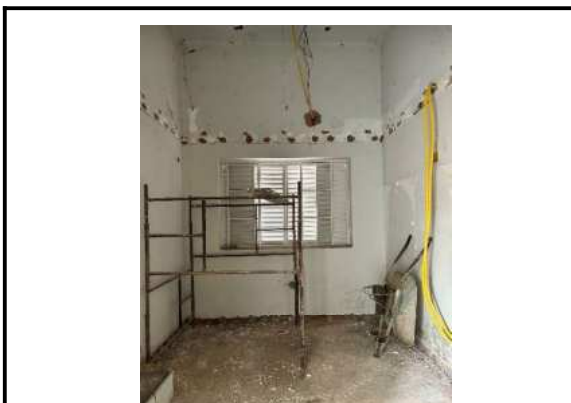


IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 6 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, os serviços na obra de reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento. As atividades concentraram-se na continuidade do fechamento de paredes em áreas previamente definidas, bem como na execução do reboco em superfícies já levantadas. A limpeza do canteiro também foi mantida, com a retirada progressiva dos entulhos gerados durante as frentes de serviço. A equipe segue composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

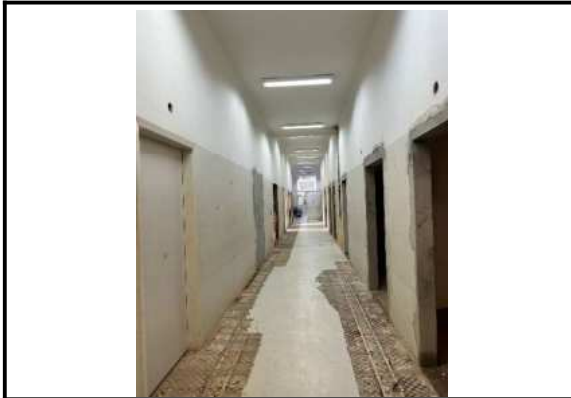


IMAGEM 09

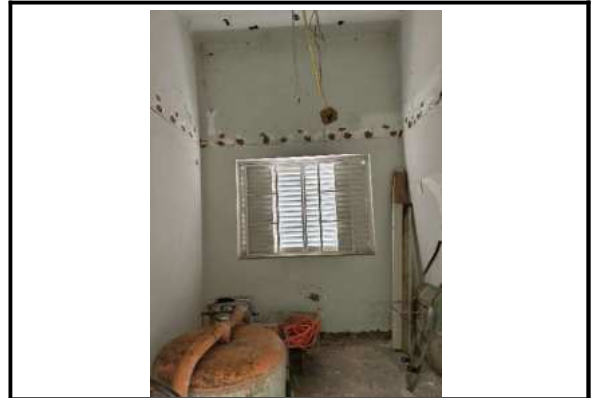


IMAGEM 10



IMAGEM 11



IMAGEM 12



IMAGEM 13



IMAGEM 14



IMAGEM 15



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 9 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No início da semana, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro avançaram com a manutenção das frentes de alvenaria, dando continuidade ao fechamento de paredes e ao reboco de superfícies previamente erguidas. Houve também ênfase na retirada de boa parte do piso antigo, como parte da preparação para as novas etapas de acabamento. A remoção dos entulhos gerados permanece sendo realizada de forma contínua, contribuindo para a organização do canteiro. Os trabalhos seguem com o apoio de uma equipe composta por 9 operários.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

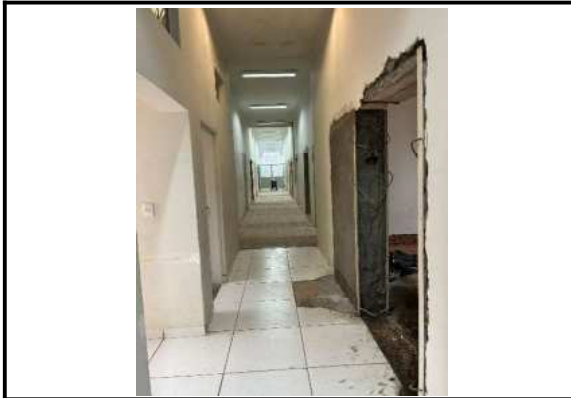


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

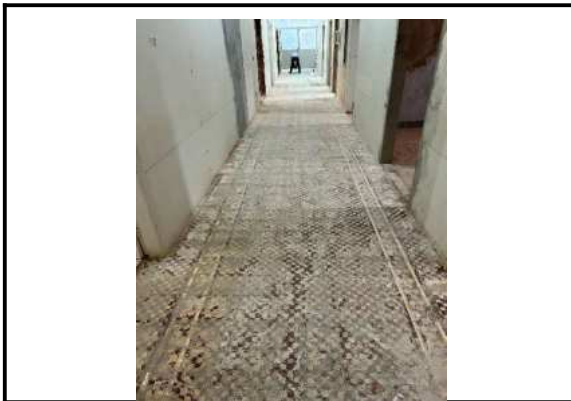


IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07

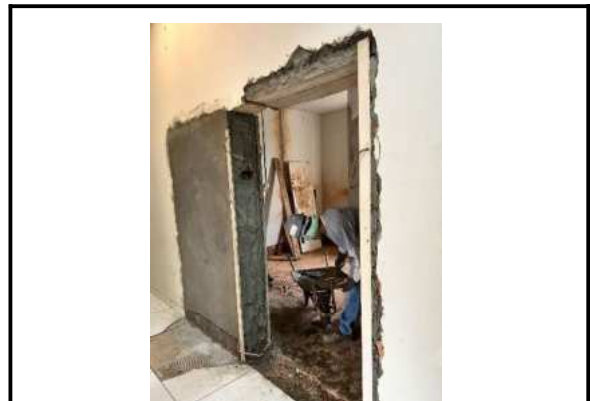


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 10 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da obra de reforma do Pronto Socorro prosseguiram nesta data, com continuidade nos serviços de alvenaria, incluindo o fechamento de paredes e aplicação de reboco em trechos previamente levantados. Foi dada ênfase à remoção parcial do piso antigo, etapa necessária para a preparação da nova base. A limpeza do canteiro segue sendo realizada paralelamente, com a retirada dos entulhos acumulados. A equipe permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07

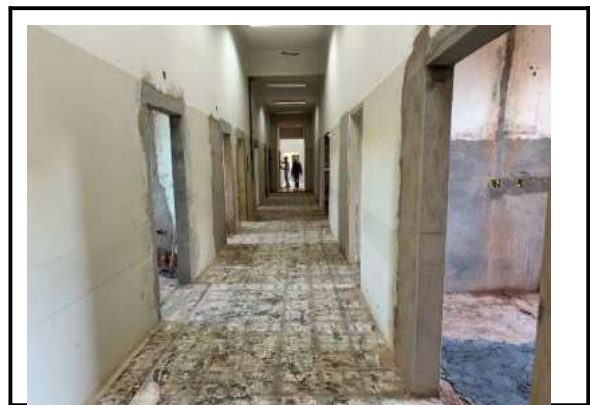


IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 11 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade com a execução das alvenarias de fechamento ainda em andamento, bem como os serviços de reboco em paredes já erguidas. Parte da equipe concentrou esforços na retirada de trechos remanescentes do piso antigo, atividade necessária para as próximas etapas de regularização do contrapiso. A remoção dos entulhos gerados pelas frentes de trabalho também segue sendo realizada. A equipe operacional permanece composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 12 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro avançaram com a continuidade das atividades de alvenaria, com prosseguimento no fechamento de divisórias e execução de reboco em paredes já levantadas. Nesta etapa, foi dada atenção especial à remoção de parte do revestimento de piso antigo, visando à preparação das áreas para os serviços subsequentes. A coleta e retirada dos entulhos continuam sendo executadas de forma paralela, garantindo a manutenção da organização no canteiro. As atividades seguem sendo realizadas por uma equipe composta por 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

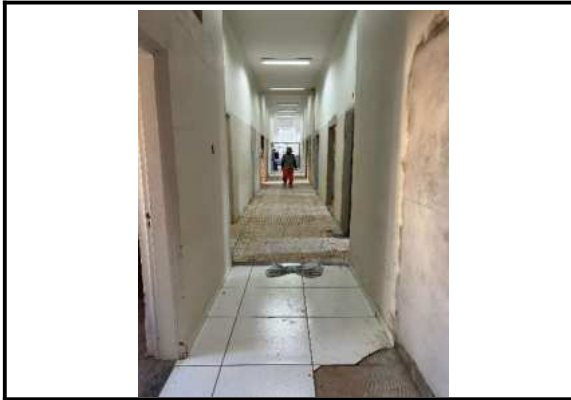


IMAGEM 01



IMAGEM 02

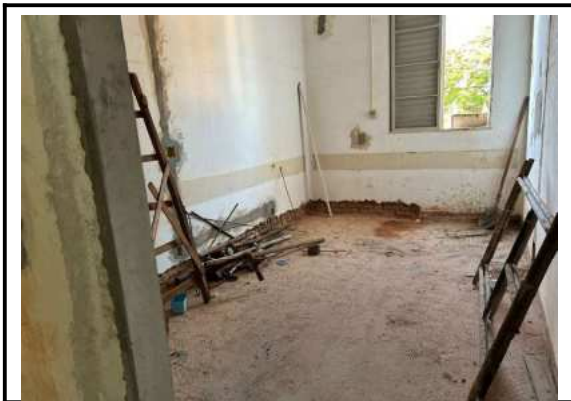


IMAGEM 03



IMAGEM 04

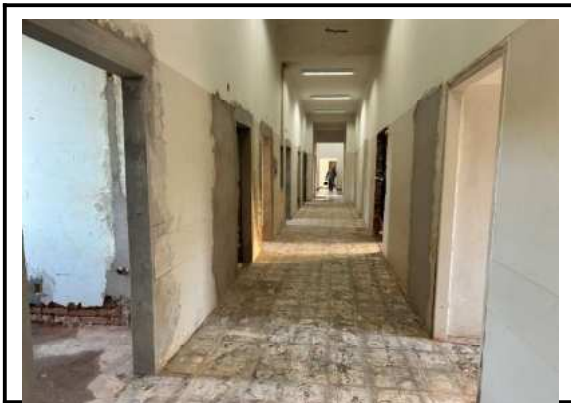


IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 13 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Nove
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, as frentes de trabalho na reforma do Pronto Socorro mantiveram o ritmo de execução. Foram dados avanços nas atividades de alvenaria, com continuidade no fechamento de paredes e aplicação de reboco em trechos previamente executados. Paralelamente, as equipes concentraram esforços na retirada parcial do revestimento de piso antigo. A retirada de entulho gerado ao longo do processo foi mantida de forma contínua. As atividades seguem com o efetivo de 9 trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

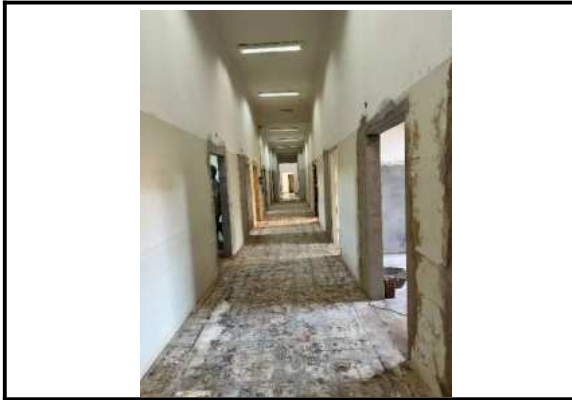


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 16 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	****
VISITANTES NO LOCAL:	****
EPI's EM USO:	****

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, a equipe de obra compareceu ao canteiro, entretanto, conforme orientação repassada pela fiscalização, as atividades foram suspensas. A decisão foi tomada em função da comunicação recebida via e-mail pela equipe técnica do hospital na última sexta-feira, informando sobre a paralisação e rescisão contratual. Dessa forma, nenhuma atividade foi executada no local neste dia.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 17 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, foi realizada uma reunião técnica no canteiro de obras, com a presença da proprietária da empresa executora, Sra. Ana, do engenheiro responsável técnico, Sr. Alan, e da equipe gestora do hospital, representada pela Sra. Eliana e pela diretora Marina Prearo. O objetivo do encontro foi alinhar os termos referentes ao encerramento contratual da empresa com a obra em questão. Ficou acordado entre as partes que a empresa concluirá os serviços hidráulicos atualmente em execução, bem como as intervenções estruturais previstas, conforme detalhado no e-mail formal encaminhado na data de hoje.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

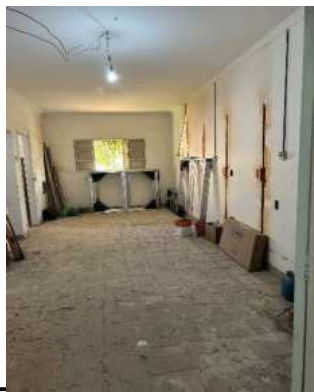


IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 09



IMAGEM 10

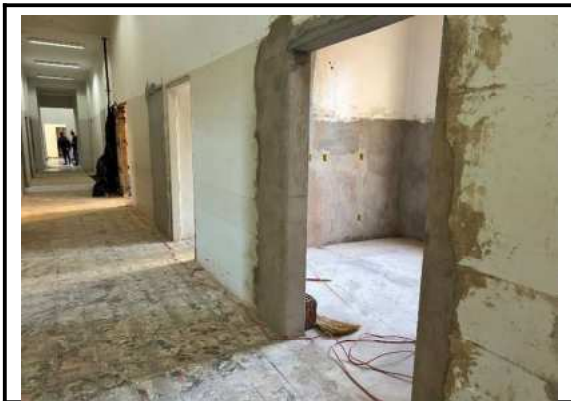


IMAGEM 11



IMAGEM 12



IMAGEM 13



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 18 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro foram retomados, com foco na conclusão das frentes de trabalho previamente acordadas. As atividades se concentraram na finalização dos serviços remanescentes, com ênfase nos sistemas hidráulicos e nos elementos estruturais localizados na área do hall de acesso. As ações seguem em conformidade com o que foi definido na reunião realizada anteriormente com a equipe técnica e representantes da instituição hospitalar.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

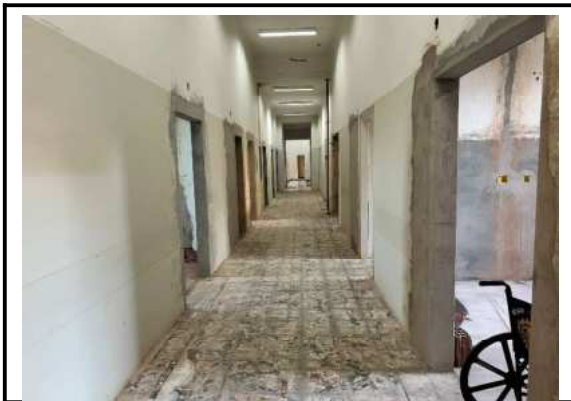


IMAGEM 03

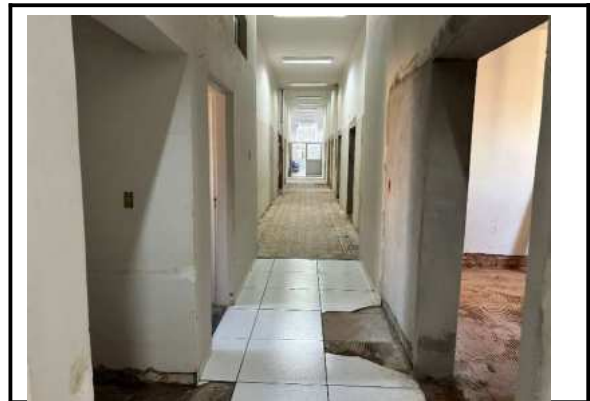


IMAGEM 04

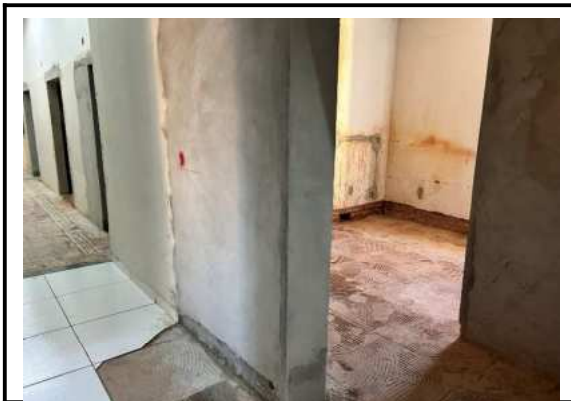


IMAGEM 05



IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 19 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	****
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	****
VISITANTES NO LOCAL:	****
EPI's EM USO:	****

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, não houve expediente devido ao feriado

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 20 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Cinco
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, a equipe deu continuidade aos serviços da obra de reforma do Pronto Socorro, concentrando-se na conclusão das frentes de trabalho remanescentes. As atividades foram direcionadas à finalização dos sistemas hidráulicos e das intervenções estruturais localizadas no hall de acesso, conforme planejamento previamente estabelecido. Os trabalhos seguem conforme o escopo acordado com a equipe técnica responsável.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

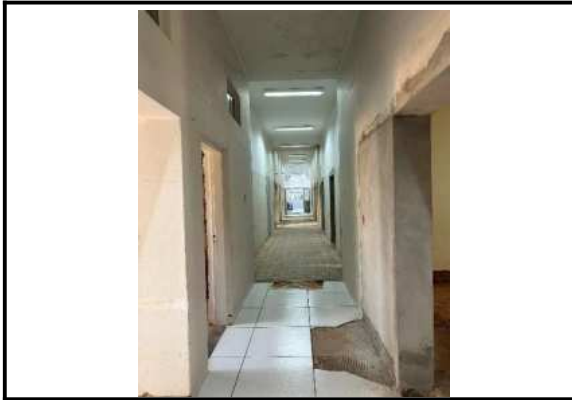


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

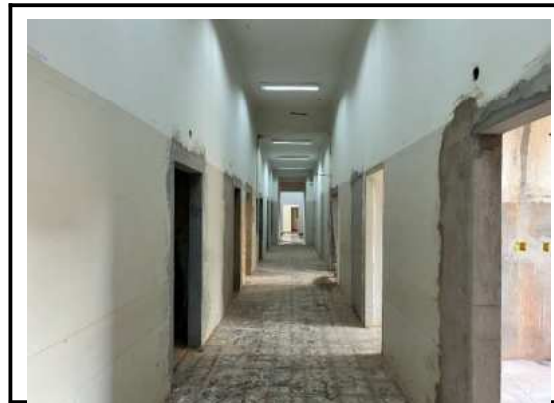


IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 23 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro foram retomados, marcando o início da semana com continuidade nas frentes de serviço em andamento. As atividades concentraram-se na finalização dos itens remanescentes relacionados às instalações hidráulicas e aos elementos estruturais no hall de acesso. Ressalta-se que, neste dia, a equipe em campo foi reduzida, contando com apenas dois colaboradores para a execução das tarefas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	terça-feira, 24 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com foco na conclusão dos itens remanescentes referentes às instalações hidráulicas e à estrutura do hall de acesso. As atividades seguiram em ritmo mais desacelerado, devido à manutenção da equipe reduzida, composta por apenas dois colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

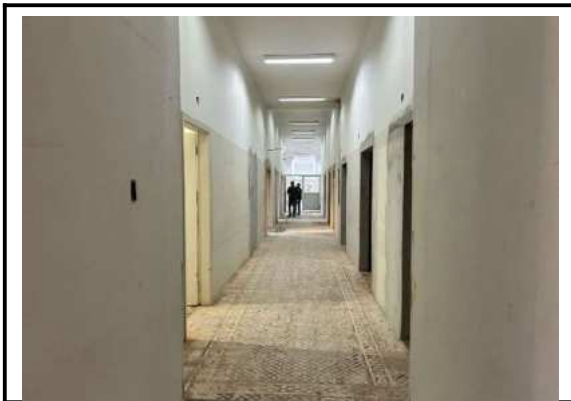


IMAGEM 03



IMAGEM 04

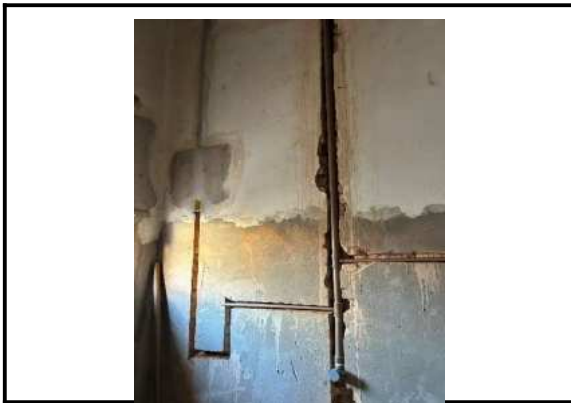


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quarta-feira, 25 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Dois
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro prosseguiram com foco na continuidade das atividades hidráulicas remanescentes. Os trabalhos seguem em ritmo mais lento, em razão da permanência de equipe reduzida, composta por dois colaboradores. Ressalta-se que, apesar do avanço na parte hidráulica, não houve progresso nas intervenções estruturais previstas para o hall de acesso.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	quinta-feira, 26 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com ênfase na conclusão dos serviços hidráulicos remanescentes, conforme previsto no escopo. As frentes relacionadas à parte estrutural do hall de acesso, entretanto, permaneceram sem avanço. As atividades do dia foram executadas por uma equipe composta por quatro colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

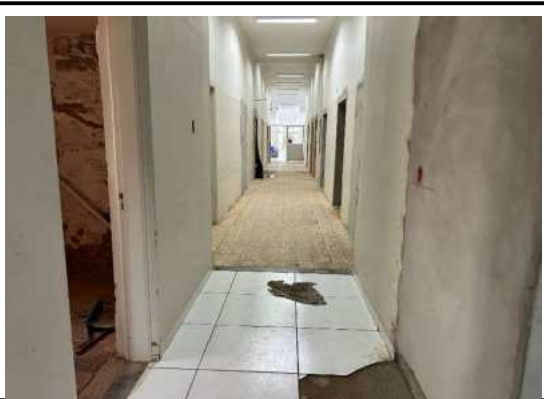


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	sexta-feira, 27 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No encerramento da semana, os serviços da reforma do Pronto Socorro seguiram em andamento, com continuidade nas atividades voltadas à finalização dos sistemas hidráulicos remanescentes. Observa-se, entretanto, a ausência de progresso nas intervenções estruturais previstas para o hall de acesso. As atividades foram conduzidas por equipe reduzida, composta por dois colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04

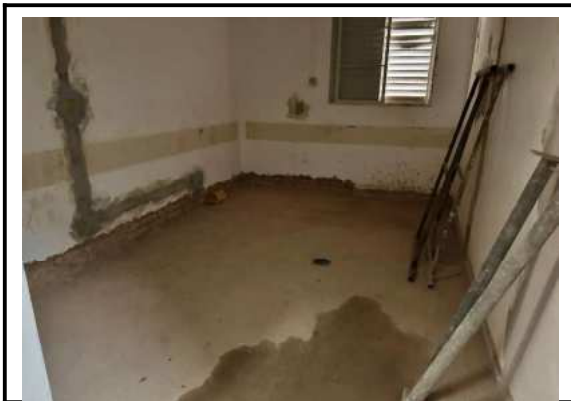


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do Pronto Socorro - Etapa I

DATA:	segunda-feira, 30 de junho de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os serviços da obra de reforma do Pronto Socorro tiveram continuidade, com foco na conclusão das atividades remanescentes referentes ao sistema hidráulico. Os trabalhos foram realizados por equipe composta por dois colaboradores. Ressalta-se que, conforme previsto, esta data marca o encerramento do prazo estipulado para finalização dos serviços em questão, bem como o término do vínculo contratual com a empresa VGB, em decorrência de definições documentais previamente acordadas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
VGB Construtora LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05

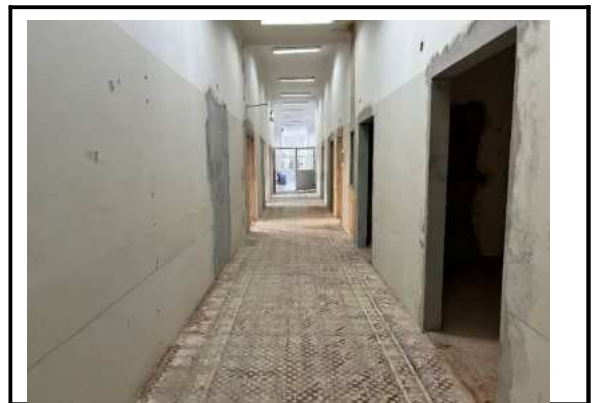


IMAGEM 06



IMAGEM 07



IMAGEM 08
