



Santa Casa Bariri

Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 03/2025

REFORMA PS I

DEZEMBRO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 12/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
17/12/2025	R\$ 35.804,81	17/12/2025		R\$ 35.804,81

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 92.035,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 35.804,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 357,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 128.197,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 128.197,49

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	27661-8
Cliente	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 92.035,44 ✓
Aplicações no mês:	R\$ 35.804,81 ✓
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.141,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 357,24 ✓
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 85.056,41 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 91.863,10	R\$ 172,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	Resgate	R\$ 42.932,30	R\$ 208,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.141,08
17/12/2025	Aplicação	R\$ 35.804,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.804,81
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 84.735,61	R\$ 320,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051041764979011
05/01/2026 10:46:12

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA REFORMA PS 1
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	39.896,51 D	
				12/12 09:19 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.202	3.244,57 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
12/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.141,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	35.804,81 C	
				17/12 08:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAUI			
17/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.804,81 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 12/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
1	09/12/2025	521	EMPREITADA GLOBAL	PAGTO DA MEDIÇÃO 3 (CONTR 03_25) REFORMA PS I	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	12/12/2025	R\$ 39.896,51
2	12/12/2025		IMPOSTOS	ACASI NF 508	ISS		12/12/2025	R\$ 3.244,57

TOTAL: R\$43.141,08

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REFORMA PS 1
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212121812854090372
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$39.896,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 09:19:48

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 09:19:49

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: F.EBB.57B.8C5.B2B.5AD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2025

	MUNICÍPIO DE JAHU Município de Jahu NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 521 Código de Verificação de Autenticidade 3BG163VD0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/12/2025 às 14:13:02 Chave de Acesso Q6PS6LJ4AQZ8Y8RPXWZZ9PTNVVCM8N7 Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/12/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 56934	Cadastro 005693400	Nome/Razão Social ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947		Complemento		Bairro VILA NETINHO PRADO	
CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3416-2534		E-mail gguermendi2005@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE	Telefone 14 3602 6522	E-mail financeiro@santacasabariri.com.br	


Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 3a. Medicao do Contrato nr. 03/2025, recurso convenio 03/2025. "Adequação do Pronto Socorro". CNO Nº 90.025.32952/75 Valor material aplicado - R\$ 20.700,00 Valor MDO - R\$ 20.752,98 Serviços Executados no Período de 01/11/2025 a 30/11/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Economica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578109072-0 - OP.003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	41.452,98	R\$ 41.452,98

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,		4,00%	000007.0000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 41.452,98	R\$ 0,00	R\$ 20.700,00	R\$ 20.752,98	R\$ 830,12	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS (20.752,98 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 726,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 39.896,51** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 521 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BG163VD0 .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____-____-____	Assinatura 

Nº: 003/16025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.56
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REFORMA PS 1

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.661-8

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 81740000032-6 44570447202-3

51215020420-8 00424282011-8

Data do pagamento 12/12/2025

Valor Total 3.244,57

=====

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB:

B.CAB.764.CF4.539.E4C

TERMO DE CONVENIO

Nº: 003/2025



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 000005382	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	Número 409	Complemento
CEP 17250-071	Bairro JARDIM PARAISO	Cidade BARIRI-SP

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 508
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo R\$ 81.114,30	Qtde Notas 1	Vencimento 15/12/2025	Referência 11/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-424282-4-11	Cadastro 000005382	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 13 - ISS TOMADOR		
Valor Original R\$ 3.244,57	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 3.244,57	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/12/2025 07:04:57 por: IRMANDADE DA SANTA C



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		Número 409		Complemento	
CEP 17250-071	Bairro JARDIM PARAISO		Cidade BARIRI-SP		
Vencimento 15/12/2025	Código de Baixa 2-424282-4-11	Cadastro 000005382	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 13 - ISS TOMADOR	
Valor Original R\$ 3.244,57	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 3.244,57	

Após o vencimento cobrar multa e juros:

Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%

E ACIMA DE 60 DIAS 20%

JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 508
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Autenticação Mecânica

81740000032-6 44570447202-3 51215020420-8 00424282011-8



TERMO DE CONVENIO
Nº: 003/2025

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	508	R\$ 81.114,30	4,00 %	R\$ 3.244,57
Total de notas: 1					R\$ 3.244,57

TERMO DE COMPROMISSO
Nº: 003/2015



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DEZEMBRO

2025



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE I

No dia 08 de dezembro de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 01/2025, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **3ª medição** no valor total de **R\$ 41.452,98 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 03/2025, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 04 de agosto de 2025.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 08/12/2025 16:01:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Vicepresidência, OU=3807330000103, OU=AC
CONSTRUTORA LTDA, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
Reader: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-12-08 16:23:16
Fonte Reader: Versão: 0.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
 Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
 Jaú – SP – Cep.: 17208-010
 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
 Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - PARTE I										CDHU 196, nov/2024,			
Local: Av. Cel José de Carvalho, nº 409 - Vila Terezinha - Bariri/SP										CDHU: 196			
BIM 1: 32,07% ~ BDI para licitação de acordo com o Edital (CDHU, SINAPI/SP, SIURB)										SIURB, julho 2024, Desonerada			
Jaú/SP, 12 de Agosto de 2023										MEDIÇÃO 3			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI		QTD	Unidade	Preço Total com BDI	Execução %
1 ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA								R\$ 4.357,39					
1.1	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	20	M	R\$ 307,23	R\$ 405,76	R\$ 4.057,59					100%
2 BARRAS DE APOIO								R\$ 5.717,19					
2.1	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	9,00	UN	R\$ 157,26	R\$ 207,70	R\$ 1.869,26					
2.2	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	10,00	UN	R\$ 165,08	R\$ 218,02	R\$ 2.180,19					
2.3	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R\$ 144,84	R\$ 191,30	R\$ 191,30					
2.4	30.01.010	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	6,00	M	R\$ 186,32	R\$ 246,07	R\$ 1.476,44					
3 PISOS E REVESTIMENTOS								R\$ 41.044,81					
3.1	18.06.103	CDHU	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	275	M	R\$ 5,70	R\$ 7,52	R\$ 2.066,51					100%
3.2	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	100	M2	R\$ 136,74	R\$ 180,59	R\$ 18.058,89					100%
3.3	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	390	M2	R\$ 41,68	R\$ 55,05	R\$ 20.917,20					100%
4 BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS								R\$ 20.868,34					
4.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	10,00	M2	R\$ 933,23	R\$ 1.232,51	R\$ 12.325,13					
4.2	19.01.062	CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	40,00	M	R\$ 161,72	R\$ 213,58	R\$ 8.543,21					100%
5 ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS								R\$ 113.653,98					
5.1	25.01.070	CDHU	Cavilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	38,00	M2	R\$ 309,34	R\$ 408,55	R\$ 15.524,81					100%
5.2	25.01.050	CDHU	Cavilho em alumínio maxitr-ar com vidro, linha comercial	4,00	M2	R\$ 449,95	R\$ 594,25	R\$ 2.377,01					100%
5.3	25.02.042	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida	42,00	M2	R\$ 894,18	R\$ 1.180,95	R\$ 49.589,76					100%
5.4	25.02.310	CDHU	Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca	16,00	M2	R\$ 1.232,97	R\$ 1.628,38	R\$ 26.054,13					100%
5.5	25.01.240	CDHU	Cavilho fixo em alumínio, sob medida - cor branca	10,00	M2	R\$ 1.093,69	R\$ 1.444,44	R\$ 14.444,43					100%
5.6	26.01.142	CDHU	Vidro liso laminado colorido de 8 mm	10,00	M2	R\$ 428,09	R\$ 565,38	R\$ 5.653,81					100%
6 PINTURA								R\$ 33.948,49					
6.1	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	40,00	M2	R\$ 13,44	R\$ 17,76	R\$ 710,23					100%
6.2	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	600,00	M2	R\$ 26,54	R\$ 35,05	R\$ 21.030,54					67%
6.3	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	300,00	M2	R\$ 30,81	R\$ 40,89	R\$ 12.207,69					67%
7 FORROS / MARCENARIA								R\$ 35.450,21					
7.1	22.02.010	CDHU	Forro em placa de gesso liso fixo	230,00	M2	R\$ 86,73	R\$ 114,54	R\$ 26.344,72					100%
7.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	3,00	M2	R\$ 2.298,15	R\$ 3.035,17	R\$ 9.105,50					
8 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 40.308,70				R\$ 31.135,16	
8.1	44.01.160	CDHU	Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial	18,00	UN	R\$ 969,40	R\$ 1.280,29	R\$ 23.045,25		18,00	UNID	R\$ 23.045,25	100%
8.2	44.01.052	CDHU	Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros	2,00	UN	R\$ 329,39	R\$ 435,03	R\$ 870,06		2,00	UNID	R\$ 870,06	100%
8.3	30.08.060	CDHU	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	4,00	UN	R\$ 1.049,62	R\$ 1.386,24	R\$ 5.544,95		4,00	UNID	R\$ 5.544,95	100%
8.4	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R\$ 45,34	R\$ 59,88	R\$ 239,52					
8.5	44.06.300	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	6,00	UN	R\$ 257,30	R\$ 339,81	R\$ 2.038,89					
8.6	44.06.200	CDHU	Tanque em aço inoxidável	1,00	UN	R\$ 1.313,63	R\$ 1.734,90	R\$ 1.734,90		1,00	UNID	R\$ 1.734,90	100%
8.7	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	18,00	UN	R\$ 141,74	R\$ 187,19	R\$ 3.369,42					
8.8	44.03.510	CDHU	Torneira de parede antiderramamento, DN= 3/4"	1,00	UN	R\$ 559,44	R\$ 738,86	R\$ 738,86					
8.9	44.01.270	CDHU	Cuba de louça de embutir oval	1,00	UN	R\$ 125,07	R\$ 165,17	R\$ 165,17					
8.10	44.03.360	CDHU	Ducha higiênica cromada	2,00	UN	R\$ 580,97	R\$ 767,28	R\$ 1.534,56					
8.11	44.03.315	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	7,00	UN	R\$ 93,06	R\$ 122,91	R\$ 860,36					
8.12	48.05.040	CDHU	Torneira de bacia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 126,27	R\$ 166,76	R\$ 166,76					
9 REDE DE GASES MEDICINAIS								R\$ 28.710,37					
9.1	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	120,00	M	R\$ 99,66	R\$ 131,62	R\$ 15.794,40					
9.2	92311	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	30,00	UN	R\$ 14,22	R\$ 18,78	R\$ 563,37					
9.3	92287	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	150,00	UN	R\$ 18,12	R\$ 23,93	R\$ 3.590,16					
9.4	92329	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	30,00	UN	R\$ 9,83	R\$ 12,98	R\$ 389,53					
9.5	92315	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	12,00	UN	R\$ 13,73	R\$ 18,13	R\$ 217,52					
9.6	92332	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	R\$ 20,47	R\$ 27,03	R\$ 162,18					
9.7	92318	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	12,00	UN	R\$ 30,52	R\$ 40,31	R\$ 483,70					
9.8	93104	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	R\$ 19,18	R\$ 25,33	R\$ 151,97					
9.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	10,00	UN	R\$ 22,82	R\$ 30,14	R\$ 301,39					
9.10	95252	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	10,00	UN	R\$ 112,22	R\$ 148,21	R\$ 1.482,12					
9.11	93085	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	23,00	UN	R\$ 16,57	R\$ 21,89	R\$ 503,42					
9.12	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	36,00	UNID	R\$ 92,12	R\$ 121,67	R\$ 4.380,03					
9.13	17010076	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 522,90	R\$ 690,59	R\$ 690,59					
10 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO								R\$ 2.348,07					
10.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	1,00	UN	R\$ 457,34	R\$ 604,01	R\$ 604,01					
10.2	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	40,00	M	R\$ 19,34	R\$ 25,55	R\$ 1.021,85					
10.3	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 38 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R\$ 40,72	R\$ 53,78	R\$ 215,12					
10.4	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	20,00	M	R\$ 19,20	R\$ 25,35	R\$ 507,09					
11 REFORMA ELÉTRICA								R\$ 45.025,95				R\$ 10.257,81	
11.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	1,00	UN	R\$ 593,58	R\$ 783,94	R\$ 783,94					100%
11.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	50,00	M	R\$ 93,52	R\$ 123,51	R\$ 6.175,48		50,00	M	R\$ 6.175,48	100%
11.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	50,00	M	R\$ 52,52	R\$ 69,36	R\$ 3.467,99		50,00	M	R\$ 3.467,99	100%
11.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R\$ 29,24	R\$ 38,82	R\$ 347,58		9,00	UNID	R\$ 347,58	100%
11.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R\$ 22,44	R\$ 29,64	R\$ 266,76		9,00	UNID	R\$ 266,76	100%

**ACASI
CONSTRUTORA
LDA:33898240000104**

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA.
33898240000104
DN: C=BR, o=C&P=Brask, ou=Certificado Digital I.U.I, cn=Alexandre Carvalho Silva, email=alexandre@acasi.com.br, ou=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104, ou=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Lançamento em 20/08/2016 às 16:23:15
Assinatura: 2020-12-08 16:23:15
Assinatura: 2020-12-08 16:23:15

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 08/12/2025 16:01:53-0300
Verifique em <https://validar.itj.gov.br>



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 4 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, os serviços da reforma do pronto socorro avançaram conforme o previsto. A equipe manteve o foco na aplicação de massa corrida em diversos espaços, concomitante ao progresso das atividades de pintura. Outras frentes de serviço também foram acionadas simultaneamente. A mão de obra envolvida somou quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

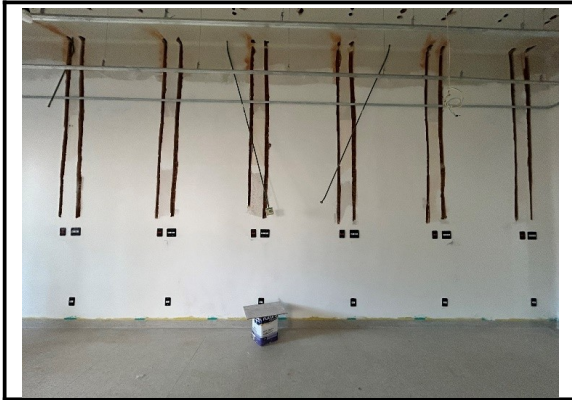


IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante esta data, a obra do pronto socorro teve continuidade, com destaque para a aplicação de massa corrida em vários ambientes. Em paralelo, prosseguiram as etapas de pintura, além da execução de atividades complementares em outras frentes da edificação. As operações contaram com a participação de quatro integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos da reforma do pronto socorro mantiveram seu ritmo nesta data. A equipe concentrou-se na aplicação de massa corrida em diferentes setores da edificação, enquanto as atividades de pintura avançaram paralelamente. A execução ocorreu de forma simultânea com outras frentes de serviço. A equipe permaneceu composta por quatro pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 9 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades realizadas hoje no pronto socorro incluíram a continuidade da aplicação de massa corrida em vários ambientes, mantendo em paralelo o desenvolvimento das etapas de pintura. Outras frentes também foram acionadas de forma simultânea, garantindo o prosseguimento geral dos serviços. A força de trabalho do dia contou com quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 10 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dada continuidade às ações da reforma do pronto socorro. A equipe permaneceu atuando com ênfase na aplicação de massa corrida, além de manter o andamento das atividades de pintura em diferentes áreas. Trabalhos paralelos seguiram sendo executados por outras frentes da obra. O quadro operacional foi composto por quatro trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 11 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

A obra do pronto socorro avançou ao longo do dia, com a equipe atuando de forma intensiva na aplicação de massa corrida em diversos ambientes. As atividades de pintura tiveram continuidade simultaneamente, assim como outras intervenções complementares realizadas em pontos distintos da edificação. A equipe era formada por quatro colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 12 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No decorrer desta data, os serviços de reforma do pronto socorro evoluíram de forma organizada. Houve continuidade na aplicação de massa corrida em diferentes áreas, paralelamente ao andamento das atividades de pintura. Outras frentes de trabalho também se mantiveram ativas ao longo do dia. As atividades foram executadas por quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

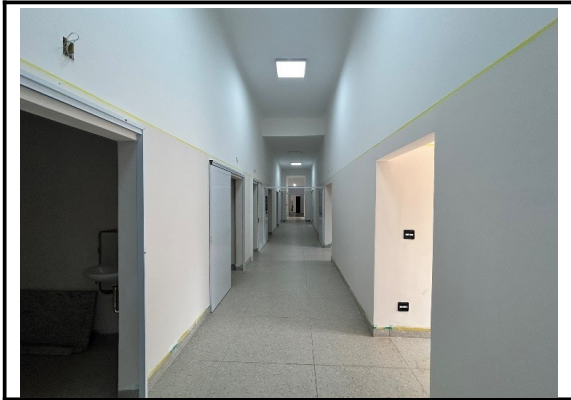


IMAGEM 01



IMAGEM 02

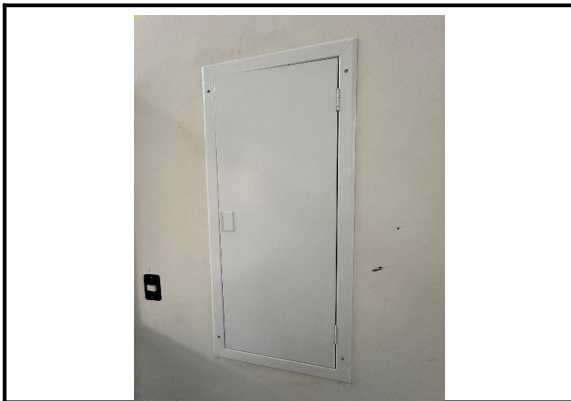


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos da reforma do pronto socorro seguiram em andamento, com concentração das atividades na aplicação de massa corrida em diversos ambientes, com atenção especial aos rodapés. Paralelamente, a equipe atuou em outras frentes da edificação, garantindo a continuidade geral dos serviços. As atividades foram executadas por quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 16 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços referentes à obra de reforma do pronto socorro tiveram prosseguimento, destacando-se a execução da aplicação de massa corrida, especialmente nos rodapés dos ambientes internos. De forma simultânea, outras frentes de trabalho permaneceram ativas em setores distintos da edificação. O efetivo do dia foi composto por quatro trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

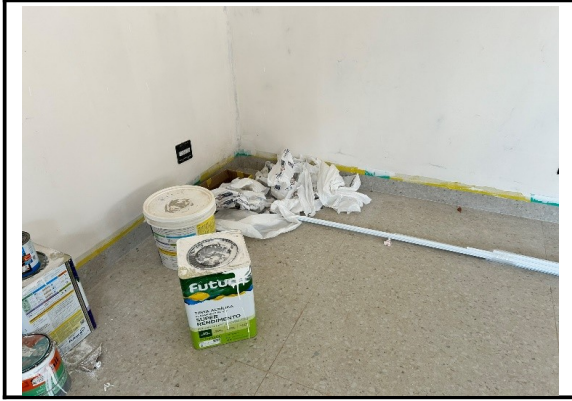


IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 17 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, a reforma do pronto socorro apresentou avanço nas etapas de acabamento, com ênfase na aplicação de massa corrida em vários ambientes, priorizando os rodapés. Em paralelo, foram desenvolvidas atividades complementares em outras frentes da edificação. A equipe operacional contou com quatro colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 18 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, houve continuidade das atividades da obra de reforma do pronto socorro. A equipe direcionou esforços para a aplicação de massa corrida nos ambientes internos, com foco específico nos rodapés, enquanto outras frentes de serviço atuaram simultaneamente em diferentes setores da edificação. As atividades foram conduzidas por quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 19 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades da reforma do pronto socorro avançaram conforme estabelecido. Os trabalhos concentraram-se na aplicação de massa corrida em diversos ambientes, com destaque para os serviços executados nos rodapés. Paralelamente, a equipe manteve atuação em outras frentes da edificação. O quadro de mão de obra foi composto por quatro trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

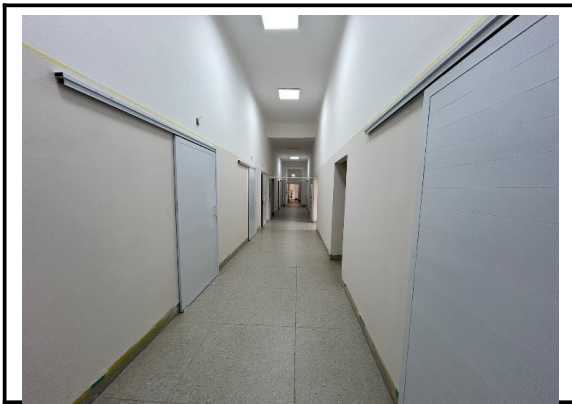


IMAGEM 03

 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arg@gmail.com
---	--

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade p	
DATA:	segunda-feira, 1 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS
Nesta data, as atividades da reforma do pronto socorro tiveram continuidade. A equipe direci para a aplicação de massa corrida em diversos setores, mantendo simultaneamente o andamento de pintura. Em paralelo, foram desenvolvidas outras frentes de trabalho distribuídas pela edificaç serviços foram executados por uma equipe composta por quatro profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL
Construtora A

--

Parte II

ionou esforços o das etapas ção. Os

--

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

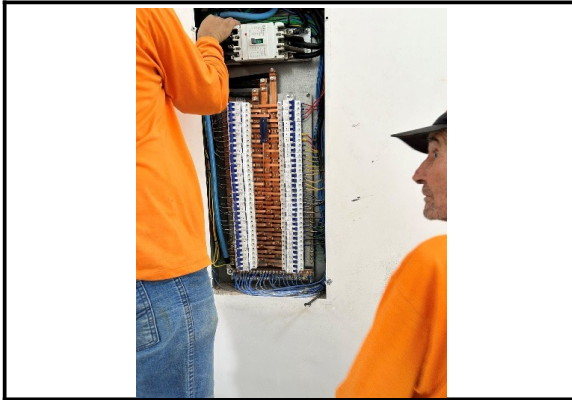


IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 2 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Dando sequência ao cronograma da obra, prosseguiram hoje os serviços no pronto socorro. O grupo atuou de forma predominante na aplicação de massa corrida em diferentes ambientes, enquanto, paralelamente, avançavam os trabalhos de pintura. Outras atividades complementares também ocorreram simultaneamente em diversas áreas do prédio. O efetivo total foi de quatro colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

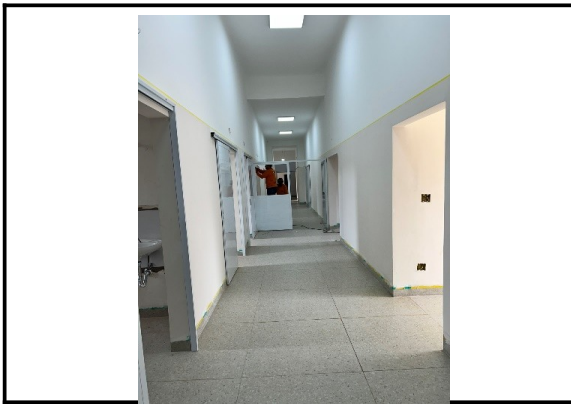


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 3 de dezembro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Quatro
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As intervenções no pronto socorro seguiram de forma contínua ao longo do dia. Houve ênfase na execução de massa corrida em múltiplos ambientes, além da manutenção do ritmo de pintura em setores distintos. Em paralelo, as equipes desenvolveram outras frentes operacionais dentro da edificação. A equipe presente foi composta por quatro trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

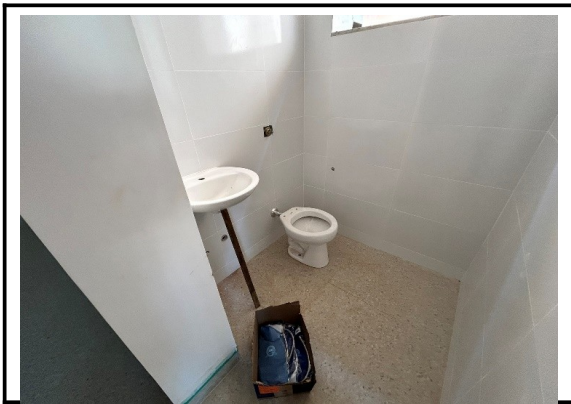


IMAGEM 03
