



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

OUTUBRO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 80/2025

Bariri, 03 de novembro de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 10/2025 do Convênio 06/2024.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 10/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 280.002,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.312,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 283.314,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 283.314,92

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G337041127746877019
04/11/2025 11:51:24**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		235.000,00
15/10		Resgate	- 2800962246455	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		221,16
		valor juros no mês		12,40
		valor líquido		2.233,56
31/10		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		1.233,95
31/10		Rendimento mensal	- 2800962246455	
		valor juros		618,45
31/10		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		1.235,04
31/10		Saldo final		
		valor capital		233.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	408500,00	20228,20	0,00	428728,20
30/05/2025	365000,00	21410,17	0,00	386410,17
30/06/2025	364000,00	25288,16	0,00	389288,16
31/07/2025	299500,00	23796,96	0,00	323296,96
29/08/2025	298000,00	27169,52	0,00	325169,52
30/09/2025	235000,00	23755,64	0,00	258755,64
31/10/2025	233000,00	26621,92	0,00	259621,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	47.500,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0500983321309	10.526,50
31/10	2800962246455	5.871,00
31/10	4300964981785	10.224,42

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030809118106044
03/11/2025 08:49:58

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	21.247,04			14.916,051664		
15/10/2025	APLICAÇÃO	100,81			70,438561	1,431176304	14.986,490225
16/10/2025	APLICAÇÃO	233,56			163,194429	1,431790869	15.149,684654
31/10/2025	SALDO ATUAL	21.793,79			15.149,684654		15.149,684654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.247,04
APLICAÇÕES (+)	334,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,38
SALDO ATUAL =	21.793,79

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 10/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº
1	15/10/2025		IMPOSTOS	ISS RETIDO NF 484	ISS		15/10/2025	
								R\$ 1.899,19

TOTAL: R\$1.899,19

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030809118106043
03/11/2025 08:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	101.501	1.899,19 D	
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,81 D	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.962.246.455	233,56 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	233,56 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Adote a opção favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.06.02
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.656-1

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 8170000018-9 99190447202-4

51015020320-4 00424282009-2

Data do pagamento 15/10/2025

Valor Total 1.899,19

=====

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB:

7.8CC.E31.58D.9FC.20B

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 06/dod4



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 484
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 47.479,67	1	15/10/2025	9/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-424282-3-9	000005382	2 - Mobiliário			13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 1.899,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.899,19

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/10/2025 09:46:16 por: IRMANDADE DA SANTA C

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri 46.181.376/0001-40	Exercício: 2025
Contribuinte		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Logradouro		Número
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409
CEP		Complemento
17250-071		
Bairro		Cidade
JARDIM PARAISO		BARIRI-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/10/2025	2-424282-3-9	000005382
Módulo		Receita Principal
2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 1.899,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros		Total Recebido
R\$ 0,00		R\$ 1.899,19
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.		
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 484 Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP		

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 06/2024

81700000018-9 99190447202-4 51015020320-4 00424282009-2



Centro Administrativo

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.240/0001-04	484	R\$ 47.479,67	4,00 %	R\$ 1.899,19
Total de notas: 1					R\$ 1.899,19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 06/2024



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO

2025



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 1 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades avançaram hoje, mantendo como prioridade a execução do novo telhamento, que seguiu em ritmo contínuo. Conjuntamente, foram realizados serviços auxiliares em setores distintos da edificação. A equipe contou com três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 2 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, a equipe deu continuidade ao cronograma de serviços, concentrando-se na etapa de colocação do telhamento. Em paralelo, outras frentes de trabalho dentro da edificação foram igualmente desenvolvidas. A equipe permaneceu composta por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 3 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje os trabalhos evoluíram com foco principal na colocação do novo telhamento. Em simultâneo, atividades secundárias foram executadas em diferentes pontos da edificação, garantindo andamento ao conjunto da obra. A equipe presente foi de três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 6 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, mantendo o foco na execução do novo telhamento. Paralelamente, foram desenvolvidos outros serviços em diferentes setores da edificação. A equipe permaneceu composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

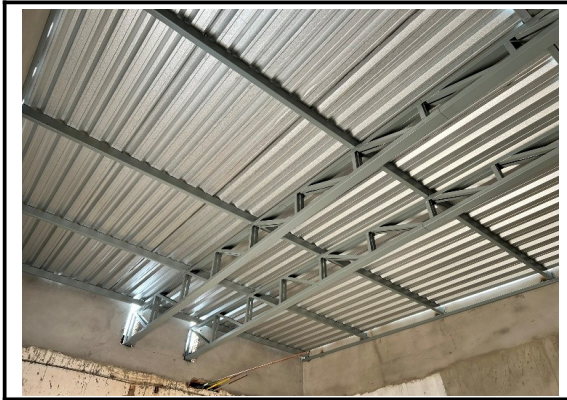


IMAGEM 01



IMAGEM 02

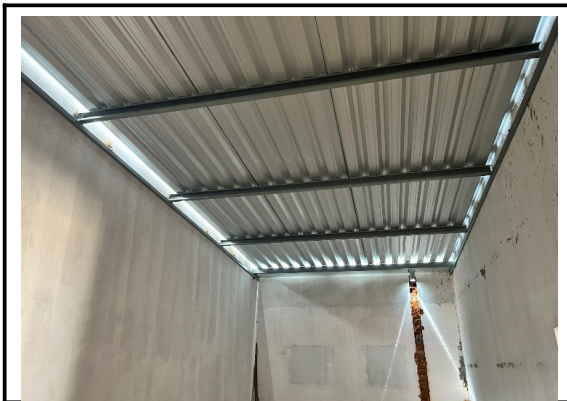


IMAGEM 03

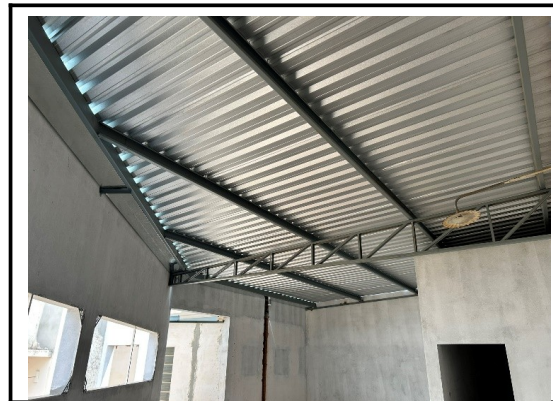


IMAGEM 04



IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 7 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos prosseguiram hoje com ênfase na etapa de colocação do novo telhamento. De forma simultânea, foram realizadas intervenções complementares em outras áreas da obra. A equipe atuante contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

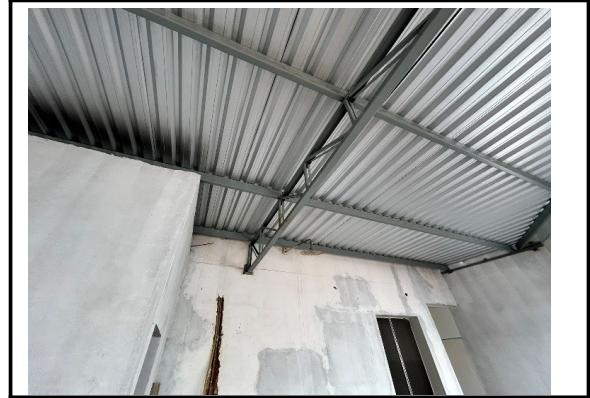


IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 8 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, as atividades tiveram continuidade, com destaque para o avanço dos serviços de instalação do novo telhamento. Em paralelo, outras frentes de trabalho seguiram em andamento em distintos pontos da edificação. A equipe presente foi composta por três trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

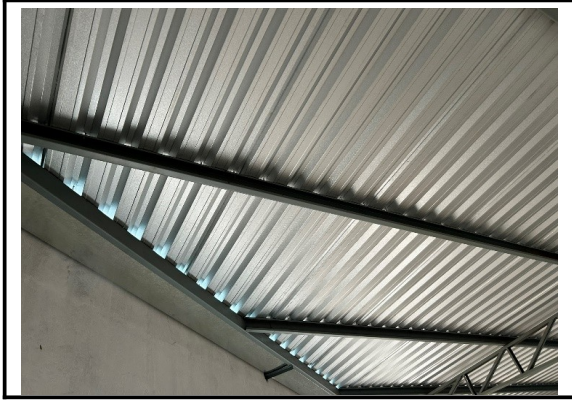


IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 9 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje, os serviços evoluíram conforme o cronograma, concentrando-se na colocação do novo telhamento. Ao mesmo tempo, atividades complementares foram executadas em outras partes da edificação. A equipe técnica contou com três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 10 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

A equipe manteve o ritmo de execução nesta data, priorizando a continuidade da instalação do novo telhamento. Conjuntamente, ocorreram outras ações construtivas em diferentes frentes de serviço dentro da edificação. A equipe foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 13 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, o expediente foi interrompido por conta da chuva.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 14 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, concentrando os esforços na execução do novo telhamento, cuja fase de instalação encontra-se em estágio avançado. Paralelamente, outras frentes de trabalho seguiram em andamento em distintos pontos da edificação. A equipe atuante foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

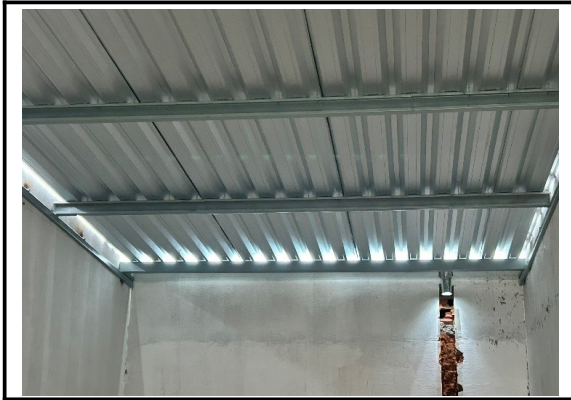


IMAGEM 01



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 15 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços prosseguiram nesta data, com foco principal na conclusão da nova cobertura, etapa que se encontra próxima da finalização. Em paralelo, outras atividades foram executadas em diferentes setores da edificação. A equipe presente contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 16 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje, os trabalhos tiveram continuidade, com ênfase nas ações referentes à colocação do novo telhamento, cuja execução está em fase final. Simultaneamente, ocorreram serviços complementares em outras áreas da obra. A equipe permanece composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

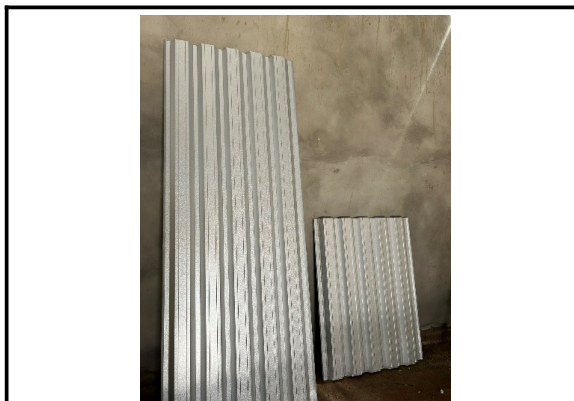


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 17 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, a equipe manteve o andamento das atividades, priorizando os trabalhos de instalação da nova cobertura, que já se encontra próxima da conclusão. De forma paralela, outras intervenções foram realizadas em diversas partes da edificação. A equipe contou com três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

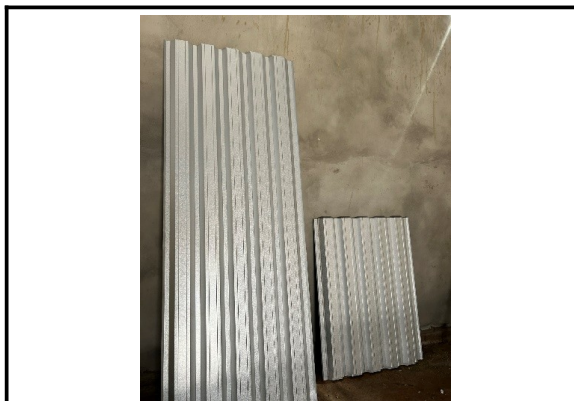


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 20 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, foi dada continuidade aos serviços, com destaque para o avanço da colocação do novo telhamento, etapa que se aproxima de sua finalização. Em paralelo, foram desenvolvidos outros serviços em diferentes frentes de trabalho. A equipe em campo foi composta por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 21 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, concentrando os esforços na preparação dos ambientes destinados à futura instalação dos pisos. Em paralelo, ocorreram serviços complementares em outras frentes de trabalho da edificação. A equipe presente foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 22 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, a equipe deu continuidade aos serviços, com foco principal na instalação dos pisos em diversos ambientes da edificação. Em paralelo, ocorreram atividades complementares em outras frentes de trabalho. A equipe em campo foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

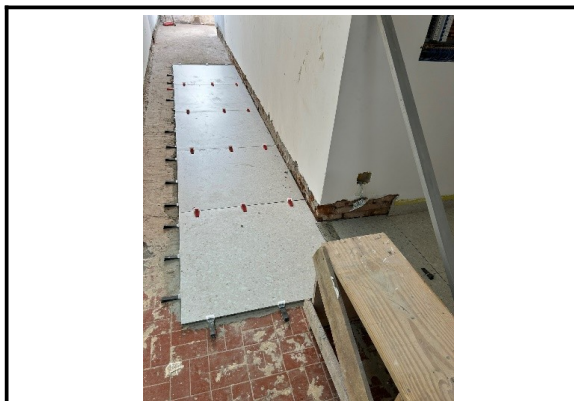


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 23 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos prosseguiram nesta data, concentrando-se na execução do assentamento de pisos em diferentes setores da edificação. De forma simultânea, outras atividades foram desenvolvidas em distintas áreas do canteiro. A equipe atuante contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

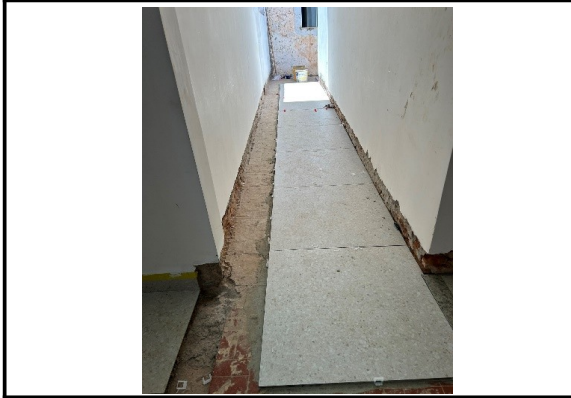


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 24 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje, as atividades tiveram continuidade, com ênfase na instalação dos pisos em vários ambientes. Paralelamente, outras frentes de serviço permaneceram em andamento em diferentes pontos da obra. A equipe presente foi composta por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

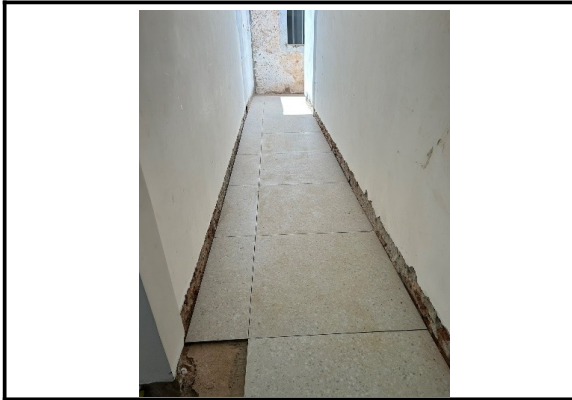


IMAGEM 01

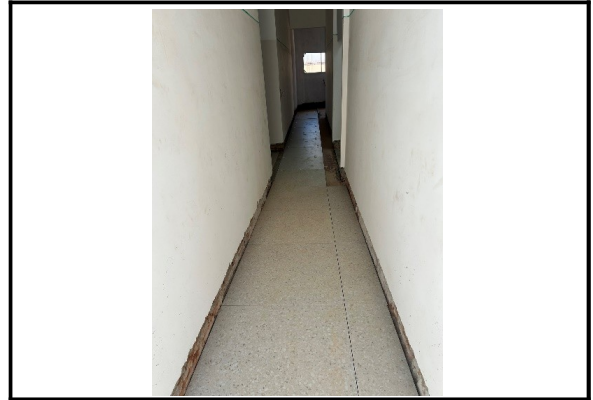


IMAGEM 02

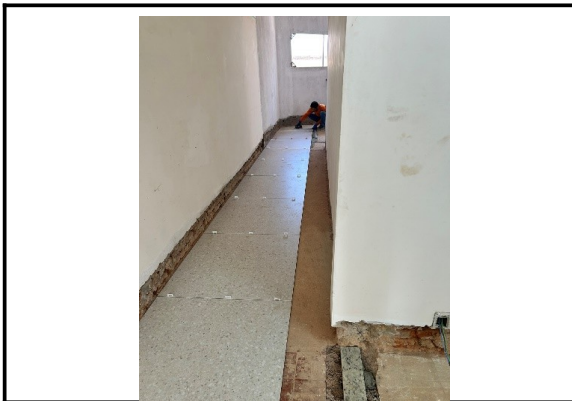


IMAGEM 03



IMAGEM 04

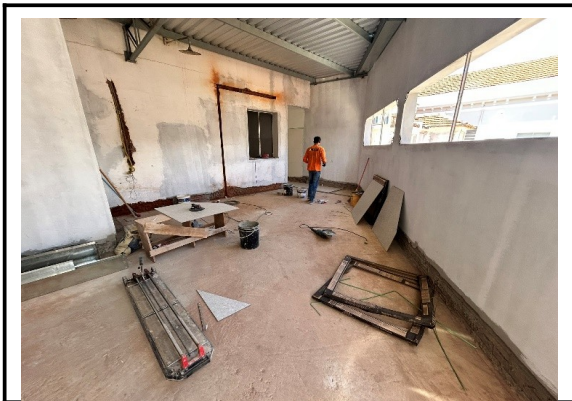


IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 27 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, a equipe manteve o andamento dos trabalhos, priorizando a colocação dos pisos em múltiplos ambientes da edificação. Simultaneamente, outras tarefas foram executadas em setores distintos. A equipe contou com três integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 28 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, foram realizadas atividades voltadas à instalação dos pisos em diversos ambientes. Em paralelo, outras ações foram conduzidas em diferentes frentes da edificação. A equipe atuante foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 29 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Chuva
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades, com foco na execução do assentamento de pisos em diversos ambientes da edificação. Em paralelo, outras frentes de trabalho seguiram em andamento em diferentes setores. A equipe presente foi composta por três profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 30 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços prosseguiram nesta data, com ênfase na instalação dos pisos em múltiplos ambientes. Simultaneamente, foram executadas atividades complementares em outras áreas da edificação. A equipe atuante contou com três colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 31 de outubro de 2025
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Três
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Hoje, os trabalhos avançaram com destaque para a colocação dos pisos em diversos ambientes da obra. De forma paralela, ocorreram intervenções em outras frentes de serviço. A equipe em campo foi composta por três pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

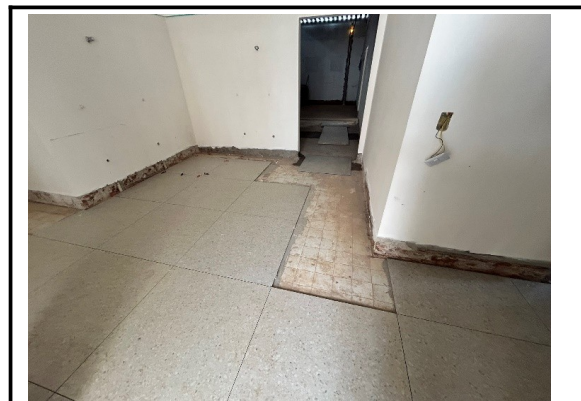


IMAGEM 02

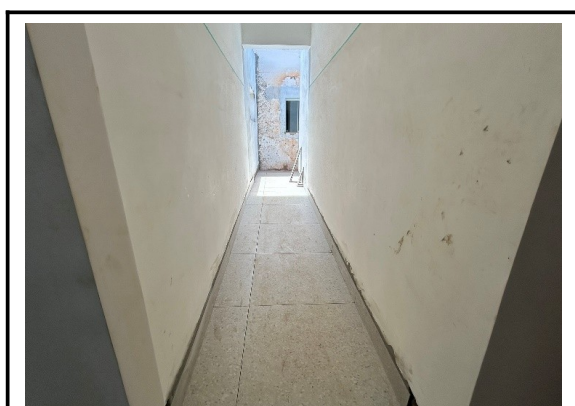


IMAGEM 03
