



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

ABRIL 2026



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 04/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 170.368,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.684,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 172.053,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 172.053,12

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 04/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO	CHAVE					DATA	Nº	R\$

TOTAL: R\$0,00

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 9 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram conforme o cronograma, com atuação direcionada à execução do contrapiso nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico, etapa fundamental para a instalação subsequente do piso vinílico. Em paralelo, foram realizados serviços em outras frentes da edificação. A equipe foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 10 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, os serviços mantiveram seu andamento, com foco nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico, onde foram realizados trabalhos de execução de contrapiso, preparando a base para a futura aplicação de piso vinílico. Concomitantemente, outras atividades foram executadas em diferentes setores da obra. A equipe mobilizada contou com seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

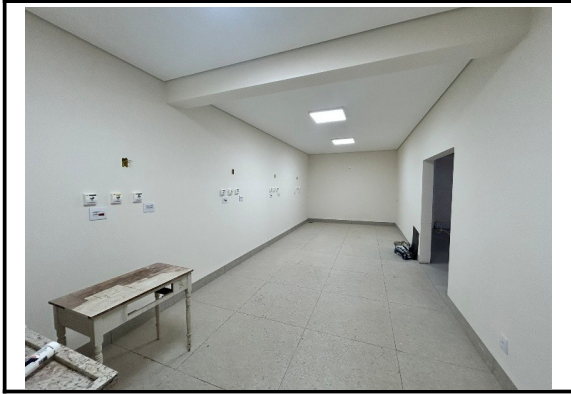


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 13 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as atividades tiveram prosseguimento, com foco na edificação do Centro Cirúrgico, especialmente na instalação de pisos vinílicos. Adicionalmente, foram realizados reparos pontuais na Maternidade I. Em paralelo, outras frentes de trabalho seguiram em execução nas edificações. A equipe foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

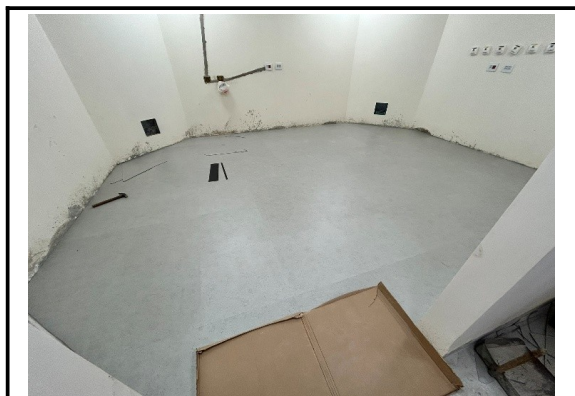


IMAGEM 01

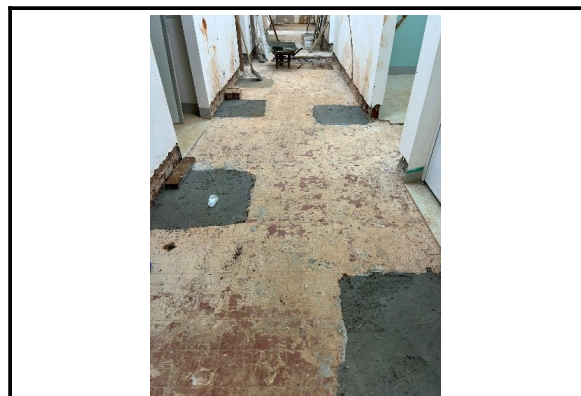


IMAGEM 02

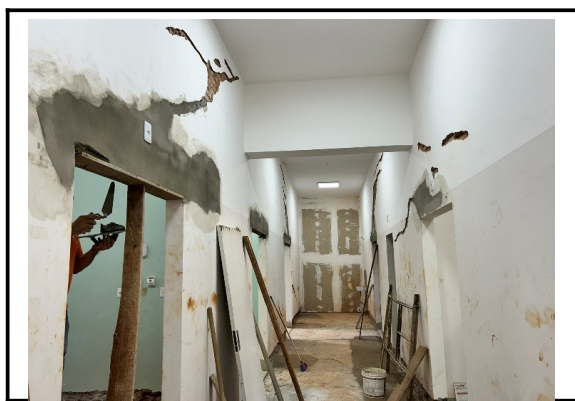


IMAGEM 03

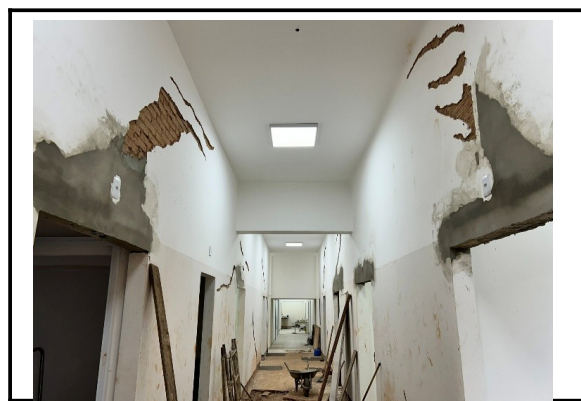


IMAGEM 04

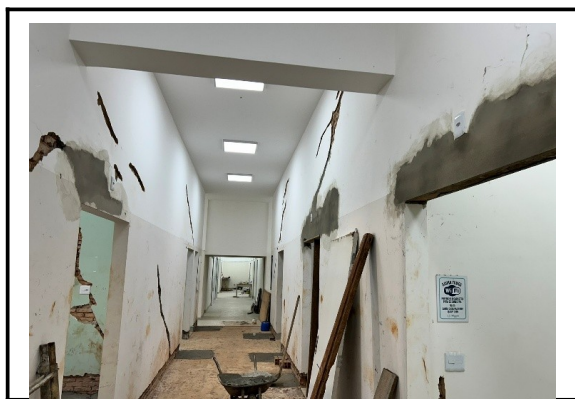


IMAGEM 05

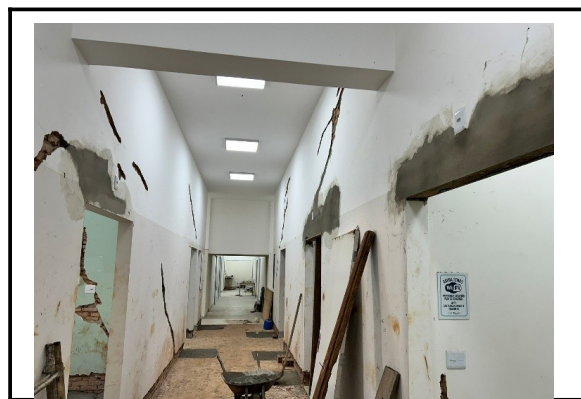


IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 14 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços avançaram nesta data, concentrando-se na aplicação de revestimento vinílico no Centro Cirúrgico, bem como na execução de ajustes e reparos na edificação da Maternidade I. Simultaneamente, outras atividades foram desenvolvidas em diferentes frentes da obra. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

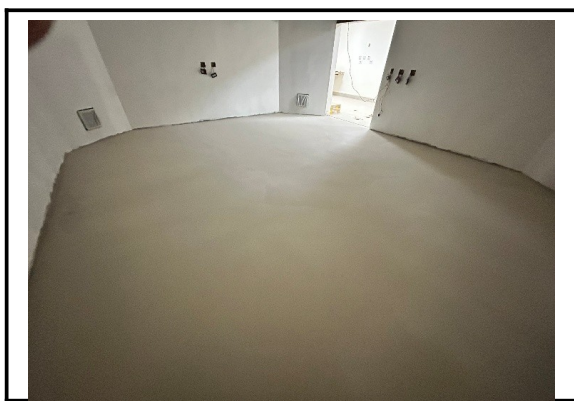


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 15 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, deu-se continuidade às atividades com ênfase na instalação de pisos vinílicos nas áreas do Centro Cirúrgico, associada à realização de serviços de manutenção na Maternidade I. Em paralelo, outras frentes permaneceram ativas na edificação. O efetivo foi composto por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 16 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram conforme o planejamento, com foco técnico na execução do piso vinílico no Centro Cirúrgico e na realização de reparos localizados na Maternidade I. Concomitantemente, foram executados serviços em outras áreas das edificações. A equipe foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

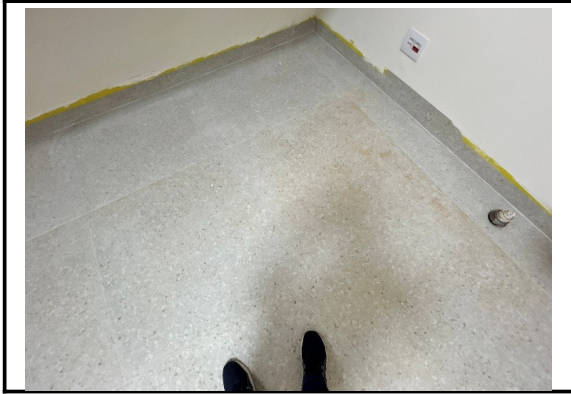


IMAGEM 01



IMAGEM 02

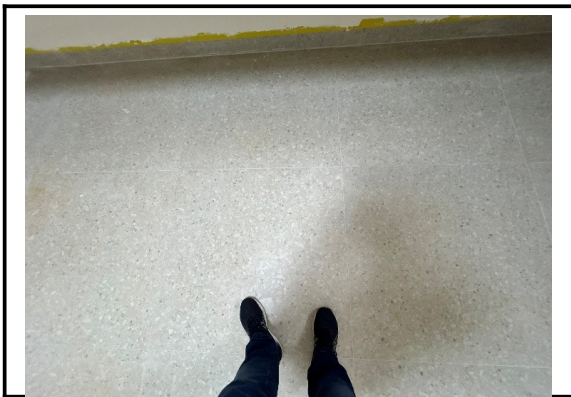


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 17 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, os trabalhos seguiram em andamento, com destaque para a instalação de pisos vinílicos no Centro Cirúrgico e intervenções corretivas na Maternidade I. Paralelamente, outras atividades foram mantidas em diferentes frentes das edificações. A equipe mobilizada contou com seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 20 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os serviços tiveram continuidade com concentração na edificação do Centro Cirúrgico, destacando-se a instalação de pisos vinílicos e a instalação de bancadas nas salas cirúrgicas. Paralelamente, foram realizados reparos pontuais na Maternidade I, além da execução de outras atividades em frentes distintas da obra. A equipe foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 21 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram conforme o planejamento, com foco nas áreas do Centro Cirúrgico, abrangendo a aplicação de revestimento vinílico e a instalação de bancadas nas salas cirúrgicas. Simultaneamente, foram executados serviços de manutenção na Maternidade I e outras intervenções em diferentes setores da edificação. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 22 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, deu-se continuidade aos trabalhos com ênfase na edificação do Centro Cirúrgico, onde foram executadas etapas de instalação de pisos vinílicos e posicionamento de bancadas nas salas cirúrgicas. Em paralelo, foram realizados reparos na Maternidade I e demais serviços em outras frentes. O efetivo foi composto por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUOSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 23 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços avançaram nesta data, com atuação direcionada ao Centro Cirúrgico, contemplando a instalação de pisos vinílicos e a fixação de bancadas nas salas cirúrgicas. Concomitantemente, foram realizados reparos na Maternidade I, além de outras atividades em diferentes áreas das edificações. A equipe foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 24 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, os trabalhos seguiram em andamento com foco nas intervenções do Centro Cirúrgico, incluindo a execução de pisos vinílicos e a instalação de bancadas nas salas cirúrgicas. Paralelamente, foram conduzidos serviços de reparo na Maternidade I e outras frentes de trabalho nas edificações. A equipe mobilizada contou com seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

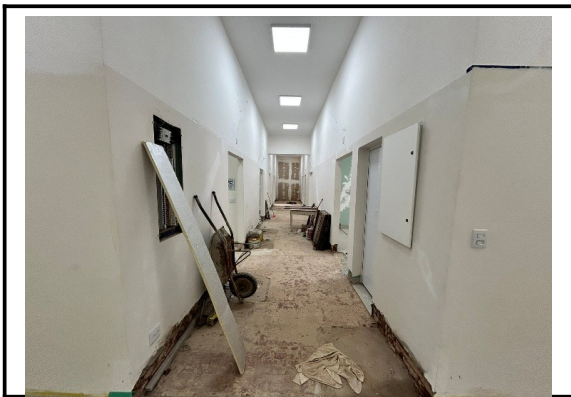


IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 27 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, as atividades tiveram continuidade com foco nas etapas finais do Centro Cirúrgico, contemplando a instalação dos pisos vinílicos e das bancadas nas salas cirúrgicas. Paralelamente, foram executados serviços de reparo na edificação da Maternidade I, além de outras intervenções em frentes distintas da obra. A equipe atuante foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01

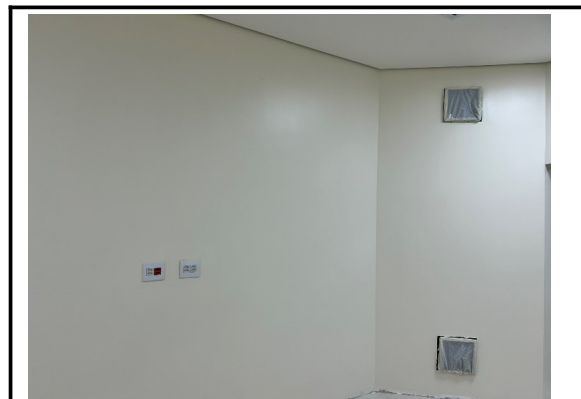


IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 28 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos seguiram em andamento, concentrando-se na execução dos acabamentos do Centro Cirúrgico, especialmente na instalação de revestimentos vinílicos e bancadas nas salas cirúrgicas. Simultaneamente, foram realizados reparos pontuais na Maternidade I e serviços complementares em outros setores das edificações. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 29 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, deu-se prosseguimento às atividades no Centro Cirúrgico, com ênfase na colocação de pisos vinílicos e instalação de bancadas nas salas cirúrgicas. Em paralelo, avançaram os serviços corretivos e de acabamento na Maternidade I, bem como outras frentes operacionais da obra. O efetivo foi composto por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

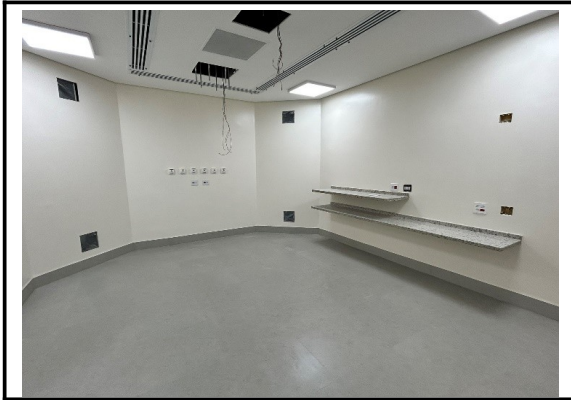


IMAGEM 01

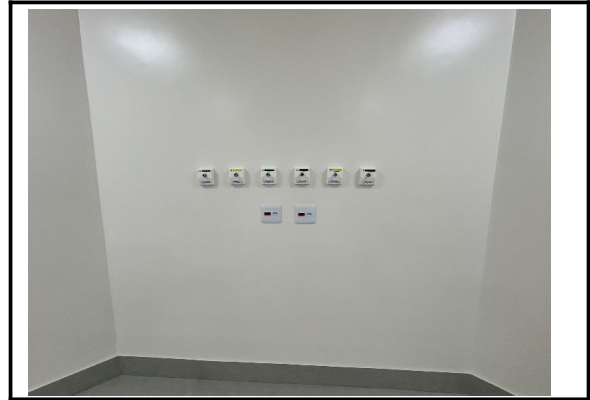


IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 30 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram conforme estabelecido, priorizando os serviços de instalação de pisos vinílicos e bancadas nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico. Paralelamente, foram promovidos reparos localizados na Maternidade I e executados outros serviços em diferentes áreas das edificações. A equipe mobilizada foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL

Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

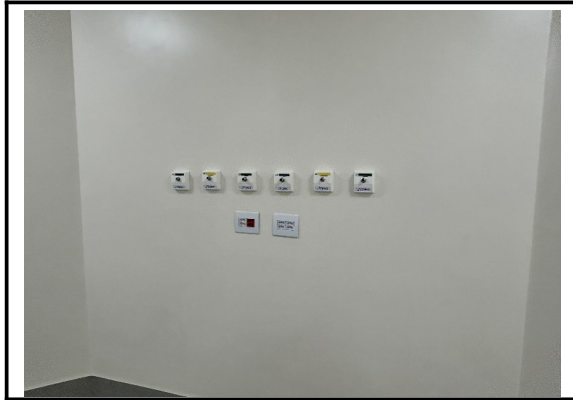


IMAGEM 01



IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 1 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, deu-se continuidade aos trabalhos no Centro Cirúrgico, com atuação direcionada à execução do contrapiso das salas cirúrgicas, etapa essencial para a instalação subsequente de piso vinílico. Em paralelo, outros serviços foram executados em diferentes setores da edificação. O efetivo foi composto por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

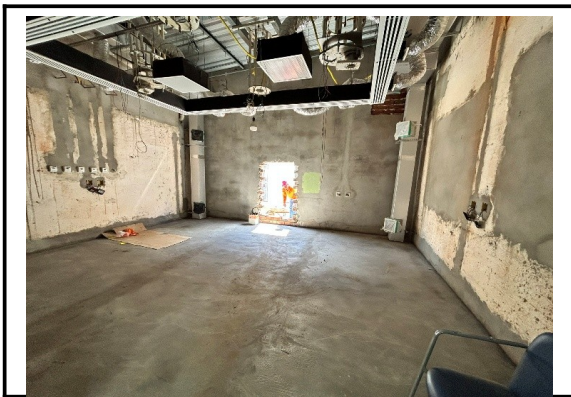


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quinta-feira, 2 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram conforme o planejamento, com foco técnico na execução do contrapiso nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico, preparando as superfícies para recebimento do revestimento vinílico. Concomitantemente, outras intervenções foram realizadas em frentes distintas da obra. A equipe foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

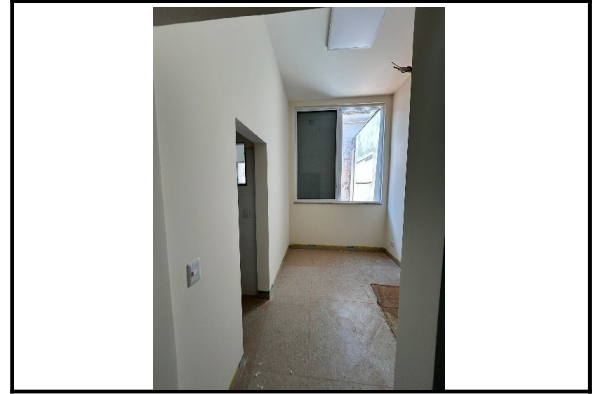


IMAGEM 02

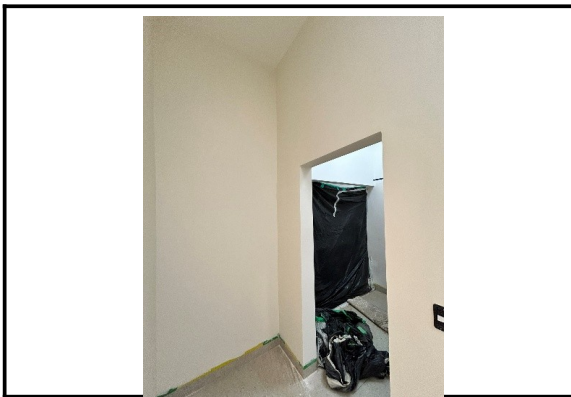


IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	sexta-feira, 3 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, os trabalhos seguiram em andamento com ênfase na execução do contrapiso nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico, etapa que antecede a instalação do piso vinílico. Paralelamente, foram mantidas atividades em outras áreas da edificação. A equipe mobilizada contou com seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

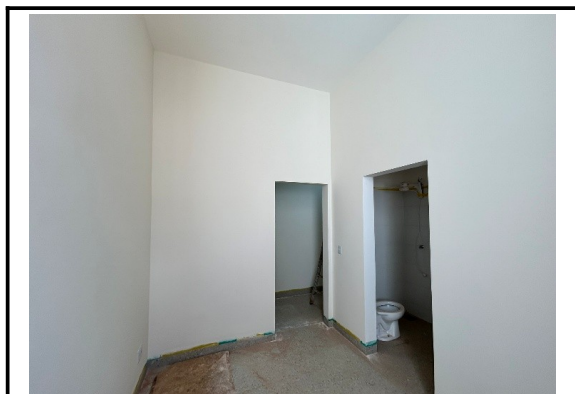


IMAGEM 01

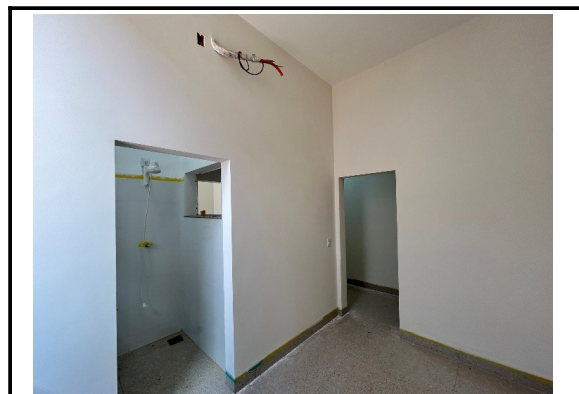


IMAGEM 02

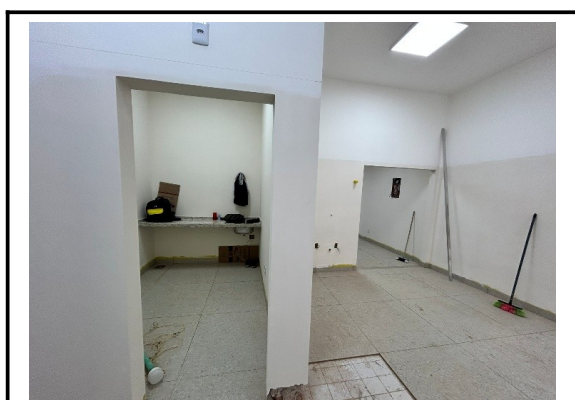


IMAGEM 03

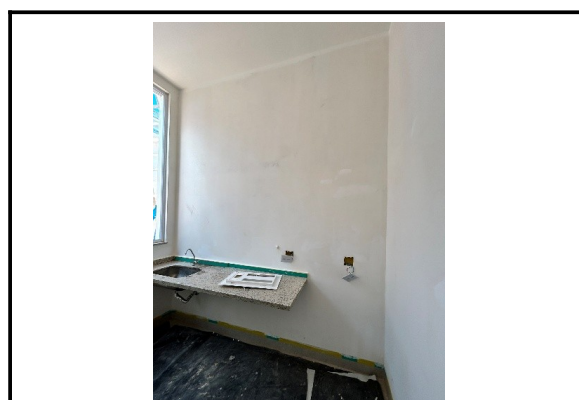


IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	segunda-feira, 6 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, os serviços tiveram continuidade, com concentração das atividades no Centro Cirúrgico, especificamente na execução do contrapiso das salas cirúrgicas, etapa que antecede a aplicação do revestimento vinílico. Em paralelo, outras frentes de trabalho permaneceram em andamento. A equipe atuante foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	terça-feira, 7 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos avançaram hoje com foco nas salas cirúrgicas do Centro Cirúrgico, onde foram executados serviços de regularização de base por meio de contrapiso, visando a posterior instalação de piso vinílico. Simultaneamente, outras atividades foram desenvolvidas em diferentes áreas da edificação. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II

DATA:	quarta-feira, 8 de abril de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI's EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, deu-se sequência às atividades no Centro Cirúrgico, com ênfase na execução do contrapiso nas salas cirúrgicas, preparando as superfícies para o recebimento do revestimento vinílico. Paralelamente, outras frentes de serviço seguiram ativas na obra. O efetivo foi composto por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04
