Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R$ 463.600,00)

MARÇO 2026

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011102920964039
01/04/2026 11:19:34

Cliente

Agência	198-8
Conta	27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	30.013,40			20.159,304118		
03/03/2026	APLICAÇÃO	456,09			306,081595	1,490092862	20.465,385713
04/03/2026	APLICAÇÃO	11.548,86			7.750,429717	1,490733540	28.215,815430
12/03/2026	APLICAÇÃO	34,12			22,828993	1,494590648	28.238,644423
13/03/2026	APLICAÇÃO	250,38			167,524131	1,495233703	28.406,168554
31/03/2026	SALDO ATUAL	42.690,53			28.406,168554		28.406,168554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.013,40
APLICAÇÕES (+)	12.289,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,68
SALDO ATUAL =	42.690,53

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011102920964040
01/04/2026 11:20:23

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		181.500,00
03/03		Resgate	- 0500983321309	
		valor capital		71.000,00
		valor juros até mês ant		11.462,24
		valor juros no mês		86,62
		valor líquido		82.548,86
12/03		Resgate	- 0500983321309	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		242,16
		valor juros no mês		8,22
		valor líquido		1.750,38
31/03		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		214,08
31/03		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		1.240,62
31/03		Saldo final		
		valor capital		109.000,00

J: 1549,91

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	235000,00	23755,64	0,00	258755,64
31/10/2025	233000,00	26621,92	0,00	259621,92
28/11/2025	183000,00	22499,52	0,00	205499,52
31/12/2025	181500,00	24675,18	0,00	206175,18
30/01/2026	181500,00	26954,73	0,00	208454,73
27/02/2026	181500,00	28927,50	0,00	210427,50
31/03/2026	109000,00	18677,80	0,00	127677,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	16.000,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0500983321309	2.797,12
31/03	4300964981785	15.880,68

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 03/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 240.440,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1.937,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 242.378,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 242.378,14

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 03/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	26/02/2026	13		EMPREITADA GLOBAL	PAGTO DA MEDIÇÃO Nº8 - CC_CME	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	03/03/2026		R$ 26.363,85
2	26/02/2026	16		EMPREITADA GLOBAL	MEDIÇÃO PARCIAL DO PROJETO ADITIVO 3_CC_CME	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	03/03/2026		R$ 44.180,06
3	11/03/2026	ISS		IMPOSTOS	RETENÇAO ISS ACASI NF 13	ISS		12/03/2026		R$ 547,83
4	11/03/2026	ISS		IMPOSTOS	RETENÇAO ISS ACASI NF 16	ISS		12/03/2026		R$ 918,05

TOTAL: R$72.009,79

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011102920964038
01/04/2026 11:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	26.363,85 D	
				03/03 11:03 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	44.180,06 D	
				03/03 11:07 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
03/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	456,09 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026	04/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.983.321.309	11.548,86 C	
03/03/2026	04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.548,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.201	547,83 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
12/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.202	918,05 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
12/03/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,12 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026	13/03/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.983.321.309	250,38 C	
12/03/2026	13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031402485507141 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$26.363,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 11:03:34

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 11:03:35

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 2.F57.7F2.FE2.3DB.712

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

C.C. CME - 8 medição

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002233898240000104000000000001326024094025162

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	26/02/2026	26/02/2026 08:44:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	26/02/2026 08:44:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.898.240/0001-04	-	(14) 3418-6442

Nome / Nome Empresarial
ACASI CONSTRUTORA LTDA

E-mail
FINANCEIRO.ACASI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 947, VILA NETINHO PRADO	Jaú - SP	17208-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Referente .8ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convenio Nr. 06/2024. REFORMA E 51.713,93 ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37310/74
Valor material aplicado - R$ 13.683,14 - Valor MDO - R$ 13.708,33
Serviços Executados no Período de 01/02/2026 a 25/02/2026

Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 27.391,47	-	R$ 13.695,74	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 13.695,74	4,00%	Retido pelo Tomador	R$ 547,83

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	R$ 479,79	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 178,04	R$ 821,74		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 27.391,47	-	-	R$ 547,83
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 479,79	-		R$ 26.363,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
8,65 %	0,00 %	2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.022.37310/74 | NBS: 101029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILAZADOS

No dia 25 de fevereiro de 2026, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILAZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **8ª medição** no valor total de **R$ 27.391,47 (vinte e sete mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO
Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:41:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104
Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=38073330600180, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-25 14:44:31
Foxit Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Representante legal

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO

AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 878,41	100,00%	R$ 878,41	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 14.366,25	100,00%	R$ 14.366,25	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 5.734,65	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 5.734,65	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 19.559,66	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 19.559,66	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	COBERTURA	R$ 28.030,69	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 28.030,69	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 103.871,61	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	8,01%	R$ 8.321,40	12,47%	R$ 12.947,74	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	12,47%	R$ 12.947,74
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R$ 27.680,31	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	19,85%	R$ 5.495,52	80,15%	R$ 22.184,79	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 64.119,22	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	74,63%	R$ 47.853,52	0,00%	R$ -
9.	PINTURA	R$ 39.554,93	0,00%	R$ -	4,90%	R$ 1.937,35	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	43,57%	R$ 17.233,00	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	34,36%	R$ 13.591,00
10.	FORRO E MARCENARIA	R$ 65.820,51	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11.	HIDRÁULICA	R$ 9.216,77	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 9.216,77	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 15.427,88	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	68,83%	R$ 10.619,05	0,00%	R$ -	5,53%	R$ 852,73
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 25.281,76	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	84,73%	R$ 21.421,35	0,00%	R$ -	15,27%	R$ 3.860,41	0,00%	R$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 998,34	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 998,34	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R$ 6.240,57	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	7,99%	R$ 498,62	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	92,01%	R$ 5.741,95	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 36.167,44	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	1,36%	R$ 492,80	38,10%	R$ 13.780,00	0,00%	R$ -	60,54%	R$ 21.894,64	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total do Mês		**3,29%**	**R$ 15.244,66**	**5,88%**	**R$ 27.231,66**	**3,39%**	**R$ 15.703,71**	**9,57%**	**R$ 44.286,19**	**11,36%**	**R$ 52.600,43**	**14,52%**	**R$ 66.286,33**	**11,17%**	**R$ 51.713,93**	**5,92%**	**R$ 27.391,47**
	Total Acumulado		**3,29%**	**R$ 15.244,66**	**9,18%**	**R$ 42.476,32**	**12,57%**	**R$ 58.180,03**	**22,13%**	**R$ 102.466,22**	**33,50%**	**R$ 155.066,65**	**47,81%**	**R$ 221.352,98**	**58,98%**	**R$ 273.066,91**	**64,90%**	**R$ 300.458,38**

Bariri, 25 de fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=33072330000180, OU=AC Syngular(tl), Multipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-25 14:44:46
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:41:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 878,41				
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R$ 180,00	R$ 220,09	R$ 633,86				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	5,00	M2	R$ 40,00	R$ 48,91	R$ 244,55				100%
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R$ 14.366,25				
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R$ 32,22	R$ 39,40	R$ -				
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	500,00	M2	8,25	R$ 10,09	R$ 5.045,00				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	2,93	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$ 291,77				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	10,00	UN	R$ 22,58	R$ 27,61	R$ 276,10				100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	51,00	M	R$ 13,55	R$ 16,57	R$ 845,07				100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	48,18	M2	R$ 31,60	R$ 38,64	R$ 1.861,68				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	13,00	UN	R$ 44,54	R$ 54,46	R$ 707,98				100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R$ 56,94	R$ 69,62	R$ 487,34				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	22,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 538,56				100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	65,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 1.591,20				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	3,00	UN	R$ 22,69	R$ 27,74	R$ 83,22				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	4,54	M2	R$ 63,21	R$ 77,29	R$ 350,90				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$ 2.287,43				100%
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA							R$ 5.734,65				
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$ 2.365,50				100%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	4,42	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$ 66,03				100%
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	4,42	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$ 205,62				100%
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	4,13	M2	R$ 13,97	R$ 17,08	R$ 70,54				100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	23,70	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$ 303,12				100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	4,00	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$ 2.723,84				100%
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA							R$ 19.559,66				
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	75,00	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$ 6.480,75				100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	3,00	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$ 6.565,95				100%

TERMO DE CONVENIO Nº 006/06 a 24

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	16,00	M	R$ 332,92	R$ 407,06	R$ 6.512,96				100%
5.	COBERTURA							R$ 28.030,69				
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	250,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$ 7.865,00				100%
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	19,33	M2	R$ 122,42	R$ 149,68	R$ 2.893,31				100%
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	22,00	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$ 2.580,38				100%
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	250,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 1.245,00				100%
5.5	09.50.033.	FDE	REMOCAO DE MAO FRANCESA	400	UN	R$ 18,39	R$ 18,82	R$ 7.528,00				100%
5.6	07.03.105.	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	25	M2	R$ 92,65	R$ 94,80	R$ 2.370,00				100%
5.7	10.80.012.	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R$ 173,43	R$ 177,45	R$ 3.549,00				100%
6.	PISOS E REVESTIMENTOS							R$ 103.871,61			R$ 12.947,74	
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$ -				
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	8,00	M2	29,69	R$ 36,30	R$ 290,40				100%
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	92,65	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$ 3.266,84				100%
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	128,37	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$ 22.177,20	64,18	M2	R$ 11.087,74	100%
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	81,69	M2	R$ 47,70	R$ 58,32	R$ 4.764,16				100%
6.6	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	150,00	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$ 3.720,00	75,00	M	R$ 1.860,00	100%
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	18,00	M2	R$ 323,11	R$ 395,07	R$ 7.111,26				
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	75,00	M2	R$ 481,19	R$ 588,35	R$ 44.126,25				
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	150,00	M2	R$ 100,41	R$ 122,77	R$ 18.415,50				
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS							R$ 27.680,31				
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	20,88	M2	R$ 868,97	R$ 1.062,49	R$ 22.184,79				100%
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	36,20	M	124,16	R$ 151,81	R$ 5.495,52				100%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS							R$ 64.119,22				
8.1	4.917,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	0,00	M2	422,82	R$ 516,98	R$ -				
8.2	4922	SINAPI-I	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	8,40	M2	392,20	R$ 479,54	R$ 4.028,14				100%
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	40,37	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$ 41.487,44				76%
8.4	4.914,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	1,68	M2	612,24	R$ 748,59	R$ 1.257,63				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
8.5	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	21,89	M2	R$ 314,61	R$ 384,67	R$ 8.420,43				64%
8.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	1,24	M2	R$ 463,50	R$ 566,72	R$ 702,73				100%
8.7	25.01.371	CDHU	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R$ 1.476,63	R$ 1.805,48	R$ -				
8.8	24.01.280	CDHU	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	0,48	M2	R$ 1.203,12	R$ 1.471,05	R$ 706,10				100%
8.9	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R$ 1.167,47	R$ 1.427,47	R$ 856,48				100%
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R$ 199,56	R$ 244,00	R$ 146,40				100%
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	24,81	M2	R$ 214,73	R$ 262,55	R$ 6.513,87				68%
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R$ 151,17	R$ 184,84	R$ -				
8.13	36204	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	0,00	UN	185,78	R$ 227,15	R$ -				
8.14	36205	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	0,00	UN	206,33	R$ 252,28	R$ -				
8.15	36.210.00	SINAPI-I	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	0,00	UN	523,98	R$ 640,67	R$ -				
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	0,00	UN	R$ 166,01	R$ 202,98	R$ -				
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	0,00	UN	R$ 173,23	R$ 211,81	R$ -				
9.	PINTURA							R$ 39.554,93			R$ 13.591,00	
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	78,34	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$ 671,37				100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	78,34	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$ 1.265,97				100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	200,00	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$ 3.642,00				100%
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	500,00	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$ 17.685,00	250,00	M2	R$ 8.842,50	100%
9.5	7304	SINAPI-I	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	66,35	L	83,74	R$ 102,39	R$ 6.793,58				
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	234,90	M2	R$ 33,07	R$ 40,43	R$ 9.497,01	117,45	M2	R$ 4.748,50	100%
10.	FORRO E MARCENARIA							R$ 65.820,51				
10.1	11587	SINAPI-I	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	0,00	M2	85,27	R$ 104,26	R$ -				
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	23,85	M2	R$ 2.257,11	R$ 2.759,77	R$ 65.820,51				
11.	HIDRÁULICA							R$ 9.216,77				
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00	UN	R$ 112,04	R$ 136,99	R$ 273,98				100%
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,00	M	R$ 50,43	R$ 61,66	R$ 369,96				100%
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	80,00	M	R$ 31,20	R$ 38,15	R$ 3.052,00				100%
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	M	31,56	R$ 38,59	R$ 926,16				100%
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	M	43,98	R$ 53,77	R$ 430,16				100%
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R$ 9,49	R$ 104,39				100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R$ 12,76	R$ 38,28				100%
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R$ 18,27	R$ 109,62				100%
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R$ 34,97	R$ 209,82				100%
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R$ 20,63	R$ 61,89				100%
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	51,72	R$ 63,24	R$ 63,24				100%
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	10,26	R$ 12,54	R$ 250,80				100%
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	18,31	R$ 22,39	R$ 447,80				100%
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R$ 1.955,78	R$ 2.391,33	R$ 2.391,33				100%
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R$ 143,92	R$ 175,97	R$ 351,94				100%
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R$ 13,54	R$ 135,40				100%
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R$ 15.427,88			R$ 852,73	
12.1	36520	SINAPI-I	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	0,00	UN	625,30	R$ 764,55	R$ -				
12.2	10420	SINAPI-I	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	2,00	UN	198,76	R$ 243,02	R$ 486,04				100%
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	2,00	UN	R$ 47,53	R$ 58,11	R$ 116,22				100%
12.4	O.11.000.069556	CDHU-I	Botão para válvula descarga	3,00	UN	R$ 51,08	R$ 62,46	R$ 187,38				100%
12.5	O.11.000.069558	CDHU-I	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R$ 119,68	R$ 146,33	R$ 438,99				100%
12.6	O.10.000.065559	CDHU-I	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R$ 489,76	R$ 598,83	R$ 2.994,15				100%
12.7	O.11.000.066097	CDHU-I	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R$ 84,73	R$ 103,60	R$ 207,20				100%
12.8	O.10.000.065528	CDHU-I	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R$ 487,41	R$ 595,96	R$ -				
12.9	O.15.000.065606	CDHU-I	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	3,00	UN	R$ 208,84	R$ 255,35	R$ 766,05				100%
12.10	O.15.000.065785	CDHU-I	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	3,00	UN	R$ 202,43	R$ 247,51	R$ 742,53	3,00	UNID	R$ 742,53	100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
12.11	O.10.000.065556	CDHU-I	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	1,00	UN	R$ 90,13	R$ 110,20	R$ 110,20	1,00	UNID	R$ 110,20	100%
12.12	O.11.000.047507	CDHU-I	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	9,00	UN	R$ 218,33	R$ 266,95	R$ 2.402,55				
12.13	O.11.000.066000	CDHU-I	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	5,00	UN	R$ 90,54	R$ 110,70	R$ 553,50				
12.14	O.11.000.066109	CDHU-I	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R$ 139,62	R$ 170,71	R$ -				
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"ou 3/4"	5,00	UN	R$ 163,58	R$ 200,01	R$ 1.000,05				
12.16	O.11.000.063537	CDHU-I	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	11,00	UN	R$ 49,27	R$ 60,24	R$ 662,64				100%
12.17	O.11.000.064045	CDHU-I	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente	9,00	UN	R$ 54,59	R$ 66,75	R$ 600,75				100%
12.18	O.11.000.064011	CDHU-I	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R$ 290,80	R$ 355,56	R$ 1.066,68				100%
12.19	O.11.000.064503	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R$ 176,67	R$ 216,01	R$ 1.080,05				100%
12.20	O.11.000.064513	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	7,00	UN	R$ 139,05	R$ 170,02	R$ 1.190,14				100%
12.21	O.12.000.066028	CDHU-I	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2"x 30cm	12,00	UN	R$ 34,90	R$ 42,67	R$ 512,04				100%
12.22	O.11.000.066023	CDHU-I	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	0,00	UN	R$ 615,07	R$ 752,05	R$ -				
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R$ 254,13	R$ 310,72	R$ 310,72				100%
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$ 25.281,76				
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	113,50	M	38,75	R$ 47,38	R$ 5.377,63				100%
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	80,00	M	100,17	R$ 122,48	R$ 9.798,40				100%
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	14,92	R$ 18,24	R$ 456,00				100%
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	18,36	R$ 22,45	R$ 336,75				100%
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	UN	10,39	R$ 12,70	R$ 444,50				100%
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	14,29	R$ 17,47	R$ 262,05				100%
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	21,55	R$ 26,35	R$ 237,15				100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	31,55	R$ 38,58	R$ 578,70				100%
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	9,00	UN	19,39	R$ 23,71	R$ 213,39				100%
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	22,92	R$ 28,02	R$ 420,30				100%
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	18,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$ 2.764,98				100%
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	25,00	UN	17,39	R$ 21,26	R$ 531,50				100%
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	25,00	UNID	R$ 102,73	R$ 125,61	R$ 3.140,25				100%
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R$ 588,99	R$ 720,16	R$ 720,16				100%
14.	ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 998,34				
14.1	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	6,00	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$ 998,34				100%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R$ 6.240,57				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R$ 407,67	R$ 498,46	R$ 996,92				100%
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R$ 3.683,35	R$ 4.503,63	R$ 4.503,63				100%
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	10,00	M	R$ 19,74	R$ 24,14	R$ 241,40				100%
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R$ 43,28	R$ 52,92	R$ 211,68				100%
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	UN	14,45	R$ 17,67	R$ 35,34				100%
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	M	20,58	R$ 25,16	R$ 251,60				100%
16.	REFORMA ELÉTRICA							R$ 36.167,44				
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS											
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$ -				
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	0,00	M	81,09	R$ 99,15	R$ -				
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	0,00	M	45,76	R$ 55,95	R$ -				
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R$ 29,54	R$ 36,12	R$ -				
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R$ 22,36	R$ 27,34	R$ -				

TER... CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	36,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$ 14.231,16				100%
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R$ 44,69	R$ 89,38				100%
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UN	64,23	R$ 78,53	R$ 942,36				100%
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	57,21	R$ 69,95	R$ 559,60				100%
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$ 180,48				100%
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	37,74	R$ 46,14	R$ 322,98				100%
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$ 447,72				100%
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$ 2.269,28				100%
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	44,82	R$ 54,80	R$ 383,60				100%
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	17,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$ 1.259,02				100%
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	11,00	UN	39,45	R$ 48,24	R$ 530,64				100%
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	800,00	M	3,55	R$ 4,34	R$ 3.472,00				100%
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	950,00	M	4,69	R$ 5,73	R$ 5.443,50				100%
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	90,00	M	6,79	R$ 8,30	R$ 747,00				100%
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	M	9,45	R$ 11,55	R$ -				
16.21	38083	SINAPI-I	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	2,00	UN	37,96	R$ 46,41	R$ 92,82				100%
16.22	43972	SINAPI-I	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	120	M	3,99	R$ 4,88	R$ 585,60				100%
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0	M	R$ 16,62	R$ 20,32	R$ -				
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0	UN	R$ 1.619,00	R$ 1.979,55	R$ -				
16.25	09.02.043.	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	R$ 252,70	R$ 258,56	R$ -				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<– BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 8			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	UN	585,40	R$ 715,77	R$ -				
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	UN	12,02	R$ 14,70	R$ -				
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	UN	55,84	R$ 68,28	R$ -				
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	UN	55,84	R$ 68,28	R$ -				
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0	UN	59,91	R$ 73,25	R$ -				
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0	UN	R$ 78,35	R$ 95,80	R$ -				
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0	UN	R$ 1.519,59	R$ 1.858,00	R$ -				
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R$ 342,43	R$ 418,69	R$ -				
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R$ 366,73	R$ 448,40	R$ -				
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R$ 168,79	R$ 206,38	R$ -				
16.36	40401	SINAPI-I	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	140,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 492,80				100%
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	75,00	M	R$ 44,90	R$ 54,90	R$ 4.117,50				100%
TOTAL GERAL								R$ 462.949,00	TOTAL MEDIÇÃO 8		R$ 27.391,47	
QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS												

Bariri, 25 de Fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:41:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.47
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031406284453628 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$44.180,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 11:07:42

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 11:07:43

==========

DOCUMENTO: 030302
AUTENTICACAO SISBB: 1.33C.9EA.29D.EAD.28B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 206/2024

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
(14)3602-1810
nfse@jau.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35253002233898240000104000000000001626023572565751

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	26/02/2026	26/02/2026 13:07:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	26/02/2026 13:07:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.898.240/0001-04	-	(14) 3418-6442

Nome / Nome Empresarial
ACASI CONSTRUTORA LTDA

E-mail
FINANCEIRO.ACASI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 947, VILA NETINHO PRADO	Jaú - SP	17208-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Referente 3ª Medição do Aditivo 2 , Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, "Recurso Próprio". REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNO Nº 90.022.37310/74
Valor material aplicado - R$ 22.913,50 - Valor MDO - R$ 22.989,23
Serviços Executados no Período de 01/02/2026 a 25/02/2026

Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 45.902,73	-	R$ 22.951,37	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 22.951,37	4,00%	Retido pelo Tomador	R$ 918,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	R$ 804,62	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 298,37	R$ 1.377,08		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 45.902,73	-	-	R$ 918,05
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 804,62	-		**R$ 44.180,06**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
8,65 %	0,00 %	2,50 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 90.022.37310/74 | **NBS:** 101029000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 736,93	100,00%	R$ 736,93	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 4.914,78	100,00%	R$ 4.914,78	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 5.985,14	100,00%	R$ 5.985,14	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	COBERTURA	R$ 31.386,30	66,76%	R$ 20.954,80	33,24%	R$ 10.431,50	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 32.660,23	15,60%	R$ 5.095,57	13,25%	R$ 4.326,81	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 2.589,75	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7.	PINTURA	R$ 14.924,35	18,76%	R$ 2.799,44	0,00%	R$ -	62,48%	R$ 9.324,55	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	FORRO E MARCENARIA	R$ 7.495,07	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 7.495,07	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
9.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 20.039,11	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 20.039,11	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
10.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.663,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 1.663,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 7.380,10	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	100,00%	R$ 7.380,10	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total do Mês		**31,20%**	**R$ 40.486,66**	**11,37%**	**R$ 14.758,31**	**35,37%**	**R$ 45.902,73**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**	**0,00%**	**R$ -**
	Total Acumulado		**31,20%**	**R$ 40.486,66**	**42,57%**	**R$ 55.244,97**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**	**77,94%**	**R$ 101.147,70**

Bariri, 25 de fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=36073330000150, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-02-25 14:43:30
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:42:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 3			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI		QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R$	736,93				
1.1	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	3,20	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$	318,66				100%
1.2	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	3,20	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$	418,27				100%
2	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA							R$	4.914,78				
2.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	12,00	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$	1.135,44				100%
2.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	23,79	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$	355,42				100%
2.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	23,79	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$	1.106,71				100%
2.4	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	74,69	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$	955,29				100%
2.5	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	2,00	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$	1.361,92				100%
3	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA							R$	5.985,14				
3.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	56,60	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$	4.890,81				100%
3.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	0,50	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$	1.094,33				100%
4	COBERTURA							R$	31.386,30				
4.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	300,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$	9.438,00				100%
4.2	16.13.130	CDHU	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	61,00	M2	R$ 154,41	R$ 188,80	R$	11.516,80				100%
4.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	76,20	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$	8.937,50				100%
4.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	300,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$	1.494,00				100%
5	PISOS E REVESTIMENTOS							R$	32.660,23				
5.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	3,05	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$	730,41				100%
5.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	61,00	M2	29,69	R$ 36,30	R$	2.214,30				100%
5.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	61,00	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$	2.150,86				100%
5.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	22,20	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$	3.835,27				100%
5.5	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	19,82	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$	491,54				100%
5.6	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	37,70	M2	R$ 481,19	R$ 588,35	R$	22.180,80				
5.7	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2.0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	8,61	M2	R$ 100,41	R$ 122,77	R$	1.057,05				
6	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS							R$	2.589,75				
6.1	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	2,52	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$	2.589,75				
7	PINTURA							R$	14.924,35			R$	9.324,55
7.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	113,20	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$	970,12				100%
7.2	17.02.220	CDHU	Reboco	113,20	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$	1.829,31				100%
7.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	214,20	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$	3.900,58	214,20	M2	R$ 3.900,58	100%
7.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	116,20	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$	4.109,99	116,20	M2	R$ 4.109,99	100%
7.5	7304	SINAPI-I	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	27,35	L	83,74	R$ 102,39	R$	2.800,37				
7.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	32,50	M2	R$ 33,07	R$ 40,43	R$	1.313,98	32,50	M2	R$ 1.313,98	100%
8	FORRO E MARCENARIA							R$	7.495,07			R$	7.495,07
8.1	22.02.030	CDHU	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	61,00	M2	R$ 100,49	R$ 122,87	R$	7.495,07	61,00	M2	R$ 7.495,07	100%
9	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$	20.039,11			R$	20.039,11
9.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	50,00	M	38,75	R$ 47,38	R$	2.369,00	50,00	M	R$ 2.369,00	100%
9.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	120,00	M	100,17	R$ 122,48	R$	14.697,60	120,00	M	R$ 14.697,60	100%
9.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	14,92	R$ 18,24	R$	218,88	12,00	UNID	R$ 218,88	100%
9.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	18,36	R$ 22,45	R$	269,40	12,00	UNID	R$ 269,40	100%
9.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	10,39	R$ 12,70	R$	152,40	12,00	UNID	R$ 152,40	100%
9.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	14,29	R$ 17,47	R$	209,64	12,00	UNID	R$ 209,64	100%
9.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,00	UN	21,55	R$ 26,35	R$	131,75	5,00	UNID	R$ 131,75	100%
9.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	5,00	UN	31,55	R$ 38,58	R$	192,90	5,00	UNID	R$ 192,90	100%
9.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	19,39	R$ 23,71	R$	284,52	12,00	UNID	R$ 284,52	100%
9.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	22,92	R$ 28,02	R$	336,24	12,00	UNID	R$ 336,24	100%
9.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	6,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$	921,66	6,00	UNID	R$ 921,66	100%
9.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	17,39	R$ 21,26	R$	255,12	12,00	UNID	R$ 255,12	100%
10	AGUAS PLUVIAIS							R$	1.663,90			R$	1.663,90
10.1	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	10,00	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$	1.663,90	10,00	M	R$ 1.663,90	100%
11	REFORMA ELÉTRICA							R$	7.380,10			R$	7.380,10
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS												
11.1	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	8,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$	3.162,48	8,00	UNID	R$ 3.162,48	100%
11.2	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R$ 44,69	R$	89,38	2,00	UNID	R$ 89,38	100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 3			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
11.3	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	64,23	R$ 78,53	R$ 157,06	2,00	UNID	R$ 157,06	100%
11.4	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	57,21	R$ 69,95	R$ 349,75	5,00	UNID	R$ 349,75	100%
11.5	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$ 180,48	2,00	UNID	R$ 180,48	100%
11.6	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$ 149,24	2,00	UNID	R$ 149,24	100%
11.7	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$ 436,40	5,00	UNID	R$ 436,40	100%
11.8	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	3,00	UN	44,82	R$ 54,80	R$ 164,40	3,00	UNID	R$ 164,40	100%
11.9	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$ 148,12	2,00	UNID	R$ 148,12	100%
11.10	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	39,45	R$ 48,24	R$ 96,48	2,00	UNID	R$ 96,48	100%
11.11	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00	M	3,55	R$ 4,34	R$ 651,00	150,00	M	R$ 651,00	100%
11.12	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	150,00	M	4,69	R$ 5,73	R$ 859,50	150,00	M	R$ 859,50	100%
11.13	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	50,00	M	6,79	R$ 8,30	R$ 415,00	50,00	M	R$ 415,00	100%
11.14	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	UN	12,02	R$ 14,70	R$ 29,40	2	UNID	R$ 29,40	100%
11.15	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28	1	UNID	R$ 68,28	100%
11.16	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28	1	UNID	R$ 68,28	100%
11.17	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	UN	59,91	R$ 73,25	R$ 73,25	1	UNID	R$ 73,25	100%
11.18	40401	SINAPI-I	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	80,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 281,60	80,00	M	R$ 281,60	100%
TOTAL GERAL								R$ 129.775,66	TOTAL MEDIÇÃO 3		R$ 45.902,73	
Cento e vinte e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos												

Bariri, 25 de Fevereiro de 2026

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/02/2026 13:42:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81760000005-0	47830447202-8
	60316020720-6	00450742002-6
Data do pagamento		12/03/2026
Valor Total		547,83

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.314.5DD.EFA.21F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 13
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 13.695,73	1	16/03/2026	2/2026	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-450742-7-2	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 547,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 547,83

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/03/2026 11:16:50 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2026

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409	

CEP	Bairro	Cidade
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
16/03/2026	2-450742-7-2	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 547,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 547,83

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 13
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Rf. c.c.

Autenticação Mecânica

81760000005-0 47830447202-8 60316020720-6 00450742002-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.29
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

Convenio	PREF MUN BARIRI IPTU	
Codigo de Barras	81750000009-3	18050447202-8
	60316020420-3	00450742002-6
Data do pagamento		12/03/2026
Valor Total		918,05

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: A.00B.C61.1B1.605.437

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2026

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro		Número	Complemento
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409	
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 16
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R$ 22.951,36	1	16/03/2026	2/2026	Declaração Tomador	0,00

Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
2-450742-4-2	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento
R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/03/2026 11:15:30 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2026

Contribuinte	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Logradouro	Número	Complemento
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409	

CEP	Bairro	Cidade
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
16/03/2026	2-450742-4-2	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05

Após o vencimento cobrar multa e juros:
Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%
E ACIMA DE 60 DIAS 20%
JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 16
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Ref. C.C.

Autenticação Mecânica

81750000009-3 18050447202-8 60316020420-3 00450742002-6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

ARQ_PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	sexta-feira, 6 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, deu-se continuidade às frentes de trabalho no Centro Cirúrgico, especialmente nas áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. As intervenções estiveram voltadas à aplicação de massa corrida e à pintura dos ambientes, caracterizando a etapa de acabamento. Em paralelo, outros serviços foram realizados em setores distintos da obra. A equipe mobilizada foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	segunda-feira, 9 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, os serviços tiveram continuidade, com direcionamento das atividades para o Centro Cirúrgico, especialmente nas áreas destinadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Foram executadas etapas de acabamento, incluindo aplicação de massa corrida e pintura. Paralelamente, outras frentes de trabalho permaneceram em andamento. A equipe contou com seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	terça-feira, 10 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS
Os trabalhos seguiram em execução, com foco nas dependências do Centro Cirúrgico, abrangendo os ambientes da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. As atividades estiveram voltadas ao tratamento superficial das paredes, com aplicação de massa corrida e pintura. Em paralelo, foram desenvolvidos outros serviços na edificação. A equipe foi composta por seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

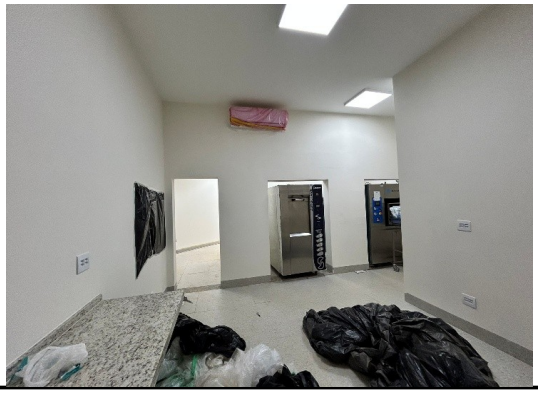


IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quarta-feira, 11 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, houve continuidade das atividades com ênfase nas áreas do Centro Cirúrgico, especificamente nos ambientes da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, onde foram realizados serviços de regularização e pintura das superfícies. Simultaneamente, outras frentes de serviço avançaram na obra. O efetivo foi de seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

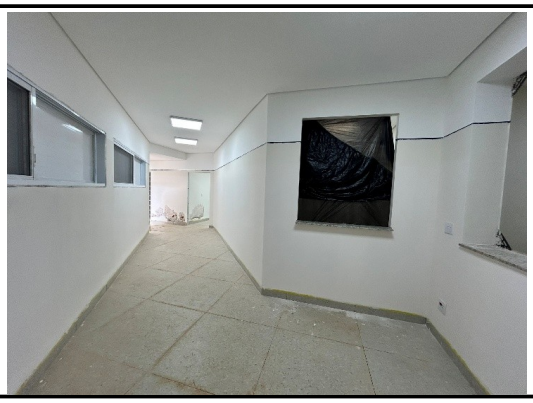


IMAGEM 02



IMAGEM 03

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quinta-feira, 12 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram com foco nos acabamentos internos do Centro Cirúrgico, contemplando as áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Os serviços concentraram-se na aplicação de massa corrida e pintura das superfícies. Em paralelo, foram mantidas outras frentes ativas. A equipe presente foi formada por seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

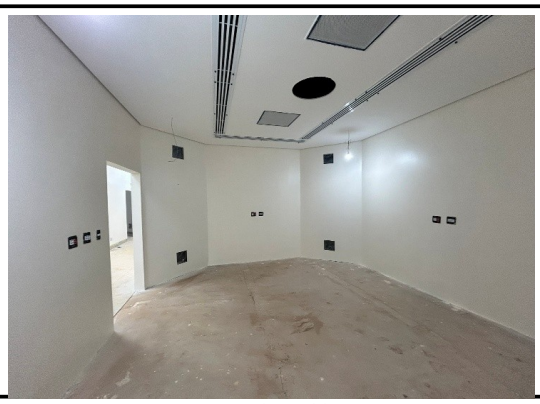


IMAGEM 03

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	sexta-feira, 13 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, a equipe manteve o andamento dos serviços no Centro Cirúrgico, com intervenções nas áreas destinadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, executando etapas de acabamento com massa corrida e pintura. Concomitantemente, outros serviços foram realizados em diferentes setores da edificação. A equipe contou com seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	segunda-feira, 16 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as atividades seguiram conforme o cronograma, com concentração nos ambientes do Centro Cirúrgico, especialmente nas áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, onde foram realizados serviços de preparação e pintura das superfícies. Paralelamente, outras etapas foram executadas em frentes distintas. A equipe foi composta por seis integrantes.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

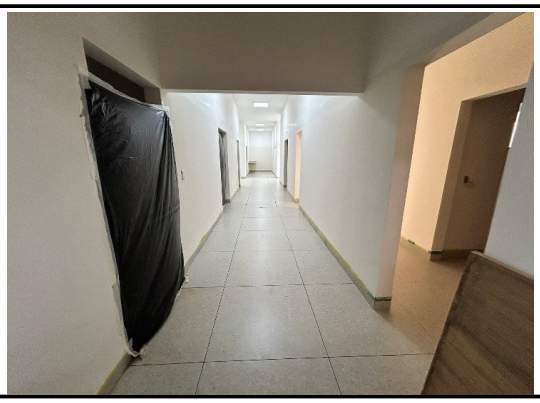


IMAGEM 01

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	terça-feira, 17 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços avançaram nesta data com foco nas áreas técnicas do Centro Cirúrgico, incluindo Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. As intervenções envolveram aplicação de massa corrida e pintura, compondo a fase de acabamento. Em paralelo, outras atividades seguiram em execução. A equipe contou com seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

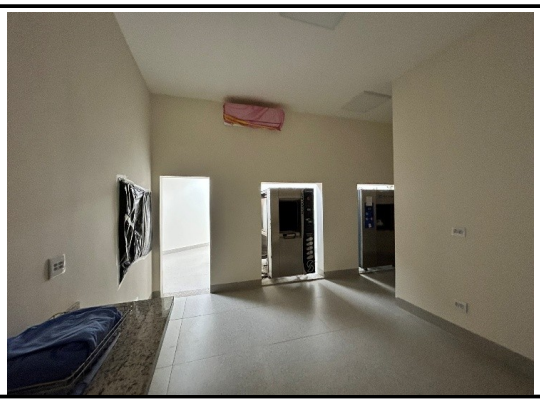


IMAGEM 01

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quarta-feira, 18 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dada sequência aos trabalhos, com prioridade para os serviços de acabamento no Centro Cirúrgico, contemplando as áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Foram executadas etapas de aplicação de massa corrida e pintura, enquanto outras frentes permaneceram ativas. A equipe foi formada por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quinta-feira, 19 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades mantiveram seu ritmo, com atuação direcionada às áreas do Centro Cirúrgico, especialmente nos ambientes da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Os serviços envolveram a aplicação de massa corrida e pintura das superfícies. Em paralelo, outros serviços foram executados na edificação. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	sexta-feira, 20 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, os trabalhos tiveram continuidade, concentrando-se nos acabamentos internos do Centro Cirúrgico, abrangendo as áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. As atividades incluíram aplicação de massa corrida e pintura dos ambientes. Simultaneamente, outras frentes de trabalho avançaram. A equipe mobilizada foi composta por seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico	
DATA:	segunda-feira, 23 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as atividades tiveram prosseguimento com foco nas áreas do Centro Cirúrgico destinadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, as quais se encontram em fase final de acabamento, com conclusão prevista ainda nesta semana. Permanecem pendentes apenas as salas cirúrgicas e a substituição pontual de pisos no corredor central, programadas para as próximas etapas. Paralelamente, outras frentes de trabalho seguiram em execução. A equipe foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

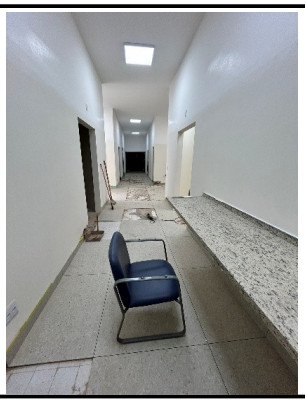


IMAGEM 02

ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32
(14) 98192.1272
luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	terça-feira, 24 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos avançaram nesta data, concentrando-se nas repartições do Centro Cirúrgico voltadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, que se encontram em fase conclusiva de acabamento, com término previsto no decorrer da semana. Restam como etapas subsequentes as salas cirúrgicas e ajustes no piso do corredor central. Em paralelo, foram executados serviços em outras áreas da edificação. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01

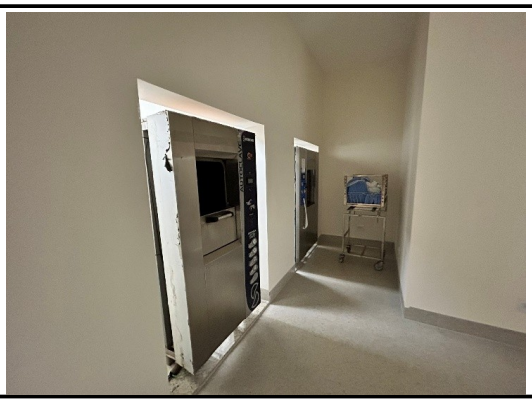


IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quarta-feira, 25 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dada continuidade às atividades no Centro Cirúrgico, com ênfase nas áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, que atingem a fase final de acabamento, com previsão de conclusão ainda nesta semana. Permanecem como pendências as intervenções nas salas cirúrgicas e a substituição de pisos no corredor central, previstas para as próximas semanas. Paralelamente, outras frentes de serviço seguiram ativas. A equipe foi composta por seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

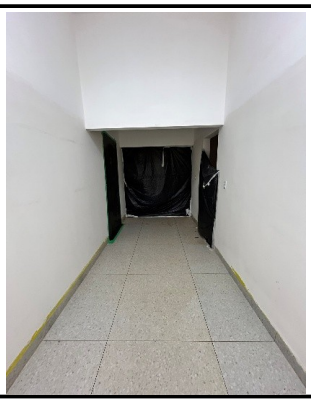


IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico	
DATA:	quinta-feira, 26 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades prosseguiram com foco nas dependências do Centro Cirúrgico correspondentes à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, que se encontram em etapa final de acabamento, com conclusão iminente ao longo da semana. As etapas remanescentes concentram-se nas salas cirúrgicas e na troca de pisos no corredor central. Em paralelo, outras intervenções foram executadas na edificação. A equipe contou com seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico	
DATA:	sexta-feira, 27 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, os trabalhos seguiram com concentração nas áreas do Centro Cirúrgico destinadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, que chegaram ao fim na data de hoje. Permanecem como serviços pendentes as salas cirúrgicas e a substituição de trechos de piso no corredor central, a serem executados nas próximas etapas. Paralelamente, outras frentes de trabalho foram mantidas. A equipe foi composta por seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico	
DATA:	segunda-feira, 30 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as atividades tiveram prosseguimento com foco na edificação do Centro Cirúrgico, especialmente na execução do contrapiso das salas cirúrgicas, etapa preparatória para a futura instalação de revestimento vinílico. Paralelamente, outras frentes de trabalho seguiram em andamento na edificação. A equipe foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	terça-feira, 31 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os serviços avançaram nesta data, concentrando-se nas áreas do Centro Cirúrgico, com ênfase na execução do contrapiso nas salas cirúrgicas, visando a posterior aplicação de piso vinílico. De forma simultânea, foram realizadas atividades em outras frentes da obra. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ_PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	segunda-feira, 2 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia, a equipe manteve o andamento dos serviços, priorizando os acabamentos no Centro Cirúrgico, em especial nos ambientes da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Foram executados serviços de aplicação de massa corrida e pintura. Paralelamente, outras atividades seguiram em execução em diferentes setores da obra. A equipe presente foi composta por seis pessoas.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ_PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	terça-feira, 3 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS
Os serviços tiveram continuidade com foco nas etapas de acabamento das áreas do Centro Cirúrgico destinadas à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN, com realização de aplicação de massa corrida e pintura. De forma simultânea, foram executadas outras atividades em frentes paralelas da edificação. A equipe contou com seis colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ_PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quarta-feira, 4 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos seguiram em andamento, com atenção voltada aos ambientes do Centro Cirúrgico, especificamente nas áreas da Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. As ações concentraram-se na execução de massa corrida e pintura dos ambientes. Em paralelo, outros serviços foram realizados em diferentes frentes da obra. A equipe foi composta por seis profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02

ARQ_PRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA	ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234 CENTRO BARIRI-SP CNPJ: 43.168.365/0001-32 (14) 98192.1272 luisafonso.arq@gmail.com

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS	
(x) Reforma do centro cirúrgico - (x) Reforma da maternidade parte I - (x) Reforma da maternidade parte II	
DATA:	quinta-feira, 5 de março de 2026
RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:	Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	Sol
Nº DE TRABALHADORES NO DIA:	Seis
VISITANTES NO LOCAL:	Não
EPI´s EM USO:	Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades do dia concentraram-se nos serviços de acabamento no Centro Cirúrgico, abrangendo os ambientes destinados à Autoclave, C.M.E. e Recepção do RN. Foram executadas etapas de aplicação de massa corrida e pintura. Paralelamente, outras intervenções ocorreram em áreas distintas da edificação. A equipe em campo contou com seis trabalhadores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSÁVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA

RELATÓRIO FOTOGRAFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02
